



UAB „UGIRA“
Jono Dailidės g. 10,
LT 68307, Marijampolė
8-343-52201
www.ugira.lt

**K. DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478), VILKAVIŠKIO M.,
VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO,
ĮRENGIANT PRALAIĐĄ, PROJEKTAS**

UŽSAKOVAS:

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

STATYBOS RŪŠIS:

01 - REKONSTRAVIMAS

KATEGORIJA:

01 - NEYPATINGASIS STATINYS

ETAPAS:

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

DALIS:

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ
ORGANIZMO

LAIDA

0

PROJEKTO Nr.:

2407

PAREIGOS	KVALIFIKACIJOS ATESTATO Nr.	PAVARDĖ, VARDAS	PARAŠAS
PROJEKTO VADOVAS	1916	Aloyzas Jurdonas	
PROJEKTO DALIES VADOVĖ	31222	Dalė Rudaitė	

PROJEKTO BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapas
1.	2.	3.	4.
TEKSTINIAI DOKUMENTAI			
1.	2407-00-TDP-SO-PSŽ	Projekto sudėties žiniaraštis	1
2.	2407-00-TDP-SO-BDŽ	Projekto bylos dokumentų žiniaraštis	1
3.	2407-00-TDP-SO-AR	Aiškinamasis raštas	21
GRAFINIAI DOKUMENTAI			
1.	2407-00-TDP-SO-B.01	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizmo planas	1

		J. Dailidės g. 10, Marijampolė Tel. (8~343) 52201			K. Donelaičio g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-3478), Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. rekonstravimo, įrengiant pralaidą, projektas		
1916	PV	A. Jurdonas		2023	PROJEKTO BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS		Laida
31222	PDV	D. Rudaitė		2023			0
LT	Užsakovas: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ				Žymuo: 2407-00-TDP-SO-BDŽ	Lapas	Lapų
						1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDRA INFORMACIJA	
1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, Į.K. 111107759, S. NĖRIES G. 1, LT-70147, VILKAVIŠKIS
2. PROJEKTUOTOJAS PROJEKTO VADOVAS PROJEKTO DALIES VADOVAS	UAB „UGIRA“, J.DAILIDĖS G.10, MARIJAMPOLĖ, Į.K. 151335749 ALOYZAS JURDONAS, KVAL.ATESTATO NR. 1916 DALĖ RUDAITĖ, KVAL.ATESTATO NR. 31222
3. STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS	01- K. DONELAIČIO GATVĖ (GATVĖS PRIKLAUSINYS – TILTAS)
4. STATINIO ADRESAS	K. DONELAIČIO G., VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV.
5. STATINIO PASKIRTIS POGRUPIS	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (5.2.1.) GATVĖS (8.2) (STR 1.01.03:2017 STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS)
6. STATYBOS RŪŠIS	REKONSTRAVIMAS (STR 1.01.03:2017 STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS)
7. STATINIO KATEGORIJA	NEYPATINGIEJI STATINIAI (STR 1.0.08:2002 STATINIO STATYBOS RŪŠIS)
8. PROJEKTAVIMO ETAPAI (STADIJOS)	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS SUDĖTIS IR DETALUMAS ATITINKA STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ NURODYMUS

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis.

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas
1.	STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
2.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
3.	STR 1.03.01:2016	Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
4.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
5.	STR 1.03.03:2013	Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėseną. Nacionaliniai techniniai įvertinimai
6.	GKTR 2.01.01:1999	Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka
7.	Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Nr. 2019-09862.	
8.	Statybos įstatymas.	
9.	Atliekų tvarkymo įstatymas.	
10.	Priešgaisrinės saugos įstatymas.	
11.	Atliekų tvarkymo taisyklės.	
12.	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.	
13.	Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės.	
14.	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.	

		J. Dailidės g. 10, Marijampolė Tel. (8~343) 52201		K. Donelaičio g. VK8009 (Unikalus Nr. 4400-4423-3478), Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. rekonstravimo, įrengiant pralaidą, projektas		
1916	PV	A. Jurdonas	2024	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida	
31222	PDV	D. Rudaitė	2024		0	
LT	Užsakovas: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ			Žymuo: 2407-00-TDP-SO-AR	Lapas 1	Lapų 21

15.	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.
16.	Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės.
17.	Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
18.	Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai.
19.	Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai.
20.	Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai.
21.	Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai.
22.	Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikio darbe nuostatai.
23.	Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai.
24.	Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai.
25.	HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir matavimo reikalavimai
26.	Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai.
27.	LR darbo kodeksas.
28.	HN 80:2011 Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje
29.	Kėlimo kranų naudojimo taisyklės.
30.	Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės

Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės galiojančio redakcijos.

Kompiuterinės programos, kuriomis parengta ši projekto dalis:

Projektui parengti naudotos AutoCad 2014, Microsoft office 2016 programos.

Techninis darbo projektas parengtas, vadovaujantis teisės aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

Projekto sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodymus.

1. Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį – funkcinė paskirtis, technologiniai procesai, ypatingumo kategorija.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“, 8 priedo, II skyriaus, aštuonioliktojo skirsnio, 45 punkto reikalavimus, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis turi būti rengiama statant urbanizuotoje teritorijoje, numatant laikinai uždaryti autotransporto eismą.

Pagrindinės griaunamų tilto konstrukcijų charakteristikos:

Gatvės priklausinys – tiltas pastatytas 1960m. tiltas suprojektuotas vienos 9,0m angos. Perdangą sudaro aštuonios 1,5m pločio gelžbetoninės sijos su monolitinėmis skersinėmis briaunomis. Perdanga (T tipo sijų blokas) atremta tiesiogiai ant monolitinio rygelio, kuris sujungęs 7 polių liemenis į vieną ramtą. Antpolis baigiasi atramine plokšte 2,7m metrų aukštyje. Tilto atkaltė į vieną plokštumą sudaryta iš gelžbetoninių 160cm x 60cm 12cm plokščių., atremtų vertikalėje tiesiogiai į ramtą bloką ir sumontuotų ant apačioje išlieto g/b rostverko. Atkaltės skvernai prilaikantys gatvės pylimą sumontuoti tiesiogiai ant grunto, o vertikalėje atremti į atskirai įrengtus g/b stulpus pagal šlaito nuolydį. Pereinamoji plokštė, jungianti tiltą su prietilčiu, neįrengta (deformacinės siūlės tarp kelio konstrukcijos ir tilto nėra). Šalitiltis abiejose tilto pusėse įrengtas 170cm pločio ir pakeltas virš dangos 30cm iš g/b elementų. Išorinėje šalitilčio pusėje, turėklų bloko apačioje, per visą tilto ilgį, suformuotas laštakas (stogelis virš betono). Turėklų atramos g/b išlietos viename masyve su laštako plokšte. Turėklai metaliniai.

Statinio ekspertizės metu nustatyta, kad ramtų defektai nežymūs, būklė gera.

Atkaltės būklė bloga, defektai pavojaingi, didelės deformacijos.

Tilpo perdanga įdrėkusi, tai reiškia, kad hidroizoliacija arba suirusi, arba jos visai nėra. Armatūra sijų viduje pradėjus koroduoti, vietomis atkeldama betono sluoksnį. Apžiūros metu perdangos sijose trūkių ar deformacijų nepastebėta. Sijų horizontalios plokštumos (perdangos) ir briaunos po jomis drėgnos,

	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	2	21	0

tačiau jų deformacijų nepastebėta, išskyrus kraštinių sijų briaunos po lakštais dėl įdrėkio ir temperatūrinių pokyčių pradeda irti.

Perdangų pažaidos nepavojingos, turinčios tendenciją plisti. Šalitiltės su laštakais pažaidos pavojingos ir turi avarių požymių.

Pagal atliktą statinio ekspertizę tilto laikančios konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1):2017 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. Tiltas neatitinka STR 2.01.01(4):2017 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.“

Statybos geodezinė kontrolė. Rangovai statydami statinius, privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad jų išdėstymas plane ir vertikalus profilis atitiktų projekto reikalavimus. Siekiant tai patikrinti ir užfiksuoti tikrąją jų padėtį, daromos jų geodezinės nuotraukos. Geodezines nuotraukas statytojų (užsakovų) užsakymu ir lėšomis atlieka įmonės. Užsakymą dėl geodezinių nuotraukų darymo pateikia statytojas (užsakovas) arba jo pavedimu inžinerinius tinklus paklojusi įmonė (asmuo) iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki numatomo jų užpylimo.

Neturint geodezinės nuotraukos ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų, užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius draudžiama. Inžinerinius geodezinius tyrinėjimus gali vykdyti įmonės, nustatyta tvarka šiems darbams gavusios Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – VGKT) licencijas.

Atliekant inžinerinius geodezinius tyrinėjimus:

- surenkama ir analizuojama esama geodezinė-topografinė medžiaga;
- sudaromas (esant būtinumui) sutankinimo geodezinis pagrindas;
- sudaromas nuotraukos geodezinis pagrindas;
- sudaroma ar atnaujinama 1:5000–1:500 topografinė, aerofotografinė nuotrauka, įskaitant ir inžinerinių statinių nuotrauką.

- Inžinerinius geodezinius tyrinėjimus objekte galima pradėti tik gavus užsakovo techninę užduotį ir nustatyta tvarka suderinus geodezinių darbų programą.

- Inžineriniams geodeziniam tyrinėjimams techninę užduotį sudaro užsakovas, esant būtinybei pasitelkiant geodezinius darbus vykdančią įmonę (rangovą). Techninėje užduotyje pateikiama: objekto pavadinimas; tyrinėjimų rūšis; toponuotraukos vieta ir ribos; duomenys apie anksčiau atliktus tyrinėjimus; koordinacių ir aukščių sistemos; darbų užbaigimo terminai ir ataskaitos sudėtis; papildomi reikalavimai; užsakovo atstovo pavardė ir telefono numeris; techninėje užduotyje turi būti kartografinė medžiaga su nurodytomis aikštelės ribomis, trasomis, projektuojamų pastatų kontūrais. Pagal užsakovo techninę užduotį geodezinių darbų rangovas sudaro inžinerinių geodezinių tyrinėjimų programą. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai vykdomi metrologiškai patikrintais geodeziniais prietaisais.

2. Geografinė vieta, vietovės gamtinės sąlygos, pastato 0,000 atitinkama absoliutinė altitudė, geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos, atstumai iki greta esančių statinių ir inžinerinių tinklų.

Griaunamų statinių geografinė vieta: K.Donelaičio gatvė, pietrytinėje Vilkaviškio miesto dalyje.

Aplinkinėse teritorijose dominuoja užstatymas vienbučiais gyvenamaisiais namais.

Mažiausias atstumas nuo tilto iki artimiausio gyvenamojo namo apie 40m.

Projektinė vieta yra moreninėje nuolaidoje. Reljefo absoliutiniai aukščiai svyruoja nuo 50,30 iki 53,75m. Vagos plotis ties demontuojamu tiltu yra apie 5m. apžiūrų ir topografinių matavimų metu upės vandens lygis buvo nusekęs.

Vietovėje po augaliniu dirvožemiu vyrauja smėlinis dulkingo molio sluoksnis.

Šeimena yra dešinysis Širvintos upės intakas, įtekantis į ją 8 km nuo žiočių, 5 km į pietvakarius nuo Kudirkos Naumiesčio. Upės baseino plotas yra 648km². Baseino ežeringumas 0,0 proc., baseino miškingumas 3,4 proc., baseino pelkėtumas – 2,7proc. Pralaidos geometriniai parametrai nustatomi hidrauliniiais ir hidrologiniais skaičiavimais. Maksimalūs skaičiuojamieji debitai kinta nuo 8,94 m³/s iki 14,6 m³/s.

 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	3	21	0

3. Klimato sąlygos (sezonų temperatūros, vėjo vyraujančios kryptys, sniego susikaupimai ir pan.), paviršinio vandens šalinimo ir gruntinio vandens pažeminimo būtinumas, drenažo projekto sprendinių trumpas aprašymas.

Klimato sąlygos:

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Vilkaviškio savivaldybėje yra tokios klimatinės sąlygos (vadovaujamas Kybartų Meteorologijos stoties duomenimis):

- vidutinė metinė oro temperatūra +6,7 °C;
- santykinis metinis oro drėgnumas 81%;
- vidutinis metinis kritulių kiekis 613 mm;
- maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 82,5 mm;
- vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PV, V, P, PR, liepos mėn. – iš V, PV, ŠV, P;
- vidutinis metinis vėjo greitis 3,4 m/s;

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, Vilkaviškio savivaldybė priskiriami I –ajam vėjo greičio rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s ir I–ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m².

Statybų metu, paviršinio vandens nuleidimui ar gruntinio vandens žeminimui, poreikio nebus. Jei visgi toks poreikis atsirastų, Rangovas vandens pašalinimo būdus turi susiderinti su Techniniu prižiūrėtoju.

4. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškaskamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos.

Medžių šalinimas nenumatomas. Projekte numatyta iškirsti 2 vienetus šlaite augančių menkaverčių krūmų. Nukastas dirvožemis (augalinis sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant aplinką. Per teklinis dirvožemio kiekis, atlikęs dirvožemis galės būti panaudojamas kitose sklypo vietose, užsakovo nuožiūra. Numatomi palikti vejos plotai bus išlyginami ir atkuriami.

Esami augalai statybos metu saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais.

5. Griaunami esami statiniai ir iškeliama inžineriniai tinklai

Tilto konstrukcijų griovimo darbai pradedami vykdyti tik Rangovui pateikus griovimo darbų technologijos projektą ir gavus rašytinį pritarimą griovimo darbams, bei statybos aikštelės perdavimo – priėmimo aktą.

Prieš pradedant darbus reikia nustatyti esamų komunikacijų vietas ir užtikrinti, kad jos būtų tinkamai nužymėtos ir apsaugotos.

Statinių ardymas ir griovimas susideda iš šių pagrindinių etapų:

- paruošimas griovimui;
- išorės inžinerinių tinklų atjungimas;
- griovimo darbų eiliškumo nustatymas;
- griovimo darbų būdo parinkimas, mechanizmų parinkimas;
- esamų konstrukcijų pjaustymas ir skaldymas;
- išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas;
- statybinių atliekų nuleidimas žemyn, pakrovimas į autotransportą ir transportavimas;
- statinių griovimas šalia esamų pastatų;
- darbo saugos ypatumai griauant statinius;
- statybinių atliekų utilizavimas.

Griovimas – sudėtingas procesas, susijęs su visa eile pavojų, todėl šie darbai turi būti organizuojami taip, kad juos atliekantys darbuotojai būtų saugūs. Griovimo ir demontavimo darbų vietoje ypač turi būti paisoma šių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų: teritorija turi būti aptverta, kad į ją nepatektų ir griovimo metu nenukentėtų pašaliniai asmenys, turi būti nustatomos pavojingos zonos ir apribojamas darbuotojų patekimas į pavojingas zonas.

 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	4	21	0

Griovimo aikštelėje statybinis laužas, betono duženos, kitos atliekos perdirbimui tinkamos paprastai perdirbimui į skaldą. Perdirbimui netinkamos statybinės atliekos išvežamos utilizacijai. Po visų atliktų griovimo, smulkinimo ir utilizavimo darbų turi būti išvaloma ir sutvarkoma buvusio statinio teritorija.

6. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio vienetais), jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos (Atliekų kodai ir pavadinimai pagal „Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą“)

Techninis procesas	Atliekos			Pavojingumas	Atliekų saugojimas objekte	
	Pavadinimas	Agregatinis būvis	Kodas pagal atliekų sąrašą		Laikymo sąlygos	Numatomas kiekis, t
Griovimo darbai	Betonas	Kietas	17 01 01	Nepavojingas	Spec. konteineris	245,76
Paruošiamieji, ardymo darbai	Asfaltbetonis	kietas	17 03 01	Nepavojingas	Sąvarta	22,7
Griovimo darbai	Geležis ir plienas	Kietas	17 04 05	Nepavojingas	Spec. konteineris	0,006
Griovimo darbai	Žemės ir akmenys	Kietas	17 05 01	Nepavojingas	Sąvarta	255,0

Įmonės, laikinai laikančios, surenkančios, vežančios ir laikančios pavojingąsias atliekas, privalo jas supakuoti taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai.

Pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti:

-nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius ir (arba) priemones, užtikrinančias apsaugą nuo teršalų patekimo į aplinką;

-paviršinių nuotekų, susidarančių ant atvirų teritorijų, kuriose vykdoma atliekų tvarkymo veikla (krovimas, pakavimas, svėrimas, laikymas) surinkimo ir tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti.

Pavojingosios atliekos negali būti laikomos požeminėse talpyklose, jei nėra įrengtos apsaugos nuo patekimo į gruntą priemonės ir nuotėkio fiksavimo sistema.

Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo. Taip pat pavojingųjų atliekų laikymo vieta (išskyrus eksploatuoti netinkamas transporto priemones) turi būti įrengta su stogine, kad atliekos būtų apsaugotos nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio.

Patalpose, kur laikomos pavojingosios atliekos, turi būti įrengta vėdinimo sistema.

Visi laikinai laikomų, surenkamų, vežamų ir laikomų pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinėti.

Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma,

atspari aplinkos poveikiui.

Vykdamy statybos darbus, numatomas statybinių atliekų išvežimas, kaip tai numato LR AM įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“.

Statybos aikštelėje atvežami ir pastatomi į numatyta vieta atliekų konteineriai. Statybos teritorijoje numatytas laikinas įvairių atliekų sandėliavimas pagal atliekų kodus. Susidarančias atliekas patalpinti į tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas. Laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai. Šiuos konteinerius paženklinėti pagal LR Aplinkos ministro patvirtintų „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus. Metalų laužas sandėliuojamas atskirai, išvežimą ir pridavimą organizuoja Rangovas. Visos likusios atliekos tvarkomos Rangovo ir pristatomos į atitinkamus sąvartynus ir utilizuojamos. Statybinės atliekos tvarkomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisykles (LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-637).

Griovimo atliekos hidrauliniiais griebtuvais pakraunamos į savivarčius ir vežamos į numatytą laikiną saugojimo aikštelę. Demontuotos metalinės konstrukcijos perduodamos antriniam perdirbimui.

Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalais, laistomas, kad nedulkėtų. Statybos teritorijoje, prie ardomų statinių, įrengiamos laikinos demontuotų medžiagų sandėliavimo aikštelės.

7. Gamybinės, ūkinės ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos rekonstruojant ar griauinant statinius

Griovimo metu šiuo projektu apimamoje sklypo dalyje negali vykti jokia ūkinė veikla.

Statybos darbų zonos atitinkamai prižiūrimos, esant poreikiui aptveriamos, bus pastatomi specialūs ženklai, informuojantys apie galimą pavojų.

8. Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino ribojimo ar uždarymo galimybės ir sąlygos.

K. Donelaičio gatvės atkarpos rekonstravimo darbai bus vykdomi nutraukiant eismą atkarpoje tarp J. Basanavičiaus ir Mindaugo gatvių. Eismas nukreipiamas apylanka gretimomis gatvėmis. Rangovas gali uždaryti eismą tik gavęs Vilkaiviškio rajono savivaldybės administracijos leidimą ir susiderinęs su Vilkaiviškio rajono policijos komisariatu.

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į jiems priklausančius aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus ir eismo nukreipimą apylanka. Darbų vykdymo zona privalo būti aptverta.

Eismas organizuojamas apylanka, kai nėra galimybių leisti eismą greta darbo vietų (perkasamas kelias, bandomas tiltas, kasami durpingi ruožai, kai nukreipiant eismą apylanka taisomame kelio ruože pasiekiamas geresnė kokybė, sumažinama darbų trukmė ir pan.).

Norint organizuoti eismą apylanka reikia:

- parinkti apylankų ruožams kelius, įvertinti jų dangos plotį, konstrukciją, skersinį ir išilginį nuolydžius, kelkraščių būklę, horizontaliųjų ir vertikalųjų kreivių spindulius, jei reikia, papildomomis priemonėmis užtikrinti, kad šie ruožai suintensyvėjus eismui būtų saugūs (pvz., pagerinti važiuojamosios dalies dangą, įrengti pralankas),

- darbus atliekančiam statybos rangovui parengti organizuoti eismui apylanka skirtą kelio ženklų schemą,

- kelio ženklų schemą suderinti su kelių valdytojais, policija, Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (dėl maršrutinio ir krovinio transporto važiavimo galimybių) ir savivaldybės (-ėms), kurioje bus organizuojamas eismas apylanka (dėl vietinio maršrutinio transporto).

Maršrutas apylanka įvertinamas vadovaujantis įsakymu Nr.3-747 ir surašomas apylankos maršruto apžiūros aktas.

Pagal suderintą kelio ženklų schemą įrengus apylankos kelio ženklus, kitus kelio ženklus, prieštaraujančius apylankos kelio ženklų schemai, reikia nuimti, uždengti arba kryžmai užbraukti raudona spalva. Užbraukimui naudoti medžiagas, kurios naktį turi būti gerai pastebimos.

Vadovaujantis suderinta kelio ženklų schema, pagrindinėse kryptyse prieš darbo vietas (visiškai užtvartą kelio ruožą) įrengiami 628-ieji VŽ „Apylankos schema“.


 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	6	21	0

Pagal apylankos maršrutą visuose posūkiuose iki apylankos pabaigos atitinkamai išdėstomi 629–634-ieji VŽ „Apylankos kryptis“.

Pagal TES arba atitinkamai suderintas kelio ženklų schemas užtvėriamos arba atitvėriamos darbų vietos.

Apie numatytą visišką kelio užtvėrimą turi būti pranešta per informavimo priemones (radiją, televiziją, spaudą). Apie apylanką reikia pranešti taip, kad eismo dalyviai galėtų prisitaikyti prie naujos nenumatytos situacijos.

Visa atsakomybė dėl apylankos techninių eismo reguliavimo priemonių ir kelių priežiūros tenka darbus atliekančiam statybos rangovui (sugadintų kelio ženklų, konstrukcinių elementų atstatymas, apylankos kelių dangos atkūrimas ir pan.).

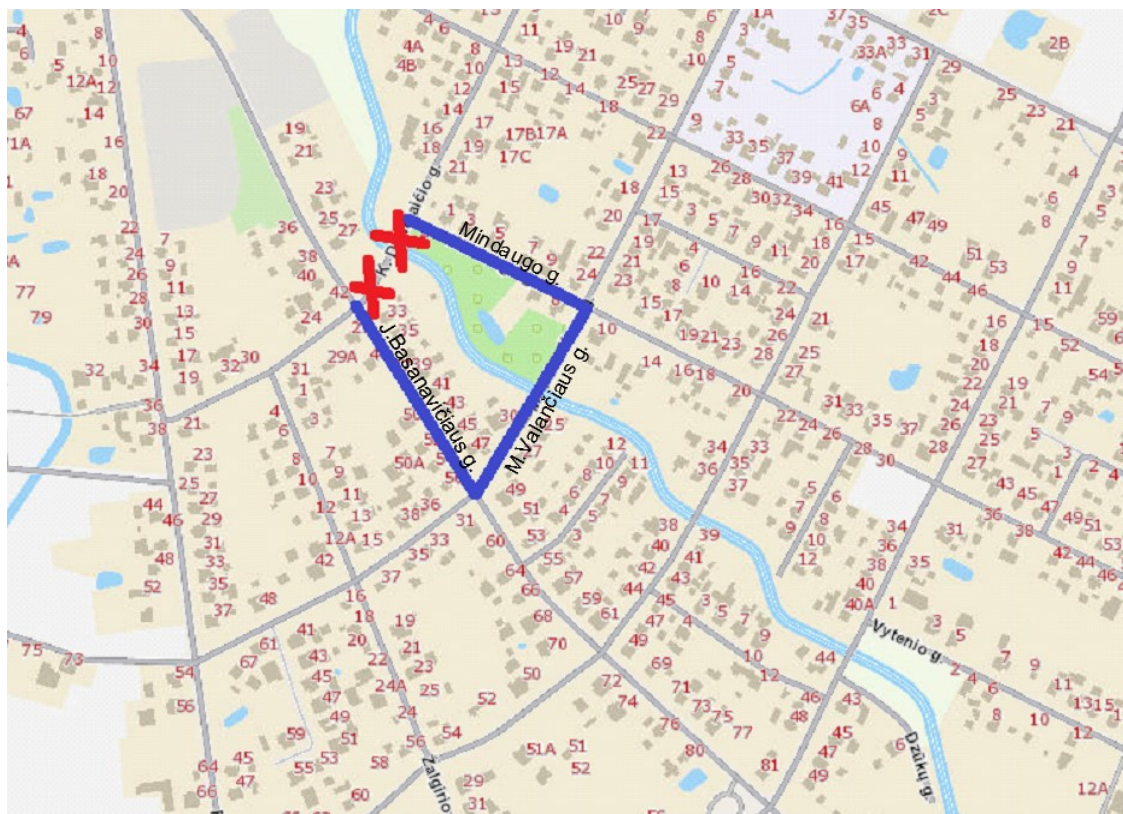


Eismo organizavimas apylanka Mindaugo, M. Valančiaus ir J. Basanavičiaus gatvėmis.

Prieš uždarant eismą rekonstruojama gatvės atkarpa reikia dvi savaitės prieš darbų pradžią pateikti prašymą kelių valdytojui. Leidime riboti eismą nurodoma:

- duomenys apie darbų vietą;
- statinio projekto dėl darbų kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje patvirtinimo ir suderinimo žymos ;
- mokesčio už eismo ribojimą įmokos suma, mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (jei toks mokestis yra taikomas);
- statybos darbų pobūdžio trumpas aprašymas.
- pateikiama apylankos schema, suderinta su policija;
- statybos darbų vykdytojas, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, adresas, įmonės kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas;
- savivaldybės leidimas rekonstruoti objektą, nurodomas leidimo numeris, data, kas pasirašė, pareigos, telefonas;
- statinio statybos techninis prižiūrėtojas, nurodomas statusas (juridinis ar fizinis asmuo), pareigos, vardas, pavardė, atestato Nr., telefonas;
- darbų pradžios ir pabaigos datos;
- atliekamų darbų garantinis laikas;

Leidimas riboti eismą gaunamas vadovaujantis schema:

	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	7	21	0

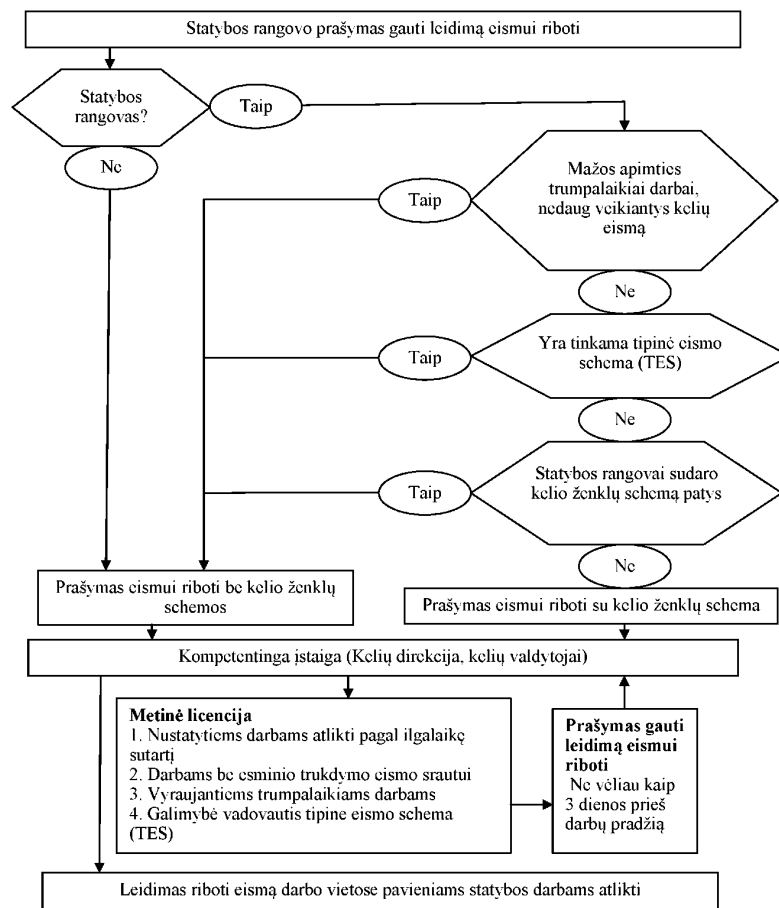

9. Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos

Visi darbai vykdomi ir sandėliavimo vietos numatomos valstybei priklausančioje žemėje.

Prieš darbų pradžią Užsakovas perduoda aktu Rangovui darbo vietą, mechanizmų ir žmonių judėjimo zonas, esamus darbo zonoje inžinerinius tinklus. Išrašo ir išduoda Rangovui bendrą nurodymą, skirdamas darbo zoną, teritoriją.

Rangovas privalo laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklių ir kitų norminių aktų. Instruktuoja savo darbuotojus.

Baigus darbus visos pažeistos dangos turi būti atstatytos į pradinį būvį.

10. Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimo, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu

Statybos metu, elektros energija objektas aprūpinamas laikina kabeline linija iš esamų elektros skydų.

Elektros instaliacijos kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninių veiksnių poveikio juos klojant tam pritaikytuose vamzdžiuose, loviuose ir (ar) metalinėse rankovėse, arba kabeliai nuo žemės paviršiaus turi būti ne žemiau kaip:

1. 2,75 m prie pastato sienos;
2. 3,5 m virš takų ir šaligatvių;
3. 5,5 m virš kelio ar įvažiavimo važiuojamosios dalies.

Elektros instaliacijos vamzdžiai, loviai ir (ar) lanksčios metalinės rankovės turi būti suprojektuotos ir paklotos taip, kad jose nesikauptų ir nesikondensuotų aplinkos drėgmė.

Statybos darbų vykdymo metu, maksimalus elektros poreikavimas (kW) nurodytas lentelėje:

 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	8	21	0

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas	Kiekis vnt.	KW, vieneto	KW, bendras
	Elektros prietaisai	10	2	20
	Giluminis vibratorius	1	2,5	2,5
	Plokštuminis vibratorius	1	2,5	2,5
	Statybos aikštelės apšvietimas (priimamas: 1kW x 11=11kW)	11	1,0	1,0
	Buitiniai poreikiai			5,0
	ΣKW:			41,0

Elektros energijos poreikavimas statybos metu $E = \sum ES \times k = 41,0 \times 0,6 = 24,6 \text{ kW}$.

Vieną metų visi elektros vartotojai statybos aikštelėje nedirbs.

Vanduo technologinėms reikmėms ir geriamas vanduo bus tiekiamas iš esamos įmonės vandentiekio sistemos.

Statybininkai ryšiui galės naudoti mobiliuosius telefonus.

Buitinės patalpos bus šildomos tik šaltu periodu.

11. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms – orientacinis mechanizmų sąrašas nurodant techninius rodiklius

Atliekant statinių griovimo, statybos darbus, numatomas šių mechanizmų ir įrenginių naudojimas (mechanizmų ir įrenginių rūšys bei kiekiai gali būti pasirinkti kiti, priklausomai nuo rangovo poreikių ir galimybių):

- Automobilinis kranas su teleskopine strėle iki 10t keliamos galios - 1 vnt;
- Ekskavatorius žemės darbams (ilgastrėlis) - 1 vnt;
- Ekskavatorius žemės darbams (buldozeris) - 1 vnt;
- Bortinė mašina su manipulatoriumi - 2 vnt;
- Autokrautuvai - 1 vnt;
- Elektriniai grąžtai, elektriniai šlifuočiai, metalo ir betono pjovimo pjūklai - 8 vnt;
- Giluminis vibratorius - 1 vnt;
- Plokštuminis vibratorius - 1 vnt;
- Betono maišyklė 0,15 m³ - 1 vnt;
- Asmeninės apsaugos priemonės (darbo drabužiai, batai, šalmai, respiratoriai) - 24 vnt.

Visi naudojami statybiniai mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir/ar tepalų nutekėjimas bei patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama naudoti kenksmingas aplinkai medžiagas. Iš statybos zonos į gatvę išvažiuojančio autotransporto ratai turi būti švarūs ir esant reikalui nuplaunami vandeniui.

12. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos.

Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, aplinkai, nepažeis darbų saugos reikalavimų.

Prieš pradedant darbus reikia nustatyti ir patikrinti žemėje esančių komunikacijų būklę ir užtikrinti, kad jos būtų tinkamai apsaugotos ir pažymėtos.

Privaloma paskirti statinio statybos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe koordinatorių.

Negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemonių planas.

Statybvietę supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos.

Pagalbinėje statybos darbų aikštelėje, pastatomos laikinos darbininkų buitinės patalpos, statybos vadovo patalpos, prausyklos ir tualetų patalpos.

Statybos teritorija atitverčiama signaliniu aptvėrimu arba segmentine laikina tvora.

	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	9	21	0

Teritorijoje prie buitinių patalpų įrengiami priešgaisriniai stendai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

Priešgaisrinio stendo inventorių: 2 kibirai, 2 kirviai, 2 laužtuvai, kopėtelės, kablys, 0,5 m³ smėlio dėžė, 2 gesintuvai, 2 kastuvai.

Rangovas paskiria vieną saugos ir sveikatos koordinatorių, kuris statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius:

1. koordinuoja reikalavimų, nustatytų statinio techniniame darbo projekte bei statybos darbų technologijos projekte bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu.

2. sprendžia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypač statybvietėje atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito;

3. įvertina darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;

4. koordinuoja darbdavių ir, jei reikia, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą, kad jie vykdytų statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte numatytas priemones bei užtikrintų:

4.1. tvarką ir švarą;

4.2. tinkamą darbo vietų išdėstymą, atsižvelgdamas į priėjimo prie šių darbo vietų sąlygas bei nustatydamas judėjimo kelius arba zonas;

4.3. saugias įvairių medžiagų naudojimo ir tvarkymo sąlygas;

4.4. darbo įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą, jų patikrinimą prieš naudojimą ir reguliarią kontrolę, siekdamas pašalinti trūkumus, galinčius pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai;

4.5. įvairių medžiagų atskyrimą ir jų sandėliavimo vietų įrengimą, jei tai ypač pavojingos žaliavos arba medžiagos – tokių vietų ženklavimą;

4.6. panaudotų medžiagų tinkamą rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams;

4.7. statybinių ir kitų atliekų rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams;

4.8. darbų arba darbų etapų normalią trukmę ir eiliškumą, numatytus statybos darbų technologijos projektuose, darbų ar jų etapų trukmės koregavimą, atsižvelgdamas į darbų eigą;

4.9. bendradarbiavimą tarp darbdavių, tarp savarankiškai dirbančių asmenų bei tarp darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų;

5. atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte;

6. organizuoja darbdavių, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje, bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdamas nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją, taip pat organizuoja darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų bendradarbiavimą;

7. kontroliuoja statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;

8. imasi priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę.

Ypatingą dėmesį reikia kreipti į tai, kad:

-pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais

-darbo vietos būtų gerai apšviestos

-kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti

-darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis

-statybos aikštelėje būtų vaistinė su būtinomis pirmosios medicinos pagalbos priemonėmis

- būtų sudarytos sąlygos darbininkams pailsėti, persirengti, pavalgyti, nusiprausti.

Darbininkai, atliekantys šiuos darbus turi būti išklause įvadinį instruktažą ir pirminį instruktažą darbo vietoje.

Buitinės patalpos, administracinės (statybos vadovo) patalpos įrengiami aikštelėje, šalia griau-namo statinio. Buitinėse patalpose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuo-tojai atvyksta ne su darbo rūbais valgymo ir poilsio patalpa.

 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	10	21	0

Buitinės patalpos turi būti reikiamo dydžio, jose turi būti reikiamas kiekis stalų ir kėdžių, įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti.

Statomos laikinos buitinės patalpos - vagonėlio tipo konteineriai 3x6 m matmenų.

Laikinose buitinėse patalpose turi būti: drabužinė, drabužių ir avalynės džiovinimo patalpa, apšilimo patalpa, poilsio ir valgio patalpa.

Buitinių patalpų normos 1 žmogui (pagal aprašo „BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ APRASAS“, LR vyriausybės nutarimas Nr.501, 2003-04-24).

SR - drabužinė	-0.35m ²
SD - džiovyklos patalpos	-0.15m ²
SPV- poilsio ir valgio patalpos	-0.90m ²
SAPP - asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos	- 0,07 m ²
SPSP - persirengimo spintelės (1vnt/1 žm)	- 10 vnt.
SPR - prausykla (1 vnt/10 žm)	- 1 vnt.
WC - tualetas (biotualetas) 30 žm.1 vnt (1,2x0,8 m)	- 1 vnt .

DARBŲ SAUGA

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis “Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas”, “Kėlimo kranų naudojimo taisyklės”, “Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai”, “Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai”, “Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinio tipo su spec. važiuokle kranų kranininko saugos ir sveikatos instrukcija”, “Kėlimo kranų darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija” bei kitais galiojančiais darbo saugos dokumentais.

Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie darbų saugos ir priešgaisrinius reikalavimus statybvietėje. Prie buitinių patalpų bei statybos darbų vietoje turi būti gesintuvai. Rūkyti leidžiama specialiai skirtoje vietoje, pažymėtoje užrašu “VIETA RŪKYMUI”.

Prieš pradėdant darbus darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, pravedamas darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimas darbo vietoje, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Ardymo darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą.

Prieš keliant medžiagas, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas užkabinimo elementų stovis. Medžiagos kabinamos pagal atitinkamas kabinimo schemas.

Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.

Draudžiama vykdyti medžiagų kėlimo darbus, esant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo.

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovinio kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytąjį mašinos pase.

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais.

Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikiniais aptvarais. Darbo vietos apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx.. Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektriniai aparatai prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių.

Vykdamas statybos darbus ir naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas.

Vykdamas darbus, būtina vadovautis specialiomis žemės sklypo naudojimo sąlygomis.

 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	11	21	0

Nelaimingi atsitikimai darbe. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, būtina:

- 1 sustabdyti nelaimingą atsitikimą;
- 2 suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
- 3 kviesti pagalbą.

Veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui. Įvykus incidentui, kurio metu išvengta asmenų traumų būtina:

- Išsiaiškinti veiksmų eigą ir informuoti saugos personalą
- Sustabdyti incidentą.
- Nutraukti darbus toje teritorijoje.
- Reikalui esant, aptverti teritoriją papildoma tvora.
- Išjungti įrenginius, elektros srovę ir kt.

Informuoti:

- Statybvietės vadovybę ir saugos personalą.
- Susisiekti su saugos ir sveikatos koordinatoriumi. Saugos ir sveikatos koordinatorius įvertina ir sprendžia, ar reikia surašyti aktą dėl incidento, ir pasirūpina, kad būtų informuotas saugos personalas.
- Nelaimingus atsitikimus ir incidentus, kurių metu išvengta traumų, reikia aptarti per kitą saugos susirinkimą. Jei reikia, sušaukiamas neeilinis saugos susirinkimas.

Įvykus incidentui, kurio metu yra nukentėjusiųjų, būtina:

1. Asmuo, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe (jeigu jis pajėgia), ar matęs įvykį arba jo padarinius, privalo apie nelaimingą atsitikimą darbe nedelsdamas pranešti padalinio vadovui arba įmonės vadovui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą darbe arba jo padarinius, privalo nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą.

2. Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai turi informuoti kiekvieną darbuotoją įvadinio ar pirminio instruktavimo darbo vietoje metu apie jo pareigą nedelsiant pranešti apie kiekvieną nelaimingą atsitikimą, įvykusį darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo.

3. Įmonės vadovas, kiti darbdavio įgalioti asmenys privalo nedelsdami užtikrinti pirmosios medicinos ir kitokios pagalbos suteikimą, o prireikus nugabenti nukentėjusįjį į gydymo įstaigą, organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą.

4. Apie nelaimingus atsitikimus darbe padalinio vadovas privalo nedelsdamas pranešti įmonės vadovui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai, darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui.

5. Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo apie sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, ir apie nelaimingus atsitikimus darbe, dėl kurių nukentėjęs asmuo mirė, taip pat apie tai, kad asmuo mirė darbe dėl ligos, nesusijusios su darbu, privalo nedelsdamas telefonu, elektroniniu paštu, faksu arba kitomis ryšio priemonėmis pranešti:

5.1. atitinkamos apylinkės prokuratūrai;

5.2. Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, pateikdamas nustatytosios formos pranešimą

5.3. nukentėjusiojo šeimai ar jo atstovui.

6. Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo šių Nuostatų nustatyta tvarka privalo pagal kompetenciją pranešti apie nelaimingus atsitikimus darbe, susijusius su:

6.1. statinių avarijomis – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

6.2. pavojingų objektų, kitų objektų ar įrenginių avarijomis, gaisrais, sprogimais – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos;

7. Įmonės vadovas ar padalinio vadovas įmonėje, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, privalo darbo vietą ir įrenginių būklę iki nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo pradžios išsaugoti tokius, kokie jie buvo nelaimingo atsitikimo darbe metu. Būtinai pakeitimai gali būti daromi, jeigu jų nepadarius kiltų pavojus aplinkinių asmenų gyvybei ir sveikatai, tačiau visa tai, kas buvo iki pakeitimų, turi būti raštu ir grafiškai įforminta, nufotografuota ar nufilmuota.

8. Lengvus nelaimingus atsitikimus darbe tiria įmonės vadovo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu patvirtinta dvišalė komisija, sudaryta iš darbdavio atstovo (atstovų), kurį (kuriuos) skiria įmonės vadovas, ir darbuotojų atstovo (atstovų) saugai ir sveikatai, išrinkto (išrinktų) Lietuvos

 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	12	21	0

Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 str. nustatyta tvarka. Atliekant tyrimą, gali dalyvauti nukentėjusysis. Jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, lengvą nelaimingą atsitikimą darbe tiria darbdavio pareigas vykdančio asmens arba paskirtas jo darbuotojas ir darbuotojų atstovas ar nukentėjusysis arba jo atstovas.

Pirmoji pagalba:

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą.

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti.

Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip numatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais.

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Pirmosios pagalbos medicininės priemonės:

- | | |
|---|---------|
| 1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm*12 cm | 2 vnt. |
| 2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm | 8 vnt. |
| 3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m | 1 vnt. |
| 4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm | 10 vnt. |
| 5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* | 1 vnt. |
| 6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m | 3 vnt. |
| 7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m | 3 vnt. |
| 8. Pirmosios pagalbos žirkklės | 1 vnt. |
| 9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* | 20 vnt. |
| 10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm | 2 vnt. |
| 11. Sterilus akių tvarstis* | 2 vnt. |
| 12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm | 1 vnt. |
| 13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm | 1 vnt. |
| 14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm | 6 vnt. |
| 15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm | 1 vnt. |
| 16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m | 1 vnt. |
| 17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm | 3 vnt. |
| 18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės | 4 vnt. |
| 19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba 1 vnt. | 1 vnt. |
| Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė | |
| 20. Rinkinio aprašas* | 1 vnt. |

* Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių. Gamyklų, fabriklų, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartinio 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarstinių) – atsižvelgiant į poreikį.

Kolektyvinės saugos priemonės

Kolektyvinės apsaugos priemonės turi pirmenybę asmeninių apsaugos priemonių atžvilgiu.

Esant pavojui: Kritimas iš 1,3 m ar daugiau aukščio (angos, laiptai, tilteliai, plokščias stogas, pastoliai, kopėčios ir pan.)

Taikomos priemonės:

	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	13	21	0

Visos angos turi būti apsaugotos aptvarais, paklotais, skydais arba apsauginiais tinklais iš aukštos kokybės ir patikimai pritvirtintų medžiagų. Laiptai, tilteliai, stogeliai, pastoliai užtikrins tvirtumą ir stabilumą.

Priemonių įdiegimas:

Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) rūpinasi, kad kvalifikuotas personalas įrengtų apsaugos priemones. Jie reguliariai patikrina šių priemonių stabilumą, tvirtumą ir tinkamą naudojimą. Darbuotojai jas įrengia, jei būtina, ar praneša apie jų nebuvimą atsakingam statybos darbuotojui.

Esant pavoju: Priėjimų, judėjimo kelių ir darbo zonų netvarkingumas (užkrovimas, nelygumai).

Taikomos priemonės:

Visi praėjimai, judėjimo keliai ir darbo zonos laikomos švarios ir jose neturi būti to kas nereikalinga.

Atliekant išpakavimo darbus medžiagos ir nuolaužos atrenkamos ir tvarkingai sudedamos bei pašalinamos. Medžiagų ir įrengimų sandėliavimas turi būti stabilus.

Priemonių įdiegimas:

Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) rūpinasi, kad visi praėjimo takai ir darbo zonos būtų švarūs ir jų būklė netrukdytų saugiam judėjimui ir darbui.

Darbuotojai, įpareigoti atsakingų asmenų, rūpinasi praėjimo takų ir darbo zonų būkle.

Esant pavoju: Medžiagų ir įrengimų, kurie pavojingi dėl savo savybių, svorio, dydžio ar kitų sąlygų, naudojimas ir laikymas.

Taikomos priemonės:

Darbai bus atliekami su pritaikyta įranga, su kuria dirbs kvalifikuotas personalas. Įranga periodiškai tikrinama. Draudžiama būti po transportuojamais kroviniais ir greta jų.

Priemonių įdiegimas:

Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) rūpinasi, kad darbai būtų atliekami naudojant atitinkamą įrangą, kad ji būtų periodiškai tikrinama, personalas būtų kvalifikuotas ir apmokytas su ja dirbti, ypač kai naudojami kėlimo įrenginiai (kranai ir pan.). Jei būtina jie užtikrina personalo mokymus.

Esant pavoju: Gaisras.

Taikomos priemonės:

Jei sandėliuojami greitai užsiliepsnojančys produktai, arti jų ir toje pat patalpoje draudžiama rūkyti ir kurti ugnį. Pakankamas gesintuvų skaičius patalpoje (biuruose, valgyklose, rūbinėse ir sandėliuose). Prie kiekvieno suvirinimo aparato privalo būti gesintuvas.

Priemonių įdiegimas:

Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) duoda nurodymus, draudžiančius kurti ugnį ir rūkyti greitai užsiliepsnojančių produktų laikymo vietose.

Esant pavoju: Elektros pavojus.

Taikomos priemonės:

Elektros instaliavimo ir taisymo darbus atlieka kvalifikuotas personalas ir naudodamas tinkamas medžiagas. Įrenginiai, naudojantys elektros energiją turi atitikti saugos normų reikalavimus. Jais dirbantis personalas turi būti supažindinamas su atitinkamomis instrukcijomis.

Priemonių įdiegimas:

Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) rūpinasi, kad elektros instaliavimą ir elektros įrenginių darbą prižiūrėtų atsakinga įstaiga, o juos įrengtų ir naudotų kompetentingas personalas. Jei būtina, jie užtikrina personalo mokymus.

Esant pavoju: Darbuotojų sveikatai ir higienai.

Taikomos priemonės:

Kiekvienoje statybvietėje turi būti rūbinės/valgyklos ir sanitarinės patalpos atitinkamai pagal darbuotojų skaičių. Darbuotojams leidžiama valgyti, praustis ar atlikti gamtinius reikalus tik tam pritaikytoje patalpoje.

Priemonių įdiegimas:

Statybos atsakingi darbuotojai (statybos vadovai) rūpinasi, kad darbuotojai naudotųsi sanitarinėmis patalpomis. Jie rūpinasi, kad šios patalpos būtų reguliariai valomos.

Atsitikus nelaimingam įvykiui ar esant susirgimui.

 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	14	21	0

Taikomos priemonės:

Nelaimės atveju pagalbą suteikia žmogus, mokantis teikti pirmąją pagalbą. Kiekvienoje statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlė. Arčiausiai esančio gydytojo ir ligoninės koordinatės turi būti iškabintos statybvietėje (prie telefono). Rimtos nelaimės atveju skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.

Priemonių įdiegimas:

Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovas) rūpinasi, kad būtinos priemonės būtų statybvietėje ir kad joje būtų paskelbti asmenų ir tarnybų, kuriuos reikia kviesti nelaimės atveju, duomenys.

Apsauginiai aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio

Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos apsauginiais aptvarais, apsaugančiais darbuotojus nuo kritimo iš aukščio. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus -su viduriniu tašeliu. Aptvarai turi būti tokio stiprumo ir stabilumo, kad apsaugotų darbuotojus nuo kritimo iš aukščio. Naudojant medinius apsauginius aptvarus būtina, kad atstumas tarp statramsčių nedidesnis kaip 2,25 m, ir šie reikalavimai: porankis turi atlaikyti ties viduriu pridėtą 1,25 kN (125 kg) koncentruotą apkrovą nepasislinkdamas nuo pradinės padėties daugiau kaip 25 mm; porankis ir vidurinis tašelis turi būti 31x125 mm, o papėdės juosta – 31x150 mm.

Asmeninės apsaugos priemonės**Esant pavoju: Daiktų kritimas ir atsitrengimai į daiktus, galintys sukelti traumas.****Taikomos priemonės**

Kiekvienas dirbantis statybvietėje privalo dėvėti šalną. Jis dėvimas kiekvieną kartą kai tik yra krentančių daiktų ir atsitrengimo į daiktus pavojus.

Priemonių įdiegimas:

Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovas) rūpinasi, kad šalnas statybvietėje, kai yra pavojus, būtų nešiojamas.

Esant pavoju: Triukšmas.**Taikomos priemonės:**

Kiekvienas asmuo dirbantis ar esantis aplinkoje, kuri gali pakenkti klausai, naudoja ausų apsaugas (kamšalus arba ausines).

Priemonių įdiegimas:

Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) rūpinasi, kad ausų apsaugas nešiotų visi asmenys, kurie gali nukentėti.

Esant pavoju: Pavojus susižaloti rankas dėl kontakto su medžiagomis ir įrengimais, arba dėl kontakto tarp jų: su aštriomis šiurkščiomis dalimis arba deginančiomis, su koroziją sukeliančiomis, taip pat dėl radiacijos, vibracijos, kritinių temperatūrų, liepsnos ir kt.

Taikomos priemonės:

Kiekvienas asmuo dirbantis darbą, kuris gali sukelti rankų sužalojimą, nešioja pirštines, pritaikytas apsaugoti nuo atitinkamo pavojaus.

Priemonių įdiegimas:

Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) rūpinasi, kad pirštines nešiotų visi asmenys, kurie gali nukentėti.

Esant pavoju: Kūno sužalojimui.**Taikomos priemonės:**

Kiekvienas statybos darbuotojas privalo nešioti darbo drabužius, kuriuos jam išduoda darbdavys. Bet koku atveju jam neleidžiama būti statybvietėje be darbo drabužių.

Priemonių įdiegimas:

Statybos atsakingi darbuotojai (padalinio vadovai) prižiūri, kad kiekvienas darbuotojas turėtų ir nešiotų darbo drabužius ir kategoriškai draudžia dirbti be darbo drabužių.

Darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) pagal įmonės vadovo patvirtintą „Nemokamai išduodamų AAP sąrašą“ (pridedamas): darbo drabužiais, darbo avalyne, apsauginiais šalmais, signalinėmis liemenėmis, apsauginiais diržais, pirštinėmis, apranga apsaugančia nuo atmosferos poveikio (lietpaltis, guminiai batai).

 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	15	21	0

Visos asmeninės apsauginės priemonės išduodamos įrašant į darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelę ir darbuotojui pasirašant.

Asmeninės apsaugos priemonės, apsaugančios nuo nepalankių meteorologinių sąlygų (žema ar aukšta temperatūra, lyjant, snigant) privalo dėvėti esant šioms sąlygoms.

Asmeninės apsaugos priemonės laikomos, darbuotojo asmeninėje spintelėje.

Asmeninių saugos priemonių taikymo ir naudojimo tvarka:

- darbo drabužiai, darbo avalynė, apsauginis šalmas, dėvimi pastoviai darbo metu;
- darbo metu, kai yra galimas kontaktas su betonu ar skiediniu būtina naudoti gumines pirštines ir apsauginius akinius;
- apsauginis diržas naudojamas dirbant:
- darbo vietose aukštyje virš 1,3 m, neįrengus kolektyvinių saugos priemonių (apsauginiai aptvarai) ir yra darbuotojui galimybė nukristi;
- įrengiant kolektyvines saugos priemones; statant (montuojant) ir ardant pastolius.
- apsauginiai akiniai ar apsauginis skydelis naudojami dirbant su įrankiais,
- įrenginiais ar mašinomis, kai yra galimybė atsirasti apdirbamų medžiagų
- atskilusioms – lekiančioms dalelėms;
- respiratorius naudojamas kai darbo aplinkoje padidėjęs dulketumas ir kitomis
- priemonėmis jo sumažinti ir apsaugoti darbuotojo negalima;
- ausinės ir antifonai (kištukai) naudojami kai darbo aplinkoje bendras triukšmo
- lygis viršija žemutinę ribinę vertę veiksams pradėti – 80 dB(A) ir kai kitomis
- priemonėmis sumažinti negalima.
- Asmeninių saugos priemonių netinkamumo požymiai:
- Susidėvėjęs arba suplyšęs medvilninis kostiumas.

Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje atveju.

Priešgaisrinė sauga

Visi dirbantys statybos aikštelėje turi laikytis priešgaisrinio režimo. Kasdien prieš darbų pabaigą iš darbo vietos turi būti pašalintos visos gerai degančios medžiagos: mediena, pjuvenos, plastmasės. Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Prie jų turi būti naudojimo instrukcijos. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. Gaisrinis inventorių turi būti nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo aplinkos.

Gaisrą statybvietėje gali sukelti ir netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos, mechanizmai. Pilti degalus į bakus galima tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Prasidėjus gaisrui griovimo darbų aikštelėje, būtina tuoj pat išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linijas. Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 iškviečiama gaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Gaisras

Vykdam statybos darbus reikia vadovautis priešgaisrinėmis apsaugos taisyklėmis. Turi būti užtikrinamos tinkamos gesinimo sąlygos. Objekte turi būti įrengtas priešgaisrinis postas. Gaisro atveju turi būti užtikrintas gesinimo mašinų privažiavimas prie statinio. Turi būti užtikrinamos tinkamos gesinimo priemonės. Rūkyti galima tik tam skirtose vietose.


Darbininkai (sargai ir kt.), pastebėję gaisrą, privalo:

- 1 nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112;
- 2 nedelsiant informuoti statinio statybos vadovą;
- 3 perspėti statybvietės teritorijoje esančius žmones, organizuoti jų bei turto evakuaciją;
- 4 gesinti gaisrą turimomis priemonėmis, kol atvyks priešgaisrinė tarnyba.

Gaisro atveju statinio statybos vadovas privalo:

- 5 įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai, jei ne – nedelsiant juos iškviesti;
- 6 apie įvykį informuoti bendrovės vadovą bei saugos ir sveikatos koordinatorių;
- 7 informuoti kitus asmenis/įmones, kurių veiklai/poilsui /gyvenimo sąlygoms gaisras gali padaryti žalos;
- 8 vadovauti evakuojant žmones ir gesinant gaisrą, kol atvyks ugniagesiai;

 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	16	21	0



9 sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenį, gerai pažįstantį statybvieta ir žinantį priešgaisrinių vandens telkinių vietas);

10 prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;

11 sustabdyti darbus statybvietaje, kol nebus užgesintas gaisras;

12 prireikus nutraukti elektros tiekimą, išjungti šilumos, oro tiekimo sistemas ir kt.;

13 vadovauti gaisrą gesinantiems darbuotojams;

14 imtis priemonių, kad gaisrą gesinantys asmenys būtų apsaugoti nuo galinčių griūti konstrukcijų, apsinuodijimų ir apdegimų;

15 organizuoti galinčių perkaisti pastatų konstrukcijų aušinimą.

16 atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes;

17 jei reikia, padėti ugniagesiams.

Pavojingos vietos statybvietaje

1. Pravažiavimo keliai.

2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos.

3. Elektros linijos ir įrenginiai.

4. Vykdam žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai.

Ekstremalios situacijos (avarijos)

Statant statinį bus laikomasi saugos darbo taisyklių, avarinių situacijų nenumatoma.

Esant netikėtam bei avariniam teršalų išsiliejimui aikštelėje, jie surenkami sorbentų pagalba.

Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas tvarkingai surenkami ir laikinai (iki 3 mėn.) sandėliuojami spec. vietoje konteneriuose iki perdavimo atitinkamas pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms. Deginti sorbentus arba vežti juos į sąvartyną griežtai draudžiama.

Saugos ir sveikatos ženklai

Tai ženklai, teikiantys informaciją arba nurodymus vaizdiniu ženklu, spalva, šviečiančiu ženklu, garso signalu, žodiniu pranešimu, rankų ženklais apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Darbovietes ženklinamos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklinimas būtinas, kai rizikos neįmanoma išvengti arba pakankamai apriboti techninėmis kolektyvinėmis apsaugos arba darbo organizavimo priemonėmis, metodais arba būdais.

13. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimas

Prieš vykdant darbus Rangovas turi susisiekti su vietinėmis aplinkosaugos institucijomis ir aptarti darbų eigą, bei medžiagų sandėliavimo vietas, kad nebūtų pažeisti aplinkosauginiai reikalavimai. Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi būti derinami su jais ir gaunamas jų sutikimas tokiems darbams atlikti.

14. Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; statybos skirstymas etapais, darbų sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius, būtinos technologinės pertraukos.

Numatomas darbų eiliškumas:

- Paruošiamieji darbai;
- Tilto konstrukcijų ardymo darbai;
- Žemės darbai;
- Pralaidos įrengimo darbai;

- Elektros ir elektroninių ryšių tinklų tvarkymo darbai;
- Gatvės sankasos įrengimo darbai;
- Upės vagos ir šlaitų tvirtinimo darbai;
- Gatvės dangos įrengimo darbai;
- Kelkraščių ir nuovažos įrengimo darbai;
- Apsauginių atitvarų ir kelio ženklų įrengimas;
- Aplinkos sutvarkymo darbai

Statybos darbų eiliškumo grafikas:

Darbų mėnesiai	1				2				3		
Darbų savaitės	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Statybos darbų pavadinimas											
Paruošiamieji darbai											
Tilto konstrukcijų ardymo darbai											
Žemės darbai											
Pralaidos įrengimo darbai											
Elektros ir elektroninių ryšių tinklų tvarkymo darbai											
Gatvės sankasos įrengimo darbai											
Upės vagos ir šlaitų tvirtinimo darbai											
Gatvės dangos įrengimo darbai											
Kelkraščių ir nuovažos įrengimo darbai											
Apsauginių atitvarų ir kelio ženklų įrengimas											
Aplinkos sutvarkymo darbai											

Statybos darbams įtakos turi sezoniškumas, pvz. šaltuoju metų laiku darbuotojams turi būti numatytos pertraukėlės sušilti, karštuoju metu – priemonės atvėsinti ir pan. Taip pat yra darbai (tokie kaip žemės darbai, asfaltavimo, betonavimo, pralaidos konstrukcijos surinkimo ir pan.), kurių negalima atlikti šaltuoju metu. Tokių darbų atlikimo sąlygos yra aprašytos atskirų projekto dalių techninėse specifikacijose.

Darbų technologinė pertrauka skeliama nuo gruodžio 15d. iki kovo 15d., nebent Rangovas su techninio prižiūrėtojo leidimu nusprendžia kitaip, atsižvelgiant į orų sąlygas. Taip pat gali būti ir priešingai – leidus tach. Prižiūrėtojai ir savininkui gali būti vykdomi kai kurie darbai.

Darbų vykdymo eiliškumą nusistato rangovas, kuris turi parengti statybos darbų technologijos projektą. Darbai, priklauso nuo rangovo pajėgumų, finansavimo, tiekimo galimybių ir kitų faktorių, nepriklausančių nuo projektuotojų.

Statybos darbus skirstyti į etapus nenumatoma. Žemės darbai šaltuoju metų laiku atliekami vadovaujantis taisyklių IT ŽS 17, VIII skyriaus, septintojo skirsnio reikalavimais. Pamainų skaičių pagal galimybes ir poreikį, parenka rangovas. Technologines pertraukas, jei bus poreikis, nustatys rangovas. Jei technologinė pertraukia ilgesnė kaip 3 mėn, tokiu atveju turi būti atliekami statinio konservavimo darbai:

- kai Statyba sustabdoma statybos valstybinę priežiūrą atliekančio pareigūno reikalavimu – gavus šio pareigūno leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, išduodamą statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 [3.27] nustatyta tvarka;
- kai Statybą sustabdo pats statytojas savo sprendimu.
Sustabdžius Statybą, Statybos sustabdymo trukmę numato statytojas.

Statinio konservavimo darbai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo Statybos sustabdymo, išskyrus atvejus, kai statinio konservavimo darbams pirkti, taikant Viešųjų pirkimų įstatymą, konservavimo projekte numatytas ilgesnis šių darbų atlikimo terminas.

Statinio konservavimo projekto (aprašymo) parengimą ir konservavimo darbų atlikimą organizuoja ir apmoka statytojas.

Minimali statinio konservavimo darbų apimtis turi užtikrinti:

- sumontuotų (pastatytų) statinio laikančių konstrukcijų ir atitvarų apsaugą nuo ardančių klimato, gruntinio vandens, grunto nuošliaužų, laikinų koncentruotų krūvių ir kitų poveikių, nepadidinant ir neįrengiant naujų konstrukcijų;
- nelaimingų atsitikimų statybvietėje prevenciją: statybvietės aptvėrimą, įėjimų į statinius laikiną uždarymą, laikinų statybvietės inžinerinių tinklų atjungimą nuo veikiančių inžinerinių tinklų, iškasų užpylimą ar aptvėrimą, šulinių uždengimą, įspėjamųjų ženklų pastatymą ir kitų saugos priemonių atlikimą;
- priešgaisrinę apsaugą: degalų, tepalų ir degių statybos produktų pašalinimą iš statybvietės, priešgaisrinių privažiavimų atlaisvinimą ir kitų gaisro prevencijos priemonių atlikimą;
- aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės: paviršinio vandens nutekėjimą, lakių statybos produktų pašalinimą arba uždarymą, cheminių medžiagų, degalų bei tepalų nepatekimą į aplinką ir kitas priemones.

Vykdamas darbus turi būti atlikti bandymai ir užpildyti paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų aktais, išbandymo ir priėmimo aktai:

- pastatų ir įrenginių nužymėjimas vietoje;
- tranšėjų ir iškasų po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;
- smėlio pasluoksnio po pamatais padarymas;
- kolonų, sijų, armuotų pamatų juostų, perdangimų ir kitų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonavimą;
- monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius;
- pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu;
- metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas);
- surinktų medinių konstrukcijų patikrinimas prieš montavimą;
- pagrindo po kelių ir privažiavimų pylimais paruošimas;
- žemės sankasos paruošimas privažiuojamųjų kelių dangai įrengti;
- gruntų sutankinimas po privažiuojamaisiais keliais, takais ir aikštelėmis;
- privažiuojamųjų kelių, takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas;

15. Specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai

Specialių reikalavimų statybos darbų technologijai nėra.

16. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (vadovaujantis STR 1.06.01:2016 STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA).

1. Statinio statybos techninis priežiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), vykdydamas Reglamento VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka:

 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	19	21	0

1.1. prieš statybos pradžią iš užsakovo gauna statybą leidžiantį dokumentą arba šio dokumento išdavimo datą ir numerį ir kitus Reglamento 5 punkte nurodytus dokumentus;

1.2. dalyvauja vykdant geodezinių koordinacių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas;

1.3. organizuoja ir dalyvauja užsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;

1.4. kontroliuoja, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga;

1.5. tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų, o Reglamento 5.5 papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje numatytais atvejais – ir minėtuose papunkčiuose nurodytų asmenų rašytinių sutikimų ir jų sąlygų, jei tokios buvo nustatytos, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

1.6. sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo;

1.7. kontroliuoja statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, prisijungimo sąlygų (tarp jų ir prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoją (užsakovą) apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi;

1.8. kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizė, informuoja statytoją (užsakovą), kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę;

1.9. sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka;

1.10. kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą; 1.11. privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę;

1.12. tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose;

1.13. tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus dokumentaciją), dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus;

1.14. dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus. Inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų, įrenginių priėmimo aktus taip pat pasirašo specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio statybos techninė priežiūra);

1.15. dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

1.16. dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

1.17. tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą matuojant, reikalauja, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai;

1.18. informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktinių arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (užsakovo) nurodymus;

 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	20	21	0

1.19. pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai;

1.20. kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai, neleidžia užpilti gruntu inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;

1.21. neleidžia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos užbaigimo akto / deklaracijos surašymo, įspėja apie tai statytoją (užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą;

1.22. prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoja ir kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose);

1.23. kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;

1.24. statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovas) paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu;

1.25. kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.

2. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, kai jis neįeina į bendrosios techninės priežiūros grupės sudėtį (kai specialiajai statinio statybos techninei priežiūrai sudaroma atskira sutartis), pagal jam priskirtos priežiūros sritį atlieka funkcijas, nustatytas Reglamento 108.5, 108.6, 108.10–108.22, 108.24 papunkčiuose.

17. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LAIKO SKAIČIAVIMAS

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017, „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedu)

Pagal STR 1.04.04:2017 18 priedą apskaičiavus statybos techninės priežiūros darbo laiką, gaunasi, kad statybos truks 2,75 mėnesio.


Statybos darbų technologijos projektą parengia statinio statybos Rangovas (Subrangovas) iki statybos darbų pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.

Statybos darbų vadovas turi koordinuoti savo darbuotojų veiksmus ir sudaryti darbų vykdymo planus.

 8-343-52201	2407-00-TDP-SO-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2024	21	21	0

	SKLYPŲ RIBOS
	ESAMA GATVĒS ASFALTO DANGA
	ESAMA BETONINĪŅŲ TRINKELIŅŲ DANGA
	ESAMAS NESURIŠTŪJŲ MINERALINĪŅŲ MEDŽIAGŲ APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
	PROJ. 0,4kV ELEKTROS KABELINĒ LINIJA APSAUGOS VAMZDYJE. [Objekto savininko (Vilkavišķio nuotekŲ siurbliņ Nr. 5) nuosavybē: KL ģ savininko elektros ģrenginius]
	PROJ. 0,4kV ELEKTROS KABELIO JUNGIAMOJI MOVA
	NAIKINAMA ESAMA 0,4kV ELEKTROS KABELINĒ LINIJA APSAUGOS VAMZDYJE
	PROJ. ELEKTRONINĪŅŲ RYŠĪŲ LINIJA IR ŖULINYS RKŠ-0
	ESAMA ELEKTRONINĪŅŲ RYŠĪŲ LINIJA
	STATYBVIETĒS APTVĒRIMAS LAIKINA TVORA
	ĢSPĒJAMIEĢI ŖENKLAI (KABINAMI ANT LAIKINOS TVOROS)

STATINIO NR.	STATINIO PAVADINIMAS	STATINIO KATEGORIJA	STATYBOS RŪŠIS
01	K. DONELAIČIO GATVĖ	NEYPATINGASIS	REKONSTRAVIMAS

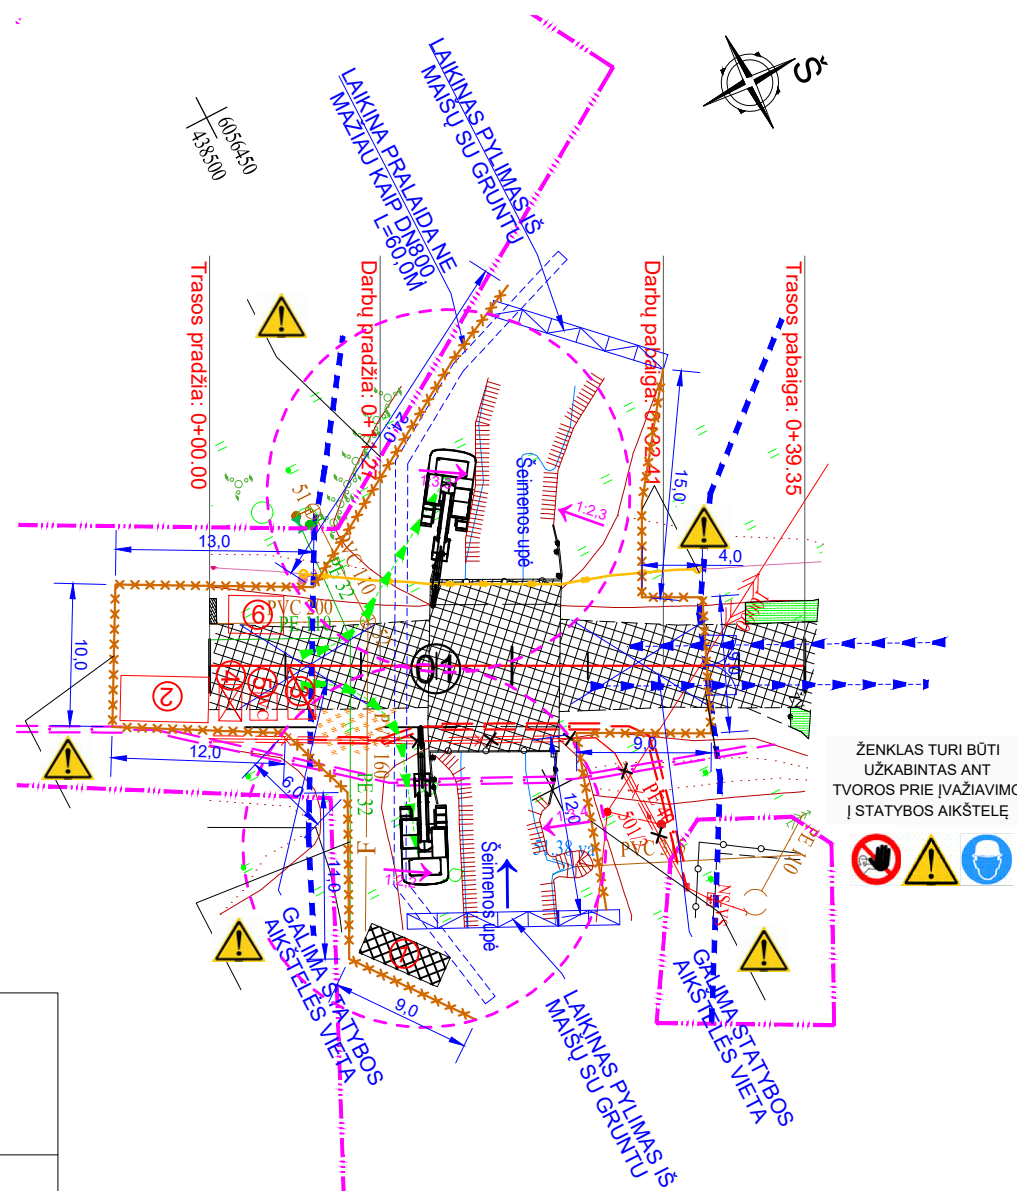

TĪSPLS projekta numurs		TĪSPLS-20240601-4366943						
Objekts		Vilkaivskis k. D., Daudzdz. dz. tilts						
Plāno tips		Topogrāfijas plāns – pilnas teritorijas						
UAB Vilkaivskis arhitektūras biuras, 18510391		Pagarināto objektu padziļināt izstrādes, cm horizontālos padziļināt: 10 vertikālos padziļināt: 10						
Kv. paš. Nr.	Vārds ir gotvārds	Pārbaudījis	Data	Gaisma modeļa	Koordinātas sistēma	Aukstgaisma sistēma	Lapas	Lapņu
1GKV-349	V	S	2024.06.11	LIT20G	LKS 94	LAS07	2	3
Uzskaites	Vilkaivskis rajons saimnieciskās			Ramgais				

1. Iki pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:
 - nuimti augalinį grunto sluoksnį (tose vietose, kur jis yra), kuris bus išvežamas iš statybų vietos;
 - įrengti laikinas administracines ir buitines patalpas;
 - įrengti laikinus įvažiavimus į statybos aikštelę.
2. Statybos metu neturi būti pažeisti esami inžineriniai tinklai. Sandeliuoti medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama;
3. Visi statybos mechanizmai turi būti įvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti medžiagas, kenksmingas gamtai ir aplinkai. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ir mechanizmų ratai turi būti švarūs;
4. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos;
5. Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvežimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą paruošia Rangovinė organizacija technologiniame projekte, suderinus su Statytoju.
6. Laikinos elektros oro linijos trasą parenka Rangovas prieš tai suderinęs su elektros tinklų eksploatuojančia organizacija. Nesant galimybei priversti laikina elektros linija Rangovas turi numatyti įrengti kita laikina elektros šaltinį.

1. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisykles statyboje" bei kitais galiojanciais darbo saugos dokumentais.

- duobės, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos bei pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir nakties metu);
- pavojingos zonos būtų pažymėtos spejamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos;
- kasamų duobių ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimus;
- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonėmis;
- aiškštelėje būtų vaistinėse su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs
- visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;
- iki statybos pradžios būtų parengtas darbų vykdymo (technologinis) projektas;
- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.

- Laikini privažiavimo keliai;
- Mechanizmų (keliamųjų kranų, ekskavatorių, buldozerių, plentvolių, traktorių, asfalto klotuvų, autogražtų ir kt.) darbo zonos;
- Laikinos elektros linijos ir įrenginiai;
- Vykdančios žemės darbus - veikiančios požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekiai vamzdynai;
- Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - montavimo darbų zona;
- Vykdančios ardymo ir demontavimo darbus - šių darbų zona.

1. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindine priemone apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;
2. Grunto kasymai ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasoje;
3. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 H dažnio, bei įtampa aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinė srovės įtampa aukštesnė kaip 110 V;
4. Gaisrų gesinimas, avinių ir gaivinių nelaimių padarinių likvidavimas.

1. Vykdam darbus, numatoma įrengti statybos aikštelę, aptvertą laikinąja tvora, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys;

2. Statybviėtė rekomenduojama įrengti laisvoje valstybėjeje žemeje, K.Donelaičio gatvės ribose. Prieš įrengiant statybos aikštėlę, jos vieta turi būti suderinta su šios teritorijos valdytoju arba savininku;


3. Numatyti įrengti laikini pylimai iš maišų užpildytų gruntu (maišai nepraleidžiantys vandens) iki laikinas 800mm PVC vamzdis upės vandeniui pratekti (kuris statybos metu esant reikalui gali būti perkeltas). Iš darbų zonos vanduo šalinamas išcentriniais siurbiais.

1.Koordinacijų sistema - LKS 94, aukščių sistema - LAS07

2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemes darbus, privalo išsikviesti inžinierius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą;
3. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
4. Tuo atveju, jei Rangovas pasirenka įrengti statybų aikštelę kitoje vietoje, priklausančioje privačiam asmeniui, Rangovas privalo gauti sklypo savininko sutikimą.
5. Prieš pradėdamas statybos darbus būtina patikrinti topografinės nuotraukos aukščius bei informuoti projekto vadovą.
6. Pradėdamas žemės darbus požeminių komunikacijų altitudes suderinti (patikslinti) su jas eksploatuojančiomis organizacijomis.
7. Žemės darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu, prieš tai išsikviečiant šių komunikacijų savininkus. Pažeidus sutvarkyti.
8. Projektinis žaliųjų plotų paviršius sklandžių nuolydžių sujungiamas su esamais gretimais paviršiais.
9. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarką darbų aktus, vykdamas statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo ar kitus kokybę įrodančius dokumentus.
10. Pralaidai turi būti užpilama ne storesniais kaip 15 cm storio nurodytos kokybės (ST 188710638.06:2004) smulkesnių dalelių už tarpa tarp pralaidos bandų grunto sluoksniams, simetriškai iš abiejų pralaidos pusių, sutankinant kiekviena sluoksnį ne mažiau kaip 97 proc. (pagal Proktora).

	LAIKINOS SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖS
	LAIKINI BUITINIŲ IR ĮRANGOS SAUGOJIMO PATALPŲ KONTEINERIAI
	LAIKINI ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIAI
	LAIKINI PRIEŠGAISRINIAI STENDAI
	LAIKINAS BIOTUALETAS
	ĮRANKIŲ SAUGOJIMO KONTEINERIS
	ĮVAŽIAVIMO IR IŠĖJIMO Į STATYBVIETĘ VARTAI

-  GALIMAS PRIVAŽIAVIMAS PRIE UPĖS VAGOS
-  UPĖS PAKRANTĖS APSAUGOS ZONA. 10 M
-  STATYBINĖS TECHNIKOS JUDEJIMO KELIAI Į/IŠ
STATYBOS AIKŠTELĖS

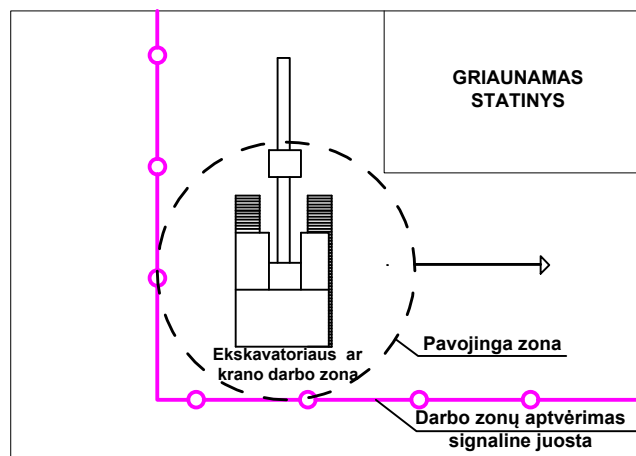

0	2024	Statybos leidimui gauti / statybos darbas vykdyti						
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVALIF. PATVR. DOK. NR.			Jono Dailidės g. 10, LT-68307 Marijampolė (8~343)52201		K.DONELAIČIO G. VK8009 (UNIKALUS NR. 4400-4423-3478), VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANČIŲ PRALAIŲ, PROJEKTAS			
1916	PV	A. Jurdonas		2024	Statinio pavadinimas ir numeris. Brėžinio pavadinimas: 01 - K. DONELAIČIO G.		M1:500	Laida
	PV asistentė	D. Rudaitė		2024	(GATVĖS PRIKLAUSINYS - TILTAS)			0
					PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO PLANAS			
LT	Statytojas: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ				Brėžinio žymuo: 2407-00-TDP-SO-B.01		Lapas	Lapų
							1	1
