

Projekto pavadinimas **VOKIEČIŲ GATVĖS, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS
PROJEKTAS**

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Statinio adresas/ vietovės pavadinimas VOKIEČIŲ GATVĖ, VILNIUS

Statybos rūšis REKONSTRAVIMAS, NAUJA STATYBA

Naudojimo paskirtis (esama/būsima) GATVĖ (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 1.1)

Kategorija NEYPATINGAS STATINYS

Projekto numeris AIMM22_01-1-TDP

Projekto etapas TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (TDP)

Projekto dalis **Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas
(SO)**

Bylos žymuo AIMM21_01-1-TDP-SO

Laida LAIDA 0

Metai 2023

UAB "Atodangos"	PV	R. Zilinskas	A1014, 0817
-----------------	----	--------------	-------------

MB "IMM architektai"	Direktorius Architektas Architektas	I. Račkauskas M. Glodenis M. Kauzonas	A2086
----------------------	---	---	-------

UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“	Direktorius	A.Bikulčius	27535
---	-------------	-------------	-------

MB „Promesa“	PDV	G.Barysas	29978
--------------	-----	-----------	-------

DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS – TURINYS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Puslapiai
1.	AIMM21_01-1-TDP-SO	Titulinis lapas	1
2.	AIMM21_01-1-TDP-SO-DZ	Dokumentų žiniaraštis - turinys	2
3.	AIMM21_01-1-TDP-SO-AR	Aiškinamasis raštas	3-14
4.	Brėžiniai		
4.1	AIMM21_01-1-TDP-SO-B.01	Statybvietės planas (I etapas)	15
4.2	AIMM21_01-1-TDP-SO-B.02	Statybvietės planas (II etapas)	16
4.3	AIMM21_01-1-TDP-SO-B.03	Statybvietės planas (III etapas)	17
4.4	AIMM21_01-1-TDP-SO-B.04	Statybvietės planas (IV etapas)	18
4.5	AIMM21_01-1-TDP-SO-B.05	Statybvietės planas (V etapas)	19
4.6	AIMM21_01-1-TDP-SO-B.06	Statybvietės eismo planas (I etapas)	20
4.7	AIMM21_01-1-TDP-SO-B.07	Statybvietės eismo planas (II etapas)	21
4.8	AIMM21_01-1-TDP-SO-B.08	Statybvietės eismo planas (III etapas)	22
4.9	AIMM21_01-1-TDP-SO-B.09	Statybvietės eismo planas (IV etapas)	23
4.10	AIMM21_01-1-TDP-SO-B.10	Statybvietės eismo planas (V etapas)	24
5.	Priedai		
5.1	29978	Kvalifikacijos atestatas	25

UAB „ATODANGOS“ Į.k.21591590 Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius www.atodangos.lt					VOKIEČIŲ GATVĖS, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS						
Atest. Nr.	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data							
A1014,0817	PV	R.Zilinskas		2023							
MB “IMM architektai” Į.k. 305596023 Šv. Stepono g. 32-13 LT-01312 Vilnius info@aimm.lt					Dokumentų žiniaraštis						
A2086	Arch	I. Račkauskas	Parašas	Data							
	Arch	M. Glodenis		2023							
	Arch	M. Kauzonas		2023							
UAB “STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS” Į.k.302593207 Varnės g. 49 Vilnius, LT- 06248 info@konsultantubiuras.lt					Laida						
27535	Parašas	A.Bikulčius	Data								
www.sdo.lt statybos darbų organizavimas MB Promesa Į.k. 304983138 Tel.: 8- (612)-62286, el. paštas: projektai@sdo.lt											
29978	PDV	G. Barysas	Data								
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė				AIMM21_01-1-TDP-SO-DŽ				Lapas	Lapų	
									2	20	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. ĮVADAS

Objekto pavadinimas.	VOKIEČIŲ GATVĖS, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS
Statytojas (užsakovas).	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Statybos rūšis.	Rekonstravimas
Statinio kategorija.	Neypatingasis statinys

Projekto rengimo pagrindas:

- statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis);
- topografinis planas M 1:500;
- suvestinis inžinerinių tinklų planas;
- kitos projekto dalys.


1.1 TRUMPA STATYBOS KLIMATO SĄLYGŲ CHARAKTERISTIKA

Klimatinės sąlygos:

- vidutinė metinė oro temperatūra: +6,7 °C;
- absoliutus oro temperatūros maksimumas: +35,4 °C;
- absoliutus oro temperatūros minimumas: -37,2 °C;
- santykinis oro metinis drėgnumas: 80 %;
- vidutinis kritulių kiekis per metus: 664 mm;
- Sniego apkrovos rajonas II.
- Sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė $sk=1,6 \text{ kN/m}^2$

ATO DAN GOS UAB „ATODANGOS“ Į.k.21591590 Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius www.atodangos.lt					VOKIEČIŲ GATVĖS, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS				
Atest. Nr.	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data					
A1014,0817	PV	R.Zilinskas		2023					
aimm MB “IMM architektai” Į.k. 305596023 Šv. Stepono g. 32-13 LT-01312 Vilnius info@aimm.lt					Aiškinamasis raštas Laida 0				
A2086	Arch	I. Račkauskas		2023					
	Arch	M. Glodenis		2023					
	Arch	M. Kauzonas		2023					
STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS UAB “STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS” į.k.302593207 Varnės g. 49 Vilnius, LT- 06248 info@konsultantubiuras.lt									
27535		A.Bikulčius		2023					
www.sdo.lt statybos darbų organizavimas MB Promesa į.k. 304983138 Tel.: 8- (612)-62286, el. paštas: projektai@sdo.lt									
29978	PDV	G. Barysas		2023					
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė				AIMM21_01-1-TDP-SO-AR		Lapas	Lapų	
							3	20	

- Vėjo greičio rajonas I
- Vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė $v_{ref,0}=24$ m/s. Pagal vėjų rožę matyti vyraujantys vėjai ir vidutinis vėjo greitis statybos darbų vykdymo vietoje.

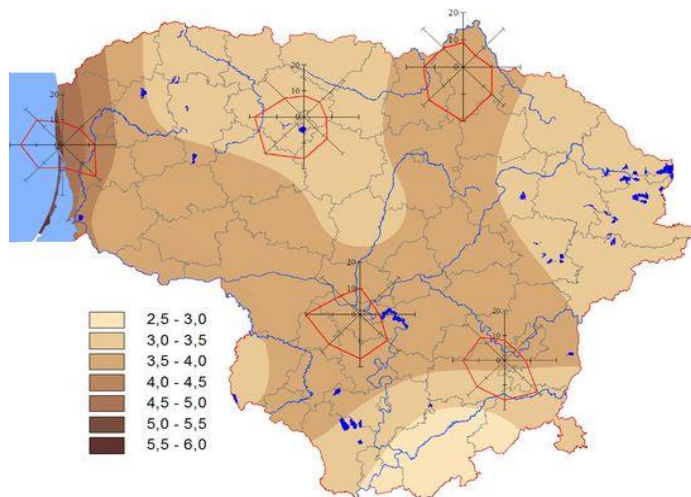

2. STATYBOS DARBŲ POBŪDIS

Statybos darbus sudaro susisiekimo komunikacijų įrengimas bei inž. tinklų klojimas keturiais etapais.

2.1 GEOLOGINĖS BEI HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Geologines bei hidrogeologines sąlygas žiūrėti Geologinių tyrimų ataskaitoje.

2.2 GRUNTINIO VANDENS PAŽĖMINIMO BŪTINUMAS

Įvertinus esamą gruntinių vandenų lygį bei statybos darbų pobūdį, galimas poreikis žeminti gruntinių vandenų lygį adatiniais filtrais bei siurblių pagalba.

2.3 TARNYBŲ ATSTOVŲ DALYVAVIMO BŪTINUMAS DARBŲ METU

Vykdam statybos darbus juos būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais.

2.4 MEDŽIŲ, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO SĄLYGOS

Medžiai, augantys arti statybos zonos iki darbų pradžios turi būti aptverti mediniais skydais arba lentomis. Aptvaras turi būti 1,8 - 2,0 m aukščio trikampis, jo kraštinės ne arčiau kaip 0,5m nuo medžio kamieno, o kampuose įkalti kuolai. Medžių ir krūmų grupės bei jų eilės aptveriamos ištisiniu apvadu 1-1,5m nuo medžių kamieno.

Dirvožemis saugomas statybos aikštelėje, vėliau jį panaudojant statybos aikštelės poreikiams, susidaręs dirvožemio perteklius pakraunamas į savivarčius bei išvežamas iš statybos aikštelės.

3. STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS. STATYBOS SKIRSTYMAS ETAPAIS, DARBŲ SEZONIŠKUMO ĮTAKA

3.1 STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR EILIŠKUMAS

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytą tvarką gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui privalomuosius dokumentus statybos darbams pradėti, t.y. Statytojas privalo perduoti statybos aikštelės teritoriją Rangovui, pasirašant aktą - leidimą ir atitinkamai tai įforminant (brėžinys, teritorijos ir atsakomybės ribos).

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

- Prieš pradėdant darbus reikalinga nustatyti ir patikrinti žemėje esančių komunikacijų būklę ir kad jos būtų tinkamos apsaugotos ir aiškiai pažymėtos;
- Negalima pradėti statybinių įrengimo darbų, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemonių planas;
- Įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui) (jei šie dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis);
- Iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus.

Statyba pradedama nuo aikštelės paruošimo - parengimo statybai :

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AIMM21_01-1-TDP-SO-AR	4	20	0

- statybos aikštelės teritorijos aptvėrimas 2 m aukščio laikina. Tvorose įrengiami vartai 3,5m pločio ir 0,7m pločio varteliai.
- laikinų buitinių patalpų vagonėlių pastatymas statybos aikštelėje ir prijungimas laikina elektros linija;
- laikinos rūkymo vietos įrengimas;
- laikinų kilnojamų tualetų pastatymas netoli laikinų buitinių patalpų vagonėlių;
- priešgaisrinio stendo tvirtinimas prie laikino buitinių patalpų vagonėlio išorinės sienos;
- laikino žemos įtampos kabelio virš žemės pravedimas ir laikinos ž/į pasijungimo dėžės pastatymas.
- laikino statybinių atliekų konteinerio pastatymas.
- laikino informacinio stendo apie statomą objektą statybos laikotarpiu įrengimas.

Po statybos aikštelės paruošiamųjų darbų, pradedami pagrindiniai statybos darbai.

Sklype esantys tinklai turi būti apsaugomi:

- nesandėliuoti statybinių medžiagų ir konstrukcijų, nekaupiti grunto ant esamų inžinerinių tinklų šulinių;
- vykdant statybos darbus, turi būti išsaugoti magistraliniai elektros tinklai, jie negali būti atjungti;

3.2 VYKDYMO YPATUMAI

Statyba apima aukščiau išvardintus statybos - montavimo darbus. Statybos darbų vykdymas atliekamas įprastais metodais, kurie neaprašinėjami. Atkreipiamas dėmesys tik į vykdymo darbų ypatumus :

- darbų eiliškumas sprendžiamas užsakovo ir rangovo susitarimu;
- rangovui teks derinti su užsakovu ir kokias komunikacijas galima praveisti anksčiau, o kokias vėliau;
- statybos eigoje statybos zona aptveriamą įspėjamąja juosta "STOP";
- pastatyti įspėjamuosius ženklus "PAVOJINGA ZONA";
- prie duobių, pavojingų įgilinimų, įvairių peraukštėjimų (perdangos, laiptai) ir pan. privaloma įrengti laikinus ir saugius atitvėrimus su įspėjamąja juosta "STOP";
- atitvėrimų zonos statybų eigoje keičiamos ir koreguojamos pagal situaciją;
- statybos objekte dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui privalo būti paskirtas statybos darbų koordinatorius;
- vandentiekio, lietaus ir nuotekų tinklai klojami su nuolydžiu, grioviai iškasami ekskavatoriumi;
- po statybos darbų visos statybos laikotarpiu sugadintos dangos atstatomos.

3.3 STATYBOS TRUKMĖS NUSTATYMAS

Statybos trukmė nustatoma remiantis vidutiniu metiniu vieno darbininko išdirbiu, priimtu darbininkų sk., statybos - montavimo darbų apimtimi ir turi būti suderinta su Užsakovu. Statyba vykdoma viena pamaina ir skirstoma keturiais etapais.

EIL.NR.	PAVADINIMAS	MATO VNT	VISO
1	Statybos trukmė	mėn.	10

Kadangi nėra aiškus būsimo Rangovo pajėgumai todėl konkretų statybos darbų atlikimo grafiką, technologiją bei eiliškumą privaloma spręsti Rangovo statybos darbų technologijos projekte.

3.3.1 Reikalavimai galimam statinio konservavimui

Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių statybos sustabdymo trukmė). Statinio konservavimo darbai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo statybos sustabdymo. Statytojas atlieka statinio konservavimo darbų techninę priežiūrą vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu. Statytojas atsako už užkonservuoto statinio priežiūrą iki jo statybos atnaujinimo. Statytojas, neužtikrinęs statinio konservavimo darbų atlikimo atsako už nelaimingus atsitikimus statybvietėje, aplinkos taršą iš statybvietės, taip pat už avarijas ir statinio konstrukcijų deformacijas sustabdžius statybą.

3.4 STATYBOS LAIKINI PASTATAI

Statybinių buitinių poreikių tenkinimui (persirengimui, pavalgymui) statomi laikini lengvai iš vienos vietos į kitą pervežami vagonėliai išmatavimų plane (3x6) m. Vagonėliai pastatomi laisvoje vietoje. Vienne laikiname vagonėlyje sandėliuojami darbo įrankiai ir smulkesnės montavimo bei statybinės medžiagos. Į laikinų pastatų zoną atvedama laikina orinė apšvietimo linija. Prie laikinų buitinių patalpų vagonėlių įrengiama pastogė rūkymui ir pritvirtinamas priešgaisrinis stendas. Statybinių poreikiams pastatomas kilnojamas tualetas greta laikinų vagonėlių.

Laikinų buitinių patalpų pareikalavimas skaičiuojamas pagal formulę : $\Sigma S_{ip} = S_H \times N$, kur: S_H - normatyvinis patalpos plotas, N - maksimalus darbininkų skaičius pamainoje.

Vienam darbininkui skiriama:

- S_R - drabužinių, rūbinių - 1,13 m² ,
- $S_{DŽ}$ - drabužių ir avalynės džiovyklų - 0,20 m² ,
- S_{PV} - poilsio ir valgymo patalpų - 1,00 m² ,
- S_s - sušilimo patalpų - 0,10 m² ,

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AIMM21_01-1-TDP-SO-AR	5	20	0

- S_D - dušų - 0,10 m² ,
- S_T - tualetų - 0,08 m² ,
- S_P - prausyklių - 0,26 m² ,

$$S_H = S_R + S_{DŽ} + S_{PV} + S_s + S_D + S_T + S_P = 1,13 \text{ m}^2 + 0,20 \text{ m}^2 + 1,00 \text{ m}^2 + 0,10 \text{ m}^2 + 0,10 \text{ m}^2 + 0,08 \text{ m}^2 + 0,26 \text{ m}^2 = 2,87 \text{ m}^2$$

Pagal Rangovo priimtą maksimalų darbininkų skaičių pamainoje lengvai apskaičiuojamas reikalingas buitinių patalpų plotas.

Darbų vadovo patalpos plotas apskaičiuojamas priklausomai nuo vadovaujančio personalo skaičiaus. Vienam personalo asmeniui (vykdytojui ar meistriui) skiriama 5,00 m². Darbų vadovo patalpa gali būti įrengta bendrame vagonėlyje arba jai pastatytas atskiras vagonėlis.

Viename iš darbininkų poilsui - apšilimui skirtame laikinų buitinių patalpų vagonėlyje matomoje vietoje padedamas greitosios pagalbos vaistinė, kad greitai būtų galima suteikti pagalbą susižeidus.

Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus ir darbo pobūdžio, nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių, taip pat aprašymas, kas yra rinkinyje ir kaip teikti pirmąją pagalbą. Stambių statybos darbus atliekančių įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše.

3.5 BŪTINOS PIRMOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS PRIEMONĖS

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas	Kiekis	Paskirtis
1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm	2 vnt.	
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm	8 vnt.	
3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m	1 vnt.	Tvarsčiui pritvirtinti
4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm	10 vnt.	
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis*	1 vnt.	Pažeistai viršutinei galūnei parišti
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m	3 vnt.	
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m	3 vnt.	
8. Pirmosios pagalbos žirkklės	1 vnt.	
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės*	20 vnt.	
10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm	2 vnt.	
11. Sterilus akių tvarstis*	2 vnt.	
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm	1 vnt.	
13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm	1 vnt.	
14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm	6 vnt.	
15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm	1 vnt.	Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti
16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m	1 vnt.	
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm	3 vnt.	
18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės*	4 vnt.	
19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė	1 vnt.	
20. Rinkinio aprašas*	1 vnt.	Tvirtinamas ant dėžutės/ spintelės durelių/ dangtelio vidinės pusės

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą;

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais;

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

3.6 PAVOJINGOS VIETOS STATYBVIETĖJE

- Pravažiavimo keliai.
- Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos.
- Laikinos elektros linijos ir įrenginiai.
- Vykstant žemės darbams — veikiantys požeminiai elektros kabeliai.
- Montuojant sunkius įrenginius ir konstrukcijas - montavimo (demonravimo) darbų zonos.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AIMM21_01-1-TDP-SO-AR	6	20	0

4. STATYBOS GEODEZINĖ KONTROLĖ

Statybos metu statybinė organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti statybos montavimo darbų geodezinę kontrolę, kurią sudaro:

1. Geodezinis (instrumentinis) statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties plane ir pagal aukštį tikrinimas jų montavimo metu.
2. Geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinė padėtis plane ir pagal aukštį atlikus jų montavimą. Geodezinė (instrumentinė) kontrolė vykdoma visoms požeminėms ir antžeminėms konstrukcijoms. Faktinė konstrukcijų padėtis plane ir pagal aukštį jų vertikalumas, horizontalumas arba duotas nukrypimo kampas, plokštumų sutapimas statybinės organizacijos turi būti kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Statybos darbų kontrolės metu turi būti tikrinamos medžiagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos – montavimo darbuose. Darbų vykdytojas arba meistras turi vizualiai patikrinti konstrukcijas, bei medžiagas, atvežtas į statybos aikštelę, pagal darbo brėžinius, technines sąlygas bei standartus.

4.1 GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR IŠKELIAMI INŽINERINIAI TINKLAI

Esamų statinių griovimas nenumatomas. Statybvietės ribose naikinama dalis esamų inžinerinių tinklų vadovaujantis inžinerinių projekto dalių sprendiniais. Prieš pradėdant dalies esamų tinklų iškėlimo darbus, turi būti užtikrinta likusių inžinerinių tinklų pilnas funkcionavimas.

4.2 SUSIDARYSIANČIŲ ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ ORIENTACINIS KIEKIS. JŲ TVARKYMO BŪDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIEČE SĄLYGOS

Technologinis procesas	Atliekos						Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	pavadinimas	kiekis, t.	agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Kodas pagal atliekų sąrašą	statistinės klasifikacijos kodas	pavojingumas	Laikymo sąlygos	Didžiausias kiekis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Statybinės atliekos	Maišytos statybos ir griovimo atliekos	100	K	17 09 04	12.13	N	Statybos aikštelėje	25	Per šalinimo darbus galinčią vykdyti atestuotą, įregistruotą atliekų tvarkytoją
	Medis	2	K	17 02 01	07.53	N	Statybos aikštelėje	2	Perdirbimas antriniam panaudojimui (energijos gavybai)
	Betonas, gelžbetonis, plytos	900	K	17 01 01	12.11	N	Statybos aikštelėje	100	Perdirbimas statybos aikštelėje į antrinius statybos produktus
	Metalas	0,5	K	17 04 05	06.11	N	Statybos aikštelėje	0,5	Pridavimas perdirbimui

Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje turi būti vykdoma Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis GPAIS, pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą (Atliekų susidarymo apskaitos ir atskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos 2018-12-16). Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant atliekų vežimo lydraštį. Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą.

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidaranti perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pavojingos statybinės atliekos turi būti pažymėtos spec. joms skirtu ženkliniu, skysto agregatinio būvio atliekos privalo būti laikomos uždaroje talpyklose/cisternose, kieto agregatinio būvio atliekos – uždaruose konteineriuose, birios atvirai sandėliuojamos atliekos – ant nepralaidžios dangos.

Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu bus tikslinami. Atliekų išvežimo sutartys Rangovo sąskaita privalo būti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis įmonėmis, turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidaranti atliekos:

1. komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
2. inertinės atliekos – betonai, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AIMM21_01-1-TDP-SO-AR	7	20	0

4. pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, esdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

4.3 GAMYBINĖS, ŪKINĖS AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

Vykdamas statybos darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų.

Pagal STR 1.04.04:2017 reikia siekti mechanizmų ir įrankių triukšmo ir kitų neigiamų poveikių (vibracijos) apribojimo, kad sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams.

Numatoma, kad vykdamas statybos darbus triukšmo lygis padidės, tačiau reikšmingo poveikio aplinkai nedarys, nes triukšmas padidės tik vykdomų darbų zonoje ir tik laikinai. Statybos metu galimas statybinio transporto ar statybos mechanizmų keliamas triukšmas, tačiau, neturėtų viršyti Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, t.y. 55-65 dB(A). Darbus planuojama vykdyti dienos metu, darbo valandomis, keliamas triukšmas neviršys leistinų ribų, todėl vykdomų darbų metu padidėjęs triukšmo lygis neigiamo poveikio gyvenamosioms teritorijoms ir gamtinei aplinkai neturės.

4.4 AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO RIBOJIMO AR UŽDARYMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją. Prieš darbų pradžią rangovas rengdamas technologinį statybos darbų vykdymo projektą parengia ir suderina laikiną eismo organizavimo organizavimo projektą ir susiderinasi miesto Eismo organizavimo skyriumi ir VPK kelių policijos valdyba.

Atliekant darbus gatvės važiuojamoji dalis gali būti laikinai uždaryta, apribota ženklais, susiaurėjusi ar dalinai ribojanti autotransporto srautą ir eismą vadovaujantis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“ tipine eismo schema „TES K I/3 Eismo organizavimas, naudojant laikinas eismo juostas“:

4.5 PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTiesti GALIMYBĖS IR SĄLYGOS

Naudoti papildomus sklypus statybos metu nenumatoma.

5. APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIŠ RESURSAIS, TERITORIJOS APŠVIETIMO, NUOTEKŲ ŠALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU

5.1 ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS

Kad aprūpinti statybą elektros energija, reikalinga pasijungti prie esamos elektros skydinės prieš tai susiderinus ir gavus tinklų savininkų sutikimus bei įrengiant laikinus apskaitos mazgus arba pastatyti laikiną mobilių dyzelinį generatorių.

5.2 VANDENS POREIKIS

Vanduo statybos laikotarpiu gali būti pasijungiamas nuo esamų tinklų prieš tai susiderinus ir gavus tinklų savininkų sutikimus bei įrengiant laikinus apskaitos mazgus.

Darbuotojų brigados aprūpinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodeliais.

Priešgaisrinėms reikmėms vanduo tiekiamas iš artimiausio hidranto.

5.3 NUOTEKOS

Laikinų buitinių patalpų aikštelėje pastatomas biotualetas.

6. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS – ORIENTACINIS MECHANIZMŲ SĄRAŠAS

Statybos įranga ir transporto priemonės turi būti tvarkingos, veikiančios, turi turėti techninius pasus. Transporto priemonės turi būti užregistruotos ir turėti techninės apžiūros galiojančius dokumentus. Darbus su statybos įranga ir transporto priemonėmis gali vykdyti instruktuoti asmenys, turintys atitinkamą kvalifikaciją. Visa elektros įranga turi būti įžeminta. Dirbti mašinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis mašinisto (traktorininko, vairuotojo) pažymėjimą, leidžiantį dirbti su to tipo mechanizmu, pasitikrinęs sveikatą, apmokytas ir instruktutas. Darbai su statybos įranga ir transporto priemonėmis vadovauja darbų vadovas.

Būtina laikytis šių nurodymų:

- prieš pradėdamas darbą, mašinistas (vairuotojas) turi duoti signalą,

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AIMM21_01-1-TDP-SO-AR	8	20	0

- atstumas tarp dirbančių mechanizmų (transporto) turi būti ne mažesnis kaip 5 m;
- atstumas taip prasilenkiančių mechanizmų (transporto)– ne mažesnis kaip 1 m;
- baigus darbą, apžiūrėta ir nuvalyta technika pastatoma specialiai tam skirtose vietose; "Stop" signalas privalomas visiems, jį gali duoti bet kuris darbuotojas, pastebėjęs kliūtį, gedimą ar galimą avariją;
- maksimalus greitis neturi būti didesnis už techniniuose pasuose gamintojo nurodytą greitį arba teritorijoje numatytą ir kelio ženklais reglamentuotą greitį;
- savivarčio automobilio vairuotojas privažiuoja, tik gavęs paskirto darbuotojo signalą;
- važiuodamas atbuline eiga, vairuotojas turi įsitikinti, kad tarp savivarčio ir numatomos iškrovimo vietos nėra žmonių ir duoti signalą;
- važiuoti atbuline eiga savivarčiu automobiliu su kroviniu galima, tik gavus darbų vadovo signalą;
- judant savivarčiui, darbininkams draudžiama būti mašinos kėbule;
- prieš pradedant važiuoti, būtina garsiniu signalu įspėti aptarnaujančius darbininkus;
- savivarčio bortus galima atidarinėti, tik jam sustojus ir darbininkams pasitraukus į nepavojingą zoną. Užpakalinis savivarčio bortas atidaromas specialiais kabliais;
- draudžiama pasilipti ant savivarčio kėbulo, jį valant;
- keliant krovinius (statybinių vagonėlių ant tralo ar pan.), krano kabliai kabinami specialiose vietose, nurodytose eksploatavimo instrukcijoje. Reguluoti keliamo daikto judėjimą galima virvių pagalba, draudžiama tai daryti rankomis;
- keliant krovinį, draudžiama stovėti tarp krano ir keliamo krovinio.
- visi mechanizmai darbo metu turi būti su įjungtais oranžinės spalvos mirksinčiais švyturėliais;
- veikiančių mechanizmų darbo zonoje draudžiama būti pašaliniais asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su mechanizmų darbu;
- elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje galima dirbti, tik turint paskyrą- leidimą;
- darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonės ir įtaisai (apsauginiai vožtuvai, avariniai jungikliai ir kt.). Visos judančios mašinos dalys turi būti uždengtos apsauginiais gaubtais;
- draudžiama remontuoti esant įjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slėgiui jungiamosiose žarnose.
- dirbant statybos mašinomis draudžiama įlipti ir išlipti iš mašinos jos eigos metu; dirbti esant atdaroms kabinos durelėms; dirbti su išjungtu švyturėliu; dirbti krovinių kėlimo įrenginių veikimo zonoje; kabinoje vežti žmones; stovėti ant judančios mašinos laiptelio;
- palikti veikiančią mašiną be priežiūros; palikti neveikiančią mašiną nuokalnėje.

6.1 STATYBOS PAGRINDINIAI MECHANIZMAI

Pavadinimas
Buldozeris
Ekskavatorius su 0,5 m ³ talpos kaušu
Ekskavatorius su 0,25 m ³ talpos kaušu
Autogreideris
Plentvolė Q =10,0 t
Plentvolė Q =5,0 t
Autokranas Q _{max} =10,0 t
Autosavivarčiai Q _{max} =12,0 t
Rankiniai plūktuvai
Vibrotankintuvas
Asfaltbetonio klotuvas
Elektrinis grąžtas
Diskinis pjoviklis
Kilnojama elektros stotis

Pastaba: mechanizmai ir mašinos tikslinami pagal rangovo turimą jų parką.

7. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS

- Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AIMM21_01-1-TDP-SO-AR	9	20	0

- Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.
- Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.
- Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime.
- Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą.
- Paskyra - leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti.
- Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.
- Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų,
- Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) projektą. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai.
- Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse.
- Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus.

7.1 DARBUOTOJŲ APSAUGA KASANT TRANŠĖJAS IR PAMATŲ DUOBES RANKINIŲ BŪDU

Prieš pradėdant žemės darbus, požeminių komunikacijų vietos turi būti paženklintos. Pamatų duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, o ant aptvarų pakabinti įspėjamieji užrašai ir ženklai.

Atkasti esamus elektros kabelius, dujotiekio linijas, šilumos tinklus leidžiama tik kastuvais, atsargiai juos įsmeigiant. Ant esamų tinklų linijų negali būti sandėliavimo zonų.

Natūralaus drėgnumo grunte, kai nėra gruntinio vandens ir arti nėra požeminių įrenginių, pamatų duobės ir tranšėjas su vertikaliomis sienelėmis be sutvirtinimų galima kasti ne gilesnes kaip:

- 1 m - supiltame smėlio ir žvirgždo grunte;
- 1,25 m - priesmėlio grunte;
- 1,5 m - priemolio ir molio grunte.

Lipti į tranšėjas ar pamatų duobes leidžiama ne siauresniais kaip 0,6 m lipynėmis su turėklais. Kasti gruntą pasikasant draudžiama. Iš pamatų duobės ar tranšėjos išmestą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,5 m nuo jos krašto.

Naudoti tik išbandytus ramstomus skydus. Nustatyti apkrovą, pvz. grunto slėgio, pamatų. Naudojant ramsčius būtina laikytis gamintojo instrukcijos. Sujungiamos ramsčių dalys jungiamos jungėmis. Ramstomieji skydai turi išsikišti virš grunto ne mažiau kaip 10 cm. Atstumas tarp ramstomojo skydo krašto ir iškasto grunto - ne mažesnis kaip 60 cm. Kasant didesnį kaip 0,8 m pločio tranšėjas, būtina įrengti perėjimų tiltelius, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

Jei kasamų tranšėjų gylis viršija 1,3 m perėjimo tilteliai iš abiejų šonų turi turėti turėklus. Kasti negalima šlapio smėlio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iškasos sienelių.

7.2 DARBUOTOJŲ APSAUGA KASANT TRANŠĖJAS IR PAMATŲ DUOBES ESKAVATORIAIS

Mažiausias ekskavatoriaus judančių dalių atstumas iki statybvietėje esančių objektų - 0,5 m. Draudžiama būti žmonėms ekskavatoriaus strėlės veikimo spindulio zonoje plius 5 m. Darbo pertraukos metu ekskavatorių reikia atitraukti nuo tranšėjos krašto ne mažesniu kaip 2 m atstumu, kaušą nuleidus ant žemės. Iš pamatų duobės ar tranšėjos iškastą gruntą laikyti ne arčiau kaip 0,5 m atstumu nuo krašto. Perkraunant gruntą į automobilius, perkelti ekskavatoriaus kaušą virš automobilio kabinos draudžiama:

- Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo ir grunto supylimo vietos turi būti apšviečiamos.
- Kasti gruntą ekskavatoriumi arčiau kaip 50 cm iki požeminių komunikacijų draudžiama.
- Kasant elektros kabelių trasose negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5m iki kabelio.

7.3 STATYBVIEČIŲ DARBO VIETŲ ĮRENGIMAS:

7.3.1 Stabilumas ir tvirtumas

- kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar gilyje jos įrengtos, turi būti tvirtos ir stabilios; be to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į darbuotojų skaičių, galimą didžiausią apkrovą ir jos

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AIMM21_01-1-TDP-SO-AR	10	20	0

pasiskirstymą, galimus išorinius poveikius. Jei atraminės ir kitos šių darbo vietų dalys yra nestabilios, jų stabilumas turi būti užtikrinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo įrenginiais, kad būtų išvengta atsitiktinės arba savaiminės visos darbo vietos arba jos dalies slinkties;

- darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi būti reikiamai patikrintas, ypač pakeitus jos aukštį arba gylį.

7.3.2 Elektros įrenginiai ir jų instaliacija:

- elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje, ypač jei jie veikiami aplinkos veiksnių, turi būti reguliariai prižiūrimi ir tikrinami;
- privalu patikslinti, patikrinti ir aiškiai pažymėti įrenginius, buvusius statybvietėje prieš ją įrengiant;
- elektros oro linijos pagal galimybes turi būti iškeltos už statybvietės ribų; jeigu elektros oro linijos negalima iškelti, tai elektros srovė turi būti išjungta. Jei to negalima padaryti, oro liniją reikia atitverti ar pažymėti ženklų, kad į šią teritoriją nepatektų transporto priemonės ir įrenginiai. Jeigu statybvietėje transporto priemonėms reikia važiuoti po oro liniją, turi būti įrengti įspėjamieji ženklai ir kabantieji aptvarai.

7.3.3 Atmosferos poveikis:

- darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atmosferos veiksnių, kenkiančių jų saugai ir sveikatai.

7.4 HIGIENOS SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE

Laikinoje buitinėse patalpose turi būti: drabužinė, drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos, apšilimo patalpa, prausykla, dušas, poilsio ir valgio patalpa, tualetas.

Darbuotojų brigados aprūpinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodeliais. Laikinių buitinių patalpų aikštelėje pastatomas biotualetas, įrengiamas priešgaisrinis stendas su visa reikiama įranga.

8. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI

8.1 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos metu stengiamasi kaip galima mažiau teršti orą, dirbama mechanizuotai sureguliuotais varikliais, ties įvažiavimu į statybos aikštelę numatomas ratų plovimo punktas, kad statybos darbuose dalyvaujantis autotransportas ir kita mobili technika neterštų šalia statybvietės esamų gatvių dangų. Statybinių atliekų surinkimui statomi laikini konteineriai (po 10m³ talpos).

Vykdamas statybos darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“.

Statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždaroje talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

8.2 TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI

Statiniai turi būti statomi ir pastatyti, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant statinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:

- 1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- 2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
- 3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- 4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
- 5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- 6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;
- 7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
- 8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

9. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. Priešgaisrinėms reikmėms vanduo tiekiamas iš esamo vandentiekio. Prie laikino buitinių patalpų vagonėlio įrengiamas priešgaisrinis stendas - skydas su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, kastuvais, kobiniais ir pastatoma dėžė su smėliu. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AIMM21_01-1-TDP-SO-AR	11	20	0

Visi darbuotojai privalo naudoti individualias apsaugos priemones. Darbininkai turi būti supažindinti su saugaus darbo statybos aikštelėje reikalavimais ir normatyvais, o statybos aikštelėje turi būti iškabinti ir aiškiai matyti pagrindiniai saugaus darbo statybos aikštelėje reikalavimai. Darbuotojai turi būti aprūpinti reikalinga įranga darbo saugumui užtikrinti.

Statybos darbų vykdymas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas.

Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietsės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, turi būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei būtina, turi būti įrengti gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai.

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti.

Laikini lengvai degūs pastatai pastatomi prisilaikant normatyvinių dokumentų. Lengvai užsidegančios medžiagos sandėliuojamos specialiai atitvertoje aikštelėje.

Kilus pavojui, darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš visų darbo vietų:

- evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zoną;
- evakavimo kelių ir išėjimų skaičius, išdėstymas ir matmenys parenkami, atsižvelgiant į statybvietsės ir patalpų išplanavimą bei jų matmenis, taip pat didžiausią galimą darbuotojų skaičių ir atitinkamų teisės aktų reikalavimus;
- evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinėti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ (Žin., 1999, Nr. 104-3014).
- evakavimo keliai ir išėjimai, judėjimo keliai bei durys, vedantys į evakavimo kelius ir išėjimus, turį būti be kliuvinių, kad bet kuriuo metu būtų galima nekludomai jais naudotis;

10. NURODYMAI AR SPRENDINIAI GAISRO AR KITOS AVARIJOS STATYBVIETĖJE ATVEJU

Jei statybos metu įvyksta statinio avarija – statybos rangovas (jei įvyksta naudojamo statinio avarija – statinio naudotojas ar valdytojas) privalo nedelsdamas:

- imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių;
- pažymėti pavojingą zoną, kurioje kyla ar gali kilti pavojus žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, organizuoti jos laikiną aptvėrimą ir pasirūpinti, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys;
- evakuoti žmones iš pavojingos zonos;
- organizuoti pavojingos būklės konstrukcijų laikiną sustiprinimą;
- užtikrinti statinio avarijos vietos apsaugą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis;
- pranešti apie avariją (telefonu, oficialiu el. paštu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis) nurodant statinio adresą ir kitus duomenis, leidžiančius greičiau nustatyti avarijos vietą:
 - a) Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
 - b) savivaldybės, kurios teritorijoje įvyko avarija, administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui);
 - c) viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą (naudojamų statinių avarių atvejais);
 - d) jei avarija įvyko statybos metu, – statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma rangos būdu), statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir statinio projektuotojui;
 - e) jei yra nukentėjusių žmonių, – teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai;
 - f) jei įvyko avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyriui;
 - g) jei avarija susijusi su potencialiai pavojingų įrenginių avarija arba jei dėl statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai, – Potencialiai pavojingų įrenginių avarių tyrimo nuostatuose nurodytoms institucijoms;
 - h) elektros, dujų, vandens (nuotekų šalinimo) tiekimo įmonėms informuodamas apie avarijos mastą, kai galimi arba nustatyti dujotiekių ar elektros linijų ar vandentiekio (nuotekų) slėginių vamzdynų pažeidimai.
- aprašyti statinio būklę po avarijos, statinio pakeitimus ir jų atsiradimo vietas (darant schemas bei eskizus, fotografuojant ar kitu būdu).

11. SAUGOS REIKALAVIMAI IR PRIEMONĖS, ATLIEKANT DARBUS VEIKIANČIUOSE PASTATUOSE ARBA GRETA JŲ

Kadangi statybos darbai vykdomi greta veikiančių pastatų rangovas turi paruošti Statybos darbų technologijos projektą, kuriame turi būti numatomos visos taikomos saugos priemonės gretimų pastatų naudotojams. Statybos darbų technologijos projektui ekspertizė nereikalinga nes statybos metu nėra atliekami specifiniai darbai. Turi būti vykdomi trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai ir sudarytas statybos darbų eiliškumo grafikas.

Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų.

Pagal STR 1.04.04:2017 reikia siekti mechanizmų ir įrankių triukšmo ir kitų neigiamų poveikių (vibracijos) apribojimo, kad sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AIMM21_01-1-TDP-SO-AR	12	20	0

12. DARBUOTOJŲ APSAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS

Darbuotojų apsauga statybvietėje apibrėžiama taisyklėmis:

- „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“
- „Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės“

13. SPECIALŪS REIKALAVIMAI NEĮPRASTŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI BEI DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMUI

Prieš statybos darbus turi būti paruoštas "Statybos darbų technologijos projektas" ir vykdomoms atskiroms statybos darbų rūšims turi būti parengtos "Statybos darbų technologinės kortelės", kuriose turi būti statybos darbų technologiniai aprašymai, gaminių stropavimo schemas, mechanizmų ir darbininkų išdėstymas, nurodyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai su nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai.

14. STATINIO STATYBOS TECHINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

14.1 REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS TECHINĖS PRIEŽIŪROS GRUPĖS SUDĖČIAI IR KVALIFIKACIJAI

Atliekant statybos darbus techninę priežiūrą turi atlikti techninis prižiūrėtojas turintis teisę eiti ypatingojo statinio techninės priežiūros vadovo pareigas susisiekti komunikacijoms, kitiems inžineriniams statiniams bei numatytiems inžinieriams tinklams bei specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

14.2 STATINIO STATYBOS TECHINĖS PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS IR DARBO APIMTIS

Statybos darbai šiame objekte bus vykdomi nepertraukiamai kiekvieną dieną, statybos techninė priežiūra turi būti vykdoma ne rečiau kaip du kartus per savaitę, prieš kiekvieno naujo technologinio proceso pradžią ir nemažiau kaip 1358 darbo valandas pagal STR 1.04.04:2017 18 priedą:

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHINĖ PRIEŽIŪRA:

EIL. NR.	PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS
1.	Projekto nagrinėjimas	111
2.	Kiti inžineriniai statiniai	390
3.	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	96
4.	Geodezinės nuotraukos tikrinimas	12
5.	Užbaigimo komisija	24

KELIŲ IR GATVIŲ STATYBOS TECHINĖ PRIEŽIŪRA:

EIL. NR.	PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS
1.	Projekto nagrinėjimas	20
2.	Kelias ar gatvė su vieno sluoksnio asfalto danga	36
3.	Nuovaža	0
4.	Asfaltbetonio danga (kai įrengiama daugiau kaip viensluoksnė danga)	4
5.	Eismo saugumo priemonių įrengimas	6
6.	Viena sankryža	0
7.	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	96
8.	Geodezinės nuotraukos tikrinimas	12
9.	Užbaigimo komisija	24

INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHINĖ PRIEŽIŪRA:

EIL. NR.	PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS
1.	Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro ilgio inžinerinis tinklas)	88
2.	Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio)	196
3.	Inžinerinio tinklo bandymai	40
4.	Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	120
5.	Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio)	59
6.	Užbaigimo komisija	24

DOKUMENTO ŽYMUO

AIMM21_01-1-TDP-SO-AR

LAPAS

13

LAPŲ

20

LAIDA

0

15. SAUGOS IR SVEIKATOS ŽENKLAI

Saugos ir (arba) sveikatos apsaugos ženklai - ženklai, teikiantys informaciją arba nurodymus vaizdiniu ženklu, spalva, šviečiančiu ženklu, garso signalu, žodiniu pranešimu, rankų ženklais apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Pagrindiniai ženklai:

- **draudžiamasis ženklas** - tai ženklas, draudžiantis elgtis taip, kad kiltų pavojus arba jis būtų sukeltas;
- **įspėjamasis ženklas** - ženklas, kuris įspėja apie riziką arba pavojų;
- **įpareigojamasis ženklas** - ženklas, kuris nustato privalomą elgesį;
- **pirmosios pagalbos arba gelbėjimo ženklas** - ženklas, kuriuo nurodomi evakuaciniai išėjimai arba pateikiama informacija apie pirmosios pagalbos arba gelbėjimo priemones;
- **informacinis ženklas** - ženklas, kuris nurodo kitą saugos ir sveikatos apsaugos informaciją negu ženklai aprašyti aukščiau;

Formos ir pavidalai:


- **vaizdinis ženklas** - ženklas, kuris geometrinės formos, spalvos ir piešinio arba piktogramos deriniu teikia tam tikrą informaciją ir kuris įrengiamas matomoje vietoje, pakankamai ryškiai apšviestas. - **papildomas vaizdinis ženklas** - ženklas, teikiantis papildomą informaciją ir naudojamas kartu su vaizdiniu ženklu;
- **saugos spalva** - spalva, kuriai suteikiama atitinkama saugos reikšmė;
- **simbolis arba piktograma** - iliustracija, kuri apibūdina situaciją arba nustato tam tikrą elgesį ir kuri nupiešta ant vaizdinio ženklo arba apšviesto paviršiaus;
- **šviečiantis ženklas** - ženklas, kurio šviesą skleidžiantis įtaisas pagamintas iš permatomos arba šviesą praleidžiančios medžiagos ir apšviestas iš vidaus arba užpakalinės sienelės ir atrodo kaip šviečiantis paviršius;
- **garso signalas** - sutartas garso signalas, skleidžiamas ir perduodamas tam tikslui skirtu įrenginiu, nenaudojant žmogaus balso arba jo imitacijos;
- **žodinis pranešimas** - nustatyto turinio pranešimas žodžiu žmogaus balsu arba žmogaus balso imitacija;
- **rankų ženklas** - nustatyti rankų ir (arba) plaštakų judesiai ir (arba) jų padėtis, duodant nurodymus darbuotojams, kurie atlieka manevravimo veiksmus, susijusius su rizika arba pavojumi.

16. STATYBOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Nuorodos į galiojančius normatyvinius dokumentus :

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatos;
- Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;
- LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka,;
- Kėlimo kranų naudojimo taisyklės;
- Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės;
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai;
- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės;
- Atliekų tvarkymo taisyklės;
- Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės;
- Želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklės;
- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
- Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00;
- Statybinė klimatologija. RSN 156-94;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AIMM21_01-1-TDP-SO-AR	14	20	0

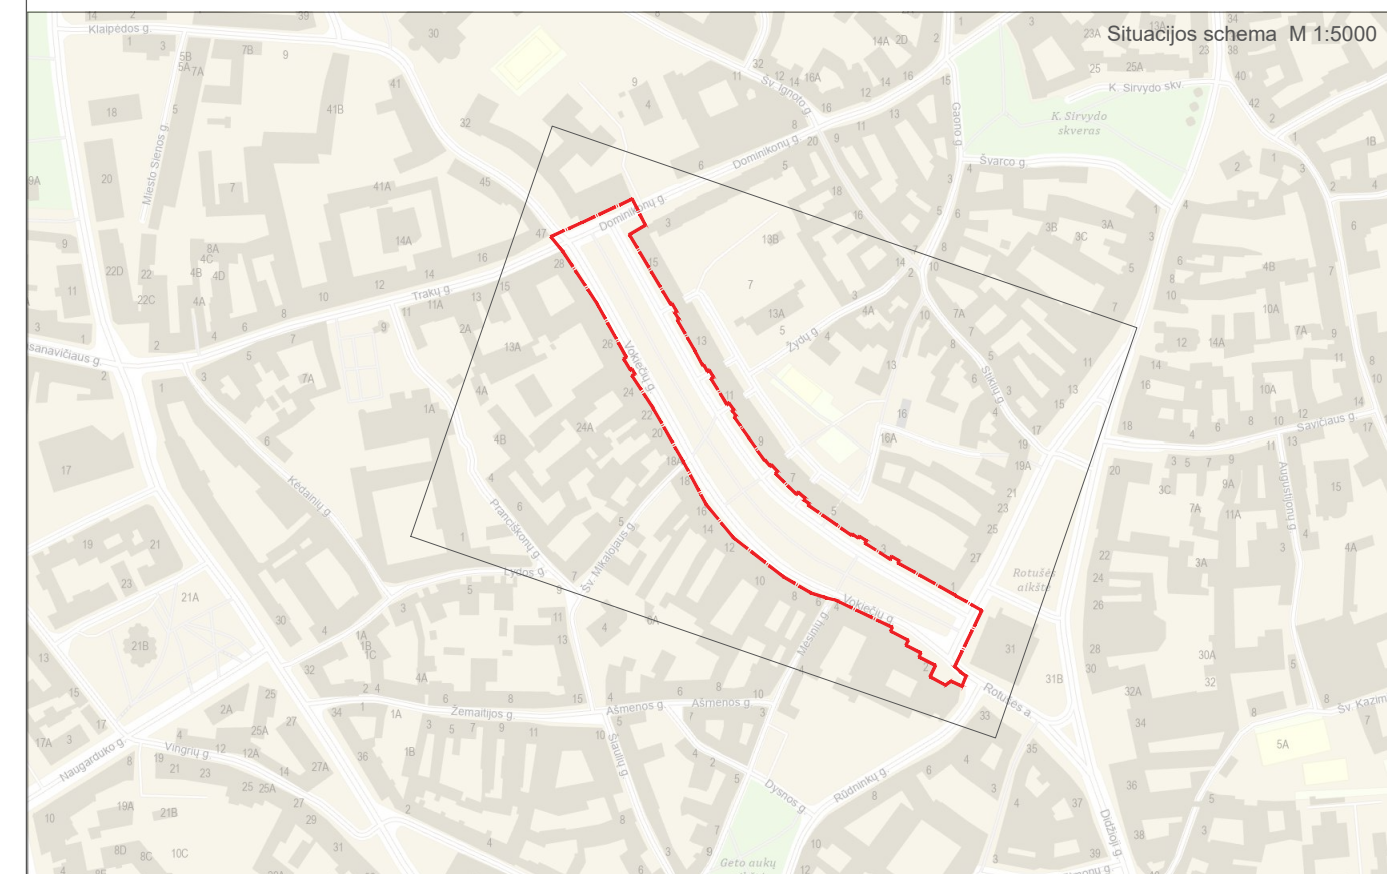

- ## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- | | |
|---|--|
|  | BUITINIO PATALPŲ ĮRANGIMO VIETA |
|  | LAIKINAS ATPAVYRIMAS |
|  | STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS |
|  | GAISRINIS POSTAS |
|  | INFORMACINIS SKYDAS |
|  | SKYDAS SU DRAUDŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS |
|  | RŪKOMO VIETA |
|  | KILNOJAMAS WC |
|  | ĮRANKINIS IR SANDĖLIUKAI |
|  | AUTOMOBILIŲ RATŲ PLOVIMO VIETA |
|  | STATYBINIŲ ATLIKIEKŲ KONTAINERIS |
|  | EISMAS STATYBOS DARBYŲ VIETOJ |
|  | ATVIROS MEDIJGAJOS SANDĖLIAVIMO VIETOS |
- Projekto autorių navedinėjusį nurodymų šalinimo tinkamai

[illegible]


		[k. 22159/190 Marcionis g. 11 LT-01124 Vilnius www.atodangos.lt		Projektavimas	
UAB "ATODANGOS"				VOKIČIŲ GATVĖS, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR KTOS PASKIRTIES INŽINIERIŲ STATINIŲ PROJEKTAS	
Alsekt. Nr. A1014, 0817	Pareigos PV	V. Pavardė R. Zišlanskas	2023 2023		
		[k. 305596023 Šv. Stepono g. 32-13 LT-01312 Vilnius info@aimm.lt		Dokumentų pavadinimas	
A2096	Arch. Arch. Arch.	I. Račkauskas M. Glodenis M. Kauzonas	2023 2023 2023	STATYBVIETIES PLANAS (I Etapas) M 1:500	
		[k. 30253207 Varnės g. 49, LT-06024 Vilnius info@konsultatuburas.lt		Laida	
27535	A. Bikiulius		2023	0	
		MB "Promesa" Tel.: 8 - (012)-62286 El. paštas: projekta@sdo.lt			
29978	PDV/ Statytojas	G. Barysas	2023	Dokumentų žymuo	
LT		Vilniaus miesto savivaldybė		AIMM22_01-1-TDP-SO-B.01	Lapas 1
				Lapų 1	



- PASTABOS:**
1. INF. TINKLAI UŽ STATYBIETĖS RIBOS MAKSIMALIAI KLOJAMI PRASTŲMO BŪDU, IŠKASOS BEI TRANŠĖJOS APTVERIAMOS APSAUGINE TVORA, KAD NEPAVEIKTŲ PAŠALINIŲ ASMENYS.
 2. VISI ASMENYS STATYBIETĖJE PRIVALO DĖVėti ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES.
 3. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS STATYBOS TECHINIAIS REGLAMENTAIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004-02-11 NUTARIMO NR. 155 PATVIRTINTU KELIŲ PRIEŠTAMOS TVAROS APRAŠŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS RISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU, VILNIAUS MIESTO TARYBOS 2004-06-23 SPRENDIMU NR. 1-425, AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKAVIMO TARYBĖS KPT. SGM 07 16 KITAIS SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS, SĄRAUDOTOS GATVIŲ DANGOS IR JU PAGRINDAI TURI BŪTI ĮRENGIAMAI PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ.
 4. ELEKTRA BEI VANDUO STATYBOS LAIKOTARPIŲ PASIJUNGIAMA NUO ESAMŲ TINKLŲ PRIEŠ TAI SUSIDERINUS IR GAVUS TINKLŲ SAVININKŲ SUTIKIMUS IR ĮRENGIAMAI LAIKINOS APSAUGOS RAGUS.
 5. PRIE DUOBŲ, PAVOJINGŲ IGLIENIMŲ, IVARIŲ PERAKUŠTĖJIMŲ (PERDANGOS, LAIPTAI) IR PAN. PRIVALOMA ĮRENGTI LAIKINUS IR SAUGIUS ATITVĖRIMUS SU ĮRENGIAMĄJA UDOSTA "STOP".
 6. STATYBOS OBJEKTE DIRBANT DAUGIAU NEI VIENAI IMONEI STATYBOS DARBUS PRIVALO PRIŽIURėti STATYBOS DARBU KOORDINATORIUS.
 7. PO STATYBOS DARBU VISOS STATYBOS LAIKOTARPIŲ SUGADINTOS DANGOS ATSTATOMOS, TAME TARPE IR DANGOS NE TIK SKLYPO RIBOSE, TAČIAU IR UŽ SKLYPO RIBOS.
 8. ATSIIRAUS PAVOJINGAI ZONAI UŽ STATYBIETĖS APTVĖRIMO, PRIVALO DALYVAUTI REGULIUOTOJAS IR PAŠALINIS ASMENIS NUKREIPTI SAUGIŲ TAO.
 9. STATYBIETĖS PLANĄ ŽIDURTI SYKIU SU SUVESTINIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ IR SPLYPO DANGŲ PLANAIS.

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**
- BUITINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMO VIETA
 - LAIKINAS APTVĖRIMAS
 - ↔ STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS
 - GAISRINIS POSTAS
 - INFORMACINIS SKYDAS
 - SKYDAS SU DRAUDŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS
 - RŪKYMO VIETA
 - KILNOJAMAS WC
 - ĮRANKINĖS IR SANDELIUKAI
 - AUTOMOBILIŲ RATŲ PLOVIMO VIETA
 - STATYBINIŲ ATLIKŲ KONTEINERIS
 - EISMAS STATYBOS DARBŲ METU
 - ATVIROS MEDŽIAGŲ SANDELIAVIMO VIETOS
 - Projektuojami paviršinių nuotekų šalinimo tinklai

 UAB "ATODANGOS" Alkst. Nr. A1014.0817Pareigos PVV. Pavardė R. Zižinskas20232023 aimm MB "IMM architektai" j.k. 305596023 Sv. Stepono g. 32-13 LT-01312 Vilnius info@aimm.lt				Projekto pavadinimas	
A2086 Arch. I. Račkauskas20232023 Arch. M. Glodenis20232023 Arch. M. Kauzonas20232023				VOKIEČIŲ GATVĖS, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS	
 STATYBOS INŽINERIJOS KONSULTANTŲ BIURAS UAB "STATYBOS INŽINERIJOS KONSULTANTŲ BIURAS" j.k. 302593207 Varnės g. 49, LT-06246 Vilnius info@sdo.lt www.sdo.lt statybos darbu organizavimas MB "Promesa" Varnės g. 49, Tel.: 8-(612)-62286, El. paštas: projektai@sdo.lt				Dokumentų pavadinimas	
27535 A. Bikulčius2023				STATYBIETĖS PLANAS (II Etapas) M 1:500	
29978 PDV G. Barysas2023				Dokumentų žymuo	
LT Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė				AIMM22_01-1-TDP-SO-B.02	
				Lapas	Lapų
				1	1

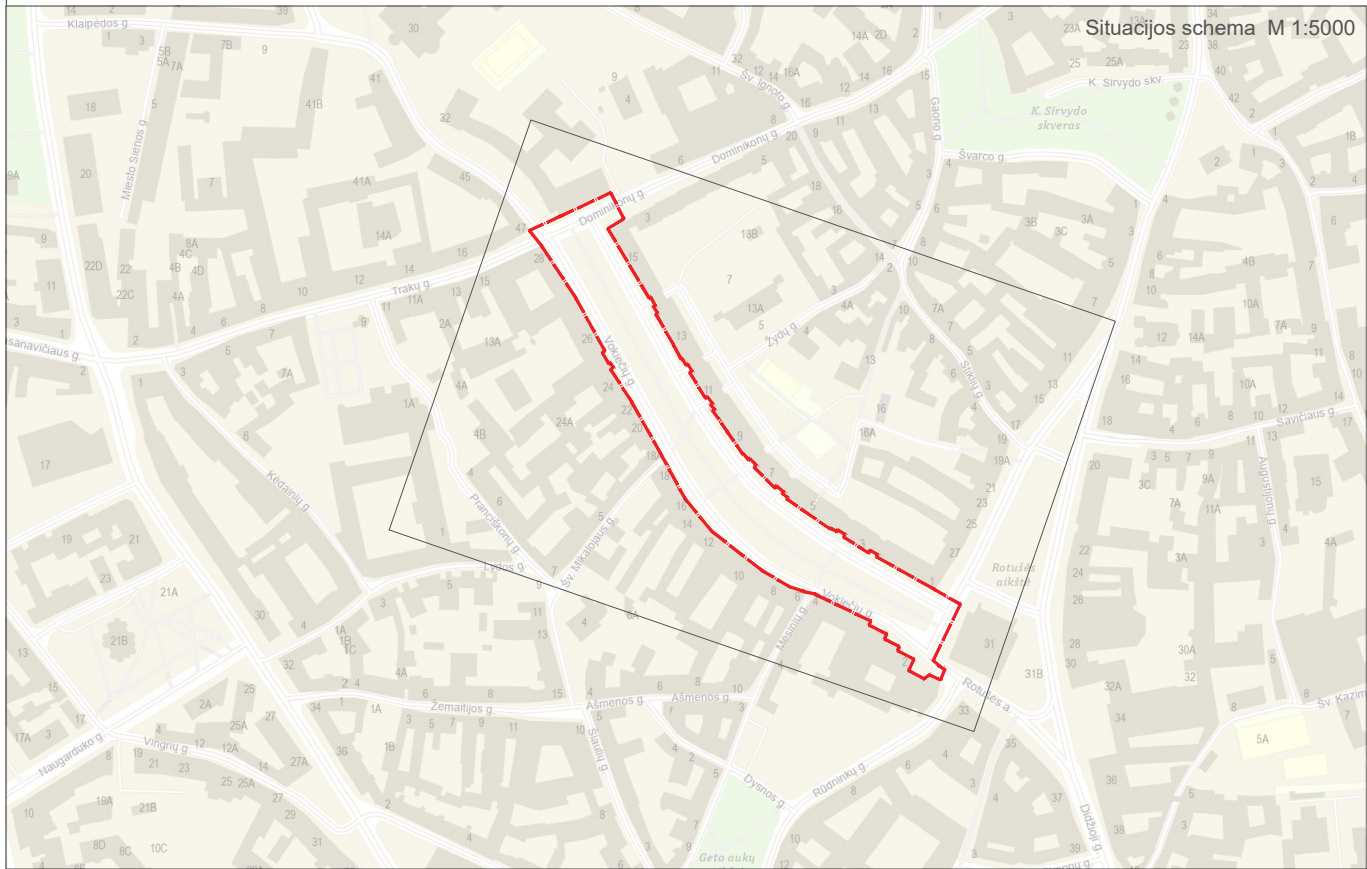

- PASTABOS:
1. INŽ. TINKLAI UŽ STATYBVIETĖS RIBOS MAKSIMALIAI KLOJAMI PRASTŪKIMO BŪDU, IŠKASOS BEI TRANŠĖJOS APTVĖRIMOS APSAUGINE TVORA, KAD NEPAKESTŲ PAŠALINIAI ASMENYS.
 2. VISI ASMENYS STATYBVIETĖJE PRIVALO DĖVėti ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES.
 3. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS STATYBOS TECHINIAIS REGLAMENTAIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYKIAUSIŲS 2004-02-11 ĮSTATYMO NR. 155 PATVIRTINTU KELIŲ PRIEŠIŠIOS TVAROS APRAŠŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU, VILNIAUS MIESTO TARYBOS 2004-06-23 SPRENDIMU NR. 1-425, AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTVIMO TAIKYKLĖS KPT SO-07 IR KITAI SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS. IŠARDYTOS GATVIŲ DANGOS IR JŲ PAGRINDAI TURI BŪTI ĮRENGIAMAI PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ.
 4. ELEKTRA BEI VANDENS STATYBOS LAIKOTARPIŲ PASIJUNGIAMA NUO ESAMŲ TINKLŲ PRIEŠ TAI SUSIDERINUS IR GAVUS TINKLŲ SAVININŲ SUPILKIMUS IR PRIBUDANT LAIKINUS APSAUGOS MĖGUS.
 5. PRIE DUBIŲ, PAVOJINGŲ ĮGILINIMŲ, ĮVARIŲ PERAKUŠTĖJIMŲ (FERDANGOS, LAIPTAI) IR PAN. PRIVALOMA ĮRENGTI LAIKINUS IR DANGIUS ATITVĖRIMUS SU IŠDĖJAMĄJA JUOSTA "STOP".
 6. STATYBOS OBJEKTE DIRBANT DAUGIAU NEI VIENAI IMONEI STATYBOS DARBUS PRIVALO PRIŽIŪRėti STATYBOS DARBU KOORDINATORIUS.
 7. PO STATYBOS DARBU VISO STATYBOS LAIKOTARPIU SUGADINTOS DANGOS ATSTATOMOS, TAME TARPE IR DANGOS NE TIK SKLYPO RIBOSE, TAČIAU IR UŽ SKLYPO RIBOS.
 8. ATSIDRADUS PAVOJINGAI ZONAI UŽ STATYBVIETĖS APTVĖRIMO, PRIVALO DALYVAUTI REGULIUOTOJAS IR PAŠALINIUS ASMENIS NUKREIPTI SAUGIŲ TĖMŲ.
 9. STATYBVIETĖS PLANĄ ŽIDŪRėti SYKIU SU SUVESTINTŲ INŽINERINŲ TINKLŲ IR SPLYPO DANGŲ PLANAIS.


- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**
- MB-2024 BUITINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMO VIETA
 - LAIKINAS APTVĖRIMAS
 - STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS
 - GAISRINIS POSTAS
 - INFORMACINIS SKYDAS
 - SKYDAS SU DRAUDŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS
 - RŪKYMO VIETA
 - KILNOJAMAS WC
 - IRANKINĖS IR SANDELIUKAI
 - AUTOMOBILIŲ RATŲ PLOVIMO VIETA
 - STATYBINIŲ ATLIKŲ KONTEINERIS
 - EISMAS STATYBOS DARBŲ METU
 - ATVIROS MEDŽIAGŲ SANDELIAVIMO VIETOS
 - Projektuojami paviršinių nuotekų šalinimo tinklai

STATYBOS INŽINERINIS KONSULTANTŲ BŪRAS UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BŪRAS" Įk. 305596023 Varnės g. 49, LT-01512 Vilnius info@aimm.lt				Projekto pavadinimas			
Atest. Nr. A1014, 0817 Pareigos PV V. Pavardė R. Zilinskas 2023				VOKIEČIŲ GATVĖS, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS			
aimm MB "IMM architektai"				Dokumento pavadinimas			
A2086 Arch I. Račkauskas 2023 Arch M. Glodenis 2023 Arch M. Kauzonas 2023				Laida			
STATYBOS INŽINERINIS KONSULTANTŲ BŪRAS UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BŪRAS" Įk. 302593207 Varnės g. 49, LT-01512 Vilnius info@statybuisras.lt				STATYBVIETĖS PLANAS (III Etapas) M 1:500			
27535 A. Bikučius 2023				0			
www.sdo.lt statybos darbų organizavimas MB "Promesa" Tel.: 8- (612)-62286, El. paštas: projektai@sdo.lt				Dokumento žymos			
29978 PDV G. Barysas 2023				Vilniaus miesto savivaldybė			
LT				AIMM22_01-1-TDP-SO-B.03		Lapas	Lapų
						1	1



Eismas link Domininkonų g.
kryptimi tik viešajam transportui
(siaurose gatvės vietose
reikalingas laikinas eismo
reguliavimas šviesoforu)


Eismas link Domininkonų g.
kryptimi tik viešajam transportui
(siaurose gatvės vietose
reikalingas laikinas eismo
reguliavimas šviesoforu)

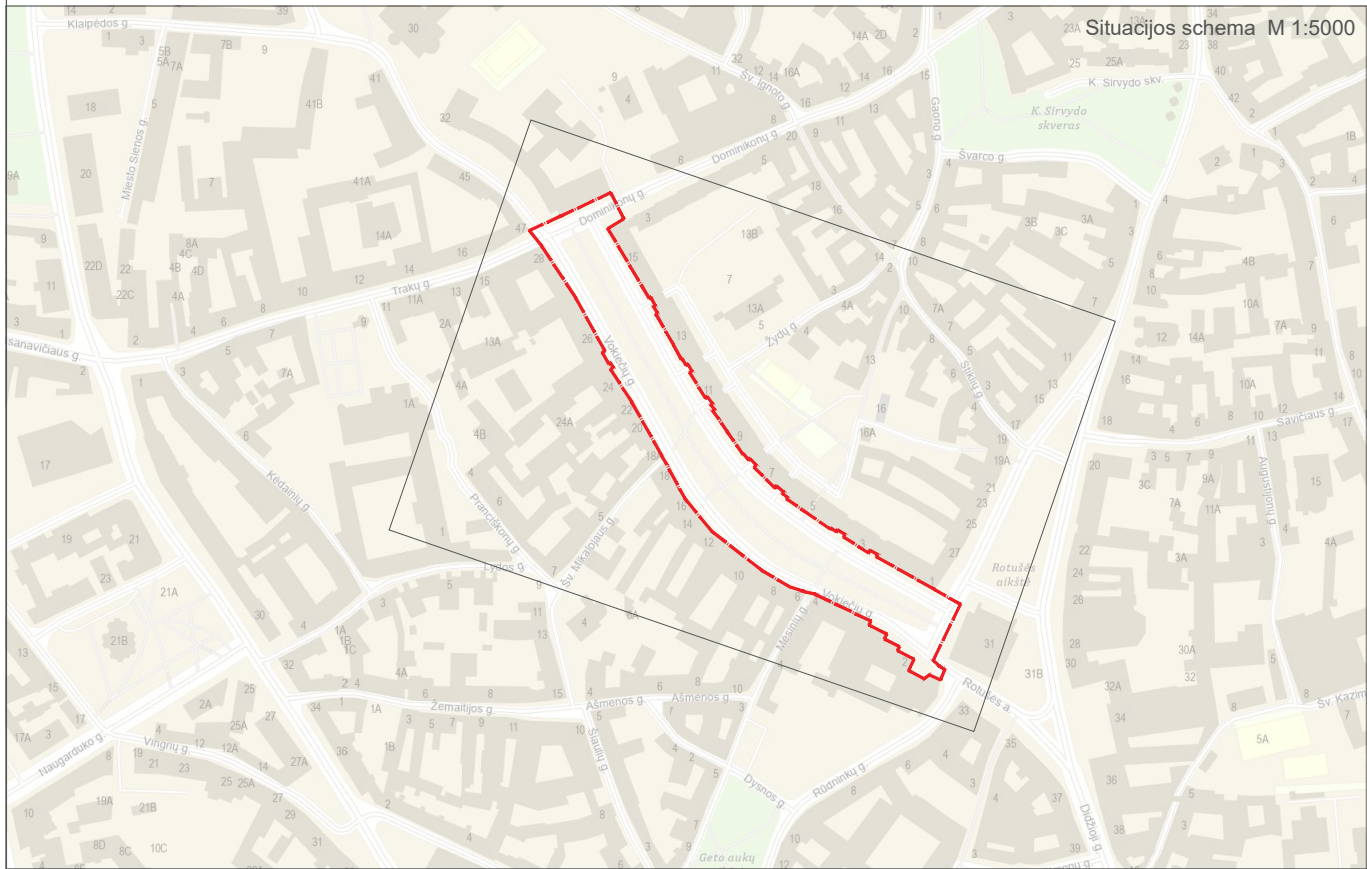

- PASTABOS:
1. INŽ. TINKLAI UŽ STATYBVIETĖS RIBOS MAKSIMALIAI KLOJAMI PRASTŪNIMO BŪDU, IŠKASOS BEI TRANŠĖJOS APTVĖRIMOS APSAUGINE TVORA, KAD NEPAKESTŲ PABALININTI ASMENYS.
 2. VISI ASMENYS STATYBVIETĖJE PRIVALO DĖVėti ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES.
 3. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS STATYBOS TECHNINIAIS REGLAMENTAIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYKIAUSIENYBĖS 2004-02-11 NUTARIMU NR. 155 PATVIRTINTU KELIŲ PRIEŠIŠIOS TIKROS APSAUGA, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU, VILNIAUS MIESTO TARYBOS 2004-06-23 SPRENDIMU NR. 1-425, AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTVIMO TAIKYKLĖMS KPT SOH 07 IR KITAI SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS. ĮŠARDOTOS GATVIŲ DANGOS IR JŲ PAGRINDAI TURI BŪTI ĮRENGIAMAI PAGAL ESAMA KONSTRUKCIJĄ.
 4. ELEKTRA BEI VANDUO STATYBOS LAIKOTARPIU PASIJUNGIAMA NUO ESAMŲ TINKLŲ PRIEŠ TAI SUSIDERINUS IR GAVUS TINKLŲ SAVININKŲ SUPILKIMUS IR ĮRENGIANT LAIKINUS APSAUGOS MĖGUS.
 5. PRIE DUBIŲ, PAVOJINGŲ IGLINIMŲ, ĮVARIŲ PERAUKŠTĖJIMŲ (FERDANGOS, LAIPTAI) IR PAN. PRIVALOMA ĮRENGTI LAIKINUS IR DAUGIUS AKTYVIERIMUS SU IŠDĖJAMĄJA JUOSTA "STOP".
 6. STATYBOS OBJEKTE DIRBANT DAUGIAU NEI VIENAI IMONEI STATYBOS DARBUS PRIVALO PRIŽIŪRėti STATYBOS DARBU KOORDINATORIUS.
 7. PO STATYBOS DARBU VISOS STATYBOS LAIKOTARPIU SUGADINTOS DANGOS ATSTATOMOS, YPAČIJE TAPKE IR DANGOS NE TIK SKLYPO RIBOSE, TAČIAU IR UŽ SKLYPO RIBOS.
 8. ATSIŽIURĖS PAVOJINGAI ZONAI UŽ STATYBVIETĖS APTVĖRIMO, PRIVALO DALYVAUTI REGULIUOTOJAS IR PAŠALINIS ASMENIS NUKREIPTI SAUGIŲ TAPU.
 9. STATYBVIETĖS PLANĄ ŽIDŪRėti SYKIU SU SUVESTINTU INŽINERINŲ TINKLŲ IR SPLYPO DANGŲ PLANAIS.

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**
- BUITINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMO VIETA
 - LAIKINAS APTVĖRIMAS
 - ↔ STATYBOS TRANSPORTO JUDĖJIMO KRYPTIS
 - GAISRINIS POSTAS
 - INFORMACINIS SKYDAS
 - SKYDAS SU DRAUDŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS
 - RŪKYMO VIETA
 - KILNOJAMAS WC
 - IRANKINĖS IR SANDELIUKAI
 - AUTOMOBILIŲ RATŲ PLOVIMO VIETA
 - STATYBINIŲ ATLIKŲ KONTEINERIS
 - EISMAS STATYBOS DARBŲ METU
 - ATVIROS MEDŽIAGŲ SANDELIAVIMO VIETOS
 - Projektuojami paviršinių nuotekų šalinimo tinklai



UAB "ATODANGOS" Atest. Nr. A1014, 0817 Pareigos PV V. Pavardė R. Zilinskas 2023				J.k. 221591590 Matrono g. 11 LT-01154 Vilnius www.atodangos.lt				Projekto pavadinimas			
aimm MB "IMM architektai"				J.k. 305596023 Varnės g. 49. LT-01512 Vilnius info@aimm.lt				VOKIEČIŲ GATVĖS, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS			
A2086 Arch I. Račkauskas 2023				A2086 Arch M. Glodenis 2023				Dokumento pavadinimas			
STATYBOS INŽINERINIS KONSTRUKCIJŲ BŪRAS				UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BŪRAS" J.k. 302593207 Varnės g. 49. LT-06248 Vilnius info@skb.lt				STATYBVIETĖS PLANAS (IV Etapas) M 1:500			
27535 A. Bikučius 2023				www.sdo.lt statybos darbų organizavimas MB "Promesa" Tel.: 8 (612) 62286 El. paštas: projektai@sdo.lt				Dokumento žymuo			
29978 PDV G. Barysas 2023				LT Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė				Lapų			
				AIMM22_01-1-TDP-SO-B.04				1 1			

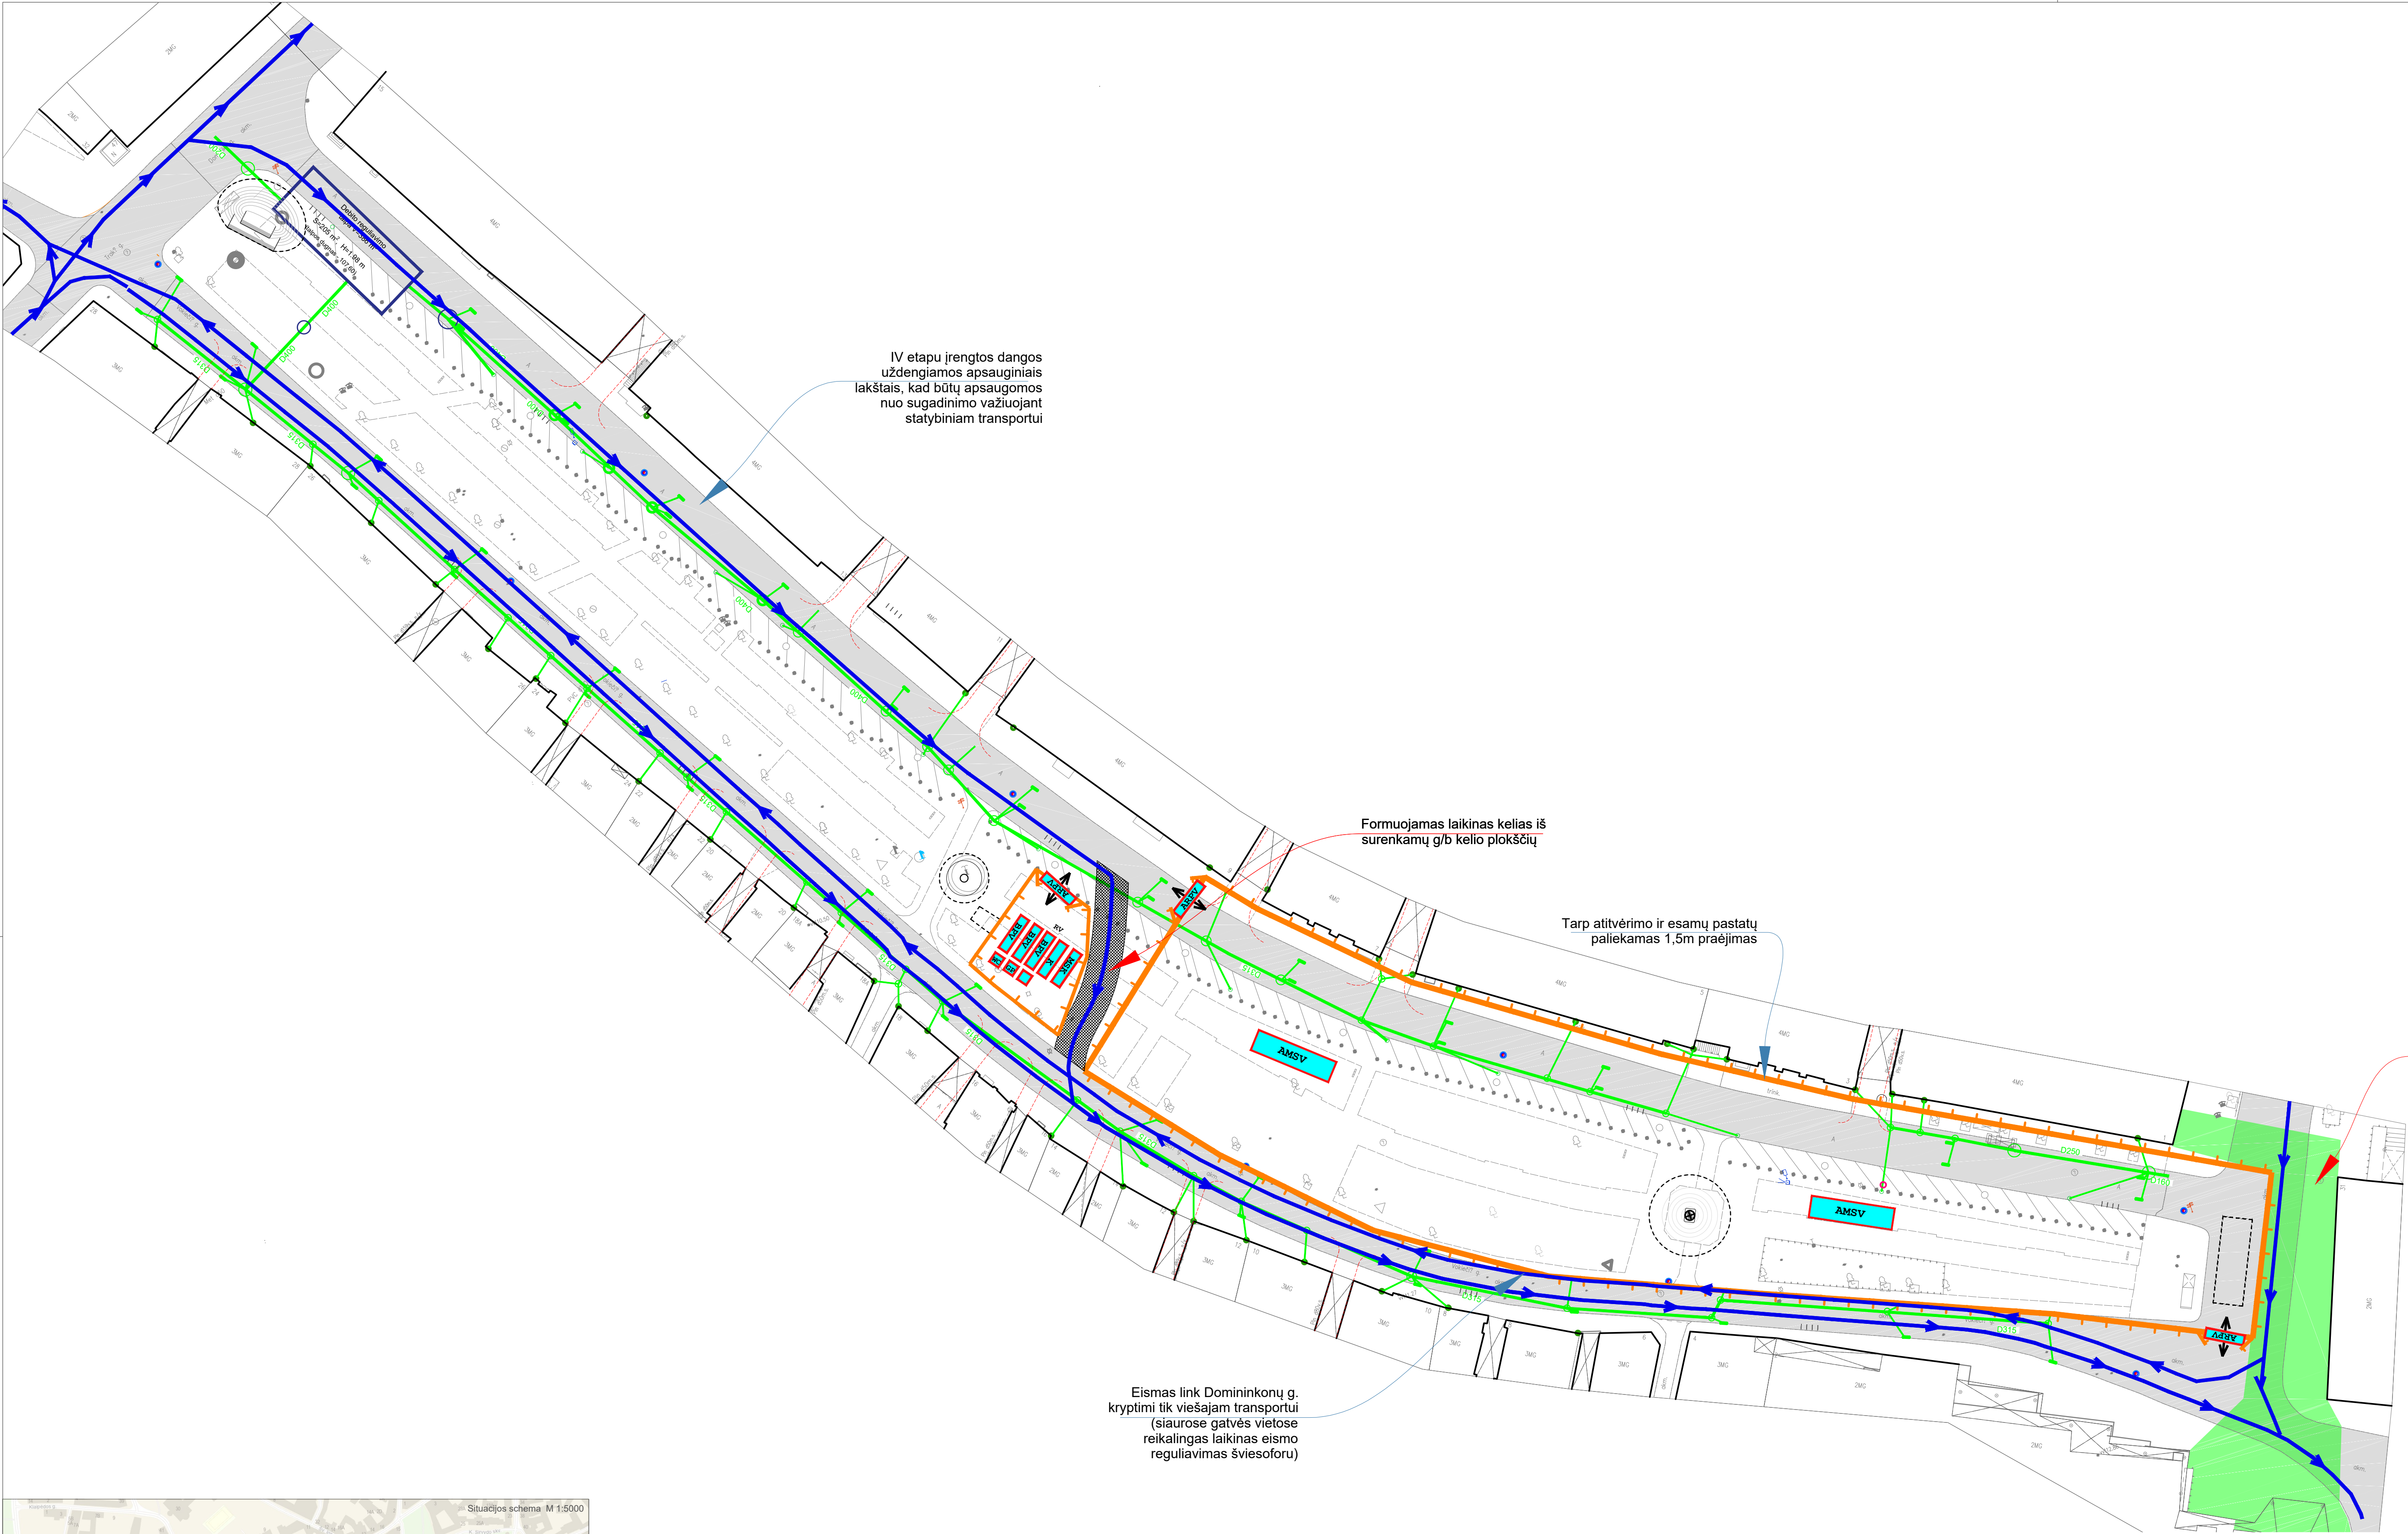

- PASTABOS:
1. INŽ. TINKLAI UŽ STATYBIETĖS RIBOS MAKSIMALIAI KLOJAMI PRASTŪNIMO BŪDU, IŠKASOS BEI TRANŠĖJOS APTVĖRIAMOS APSAUGINE TVORA, KAD NEPAKESTŲ PAŠALINIAI ASMENYS.
 2. VISI ASMENYS STATYBIETĖJE PRIVALO DĖVėti ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES.
 3. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS STATYBOS TECHNINIAIS REGLAMENTAIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYKIAUSIENYBĖS 2004-02-11 NUTARIMU NR. 155 PATVIRTINTU KELIŲ PRIEŠIŠIOS TVAROS APRAŠU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU, VILNIAUS MIESTO TARYBOS 2004-06-23 SPRENDIMU NR. 1-425, AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKAVIMO TAIKYKLĖMS KPT SSK 07 IR KITAIŠ SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS. ĮŠARDYTOS GATVIŲ DANGOS IR JŲ PAGRINDAI TURI BŪTI ĮRENGIAMAI PAGAL ESAMA KONSTRUKCIJĄ.
 4. ELEKTRA BEI VANDENS STATYBOS LAIKOTARIU PASIJUNGIAMA NUO ESAMŲ TINKLŲ PRIEŠ TAI SUSIDERINUS IR GAVUS TINKLŲ SAVININKŲ SUPUTIKIMUS IR ĮRENGIANT LAIKINUS APTVĖRIMO MAGIS.
 5. PRIE DOBRIŲ, PAVOJINGŲ IGLINIMŲ, ĮVARIŲ PERAUKŠTĖJIMŲ (FERDANGOS, LAIPTAI) IR PAN. PRIVALOMA ĮRENGTI LAIKINUS IR DAUGIUS ATITVĖRIMUS SU IŠDĖJAMĄJA JUOSTA "STOP".
 6. STATYBOS OBJEKTE DIRBANT DAUGIAU NEI VIENAI IMONEI STATYBOS DARBUS PRIVALO PRIŽIŪRėti STATYBOS DARBU KOORDINATORIUS.
 7. PO STATYBOS DARBU VISOS STATYBOS LAIKOTARPIU SUGADINTOS DANGOS ATSTATOMOS, YPAČIJE TAPKE IR DANGOS NE TIK SKLYPO RIBOSE, TAČIAU IR UŽ SKLYPO RIBOS.
 8. ATSIDRADUS PAVOJINGAI ZONAI UŽ STATYBIETĖS APTVĖRIMO, PRIVALO DALYVAUTI REGULIUOTOJAS IR PAŠALINIUS ASMENIS NUKREIPTI SAUGIŲ TAPU.
 9. STATYBIETĖS PLANĄ ŽIDŪRėti SYKIU SU SUVESTINTŲ INŽINERINŲ TINKLŲ IR SPLYPO DANGŲ PLANAIS.

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**
- BUITINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMO VIETA
 - LAIKINAS APTVĖRIMAS
 - ↔ STATYBOS TRANSPORTO JUDĖJIMO KRYPTIS
 - GAIŠRINIS POSTAS
 - INFORMACINIS SKYDAS
 - SKYDAS SU DRAUDŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS
 - RŪKYMO VIETA
 - KILNOJAMAS WC
 - ĮRANKINĖS IR SANDELIUKAI
 - AUTOMOBILIŲ RATŲ PLOVIMO VIETA
 - STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIS
 - EISMAS STATYBOS DARBŲ METU
 - ATVIROS MEDŽIAGŲ SANDELIAVIMO VIETOS
 - Projektuojami paviršinių nuotekų šalinimo tinklai


</	
---	--

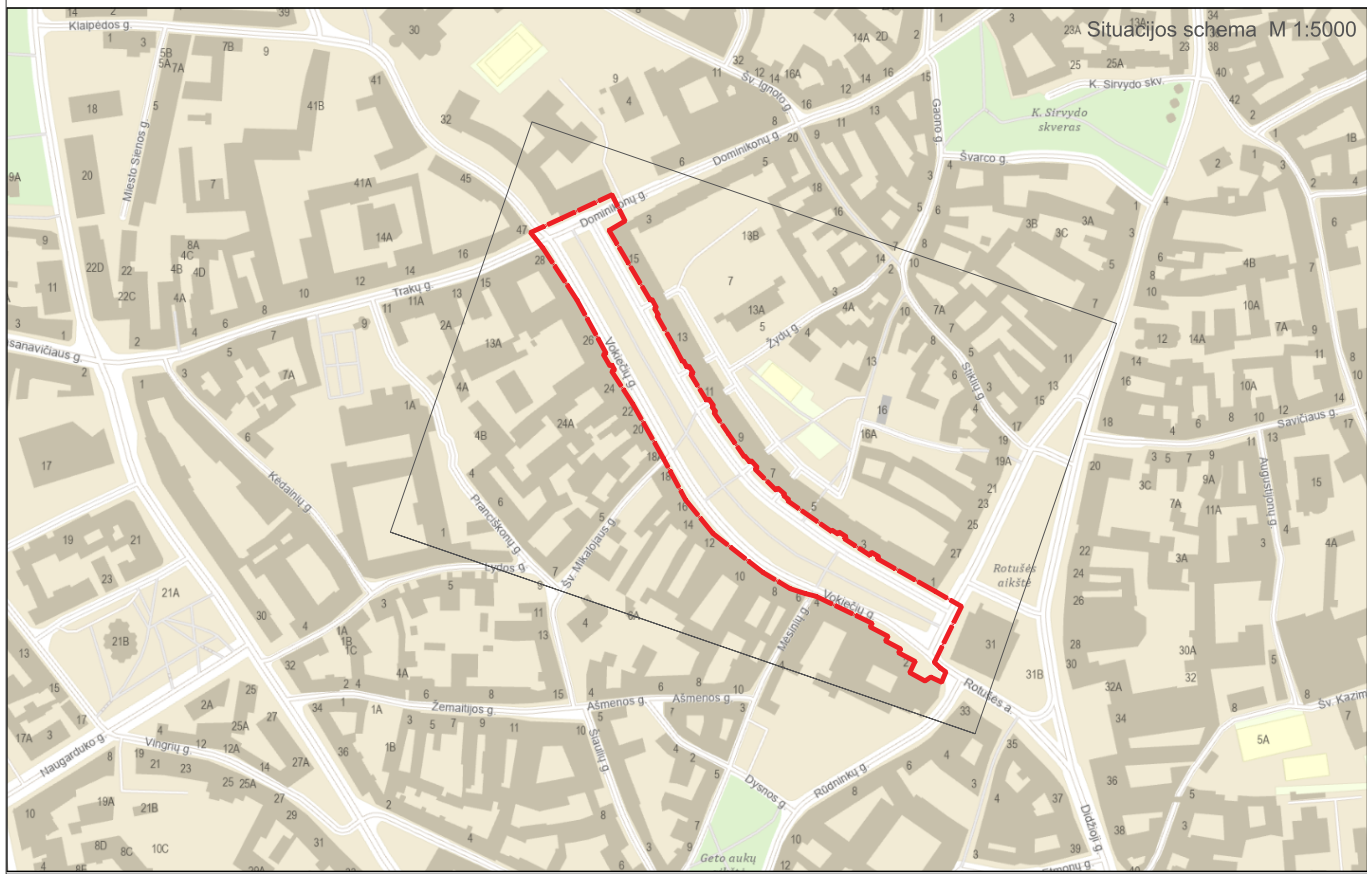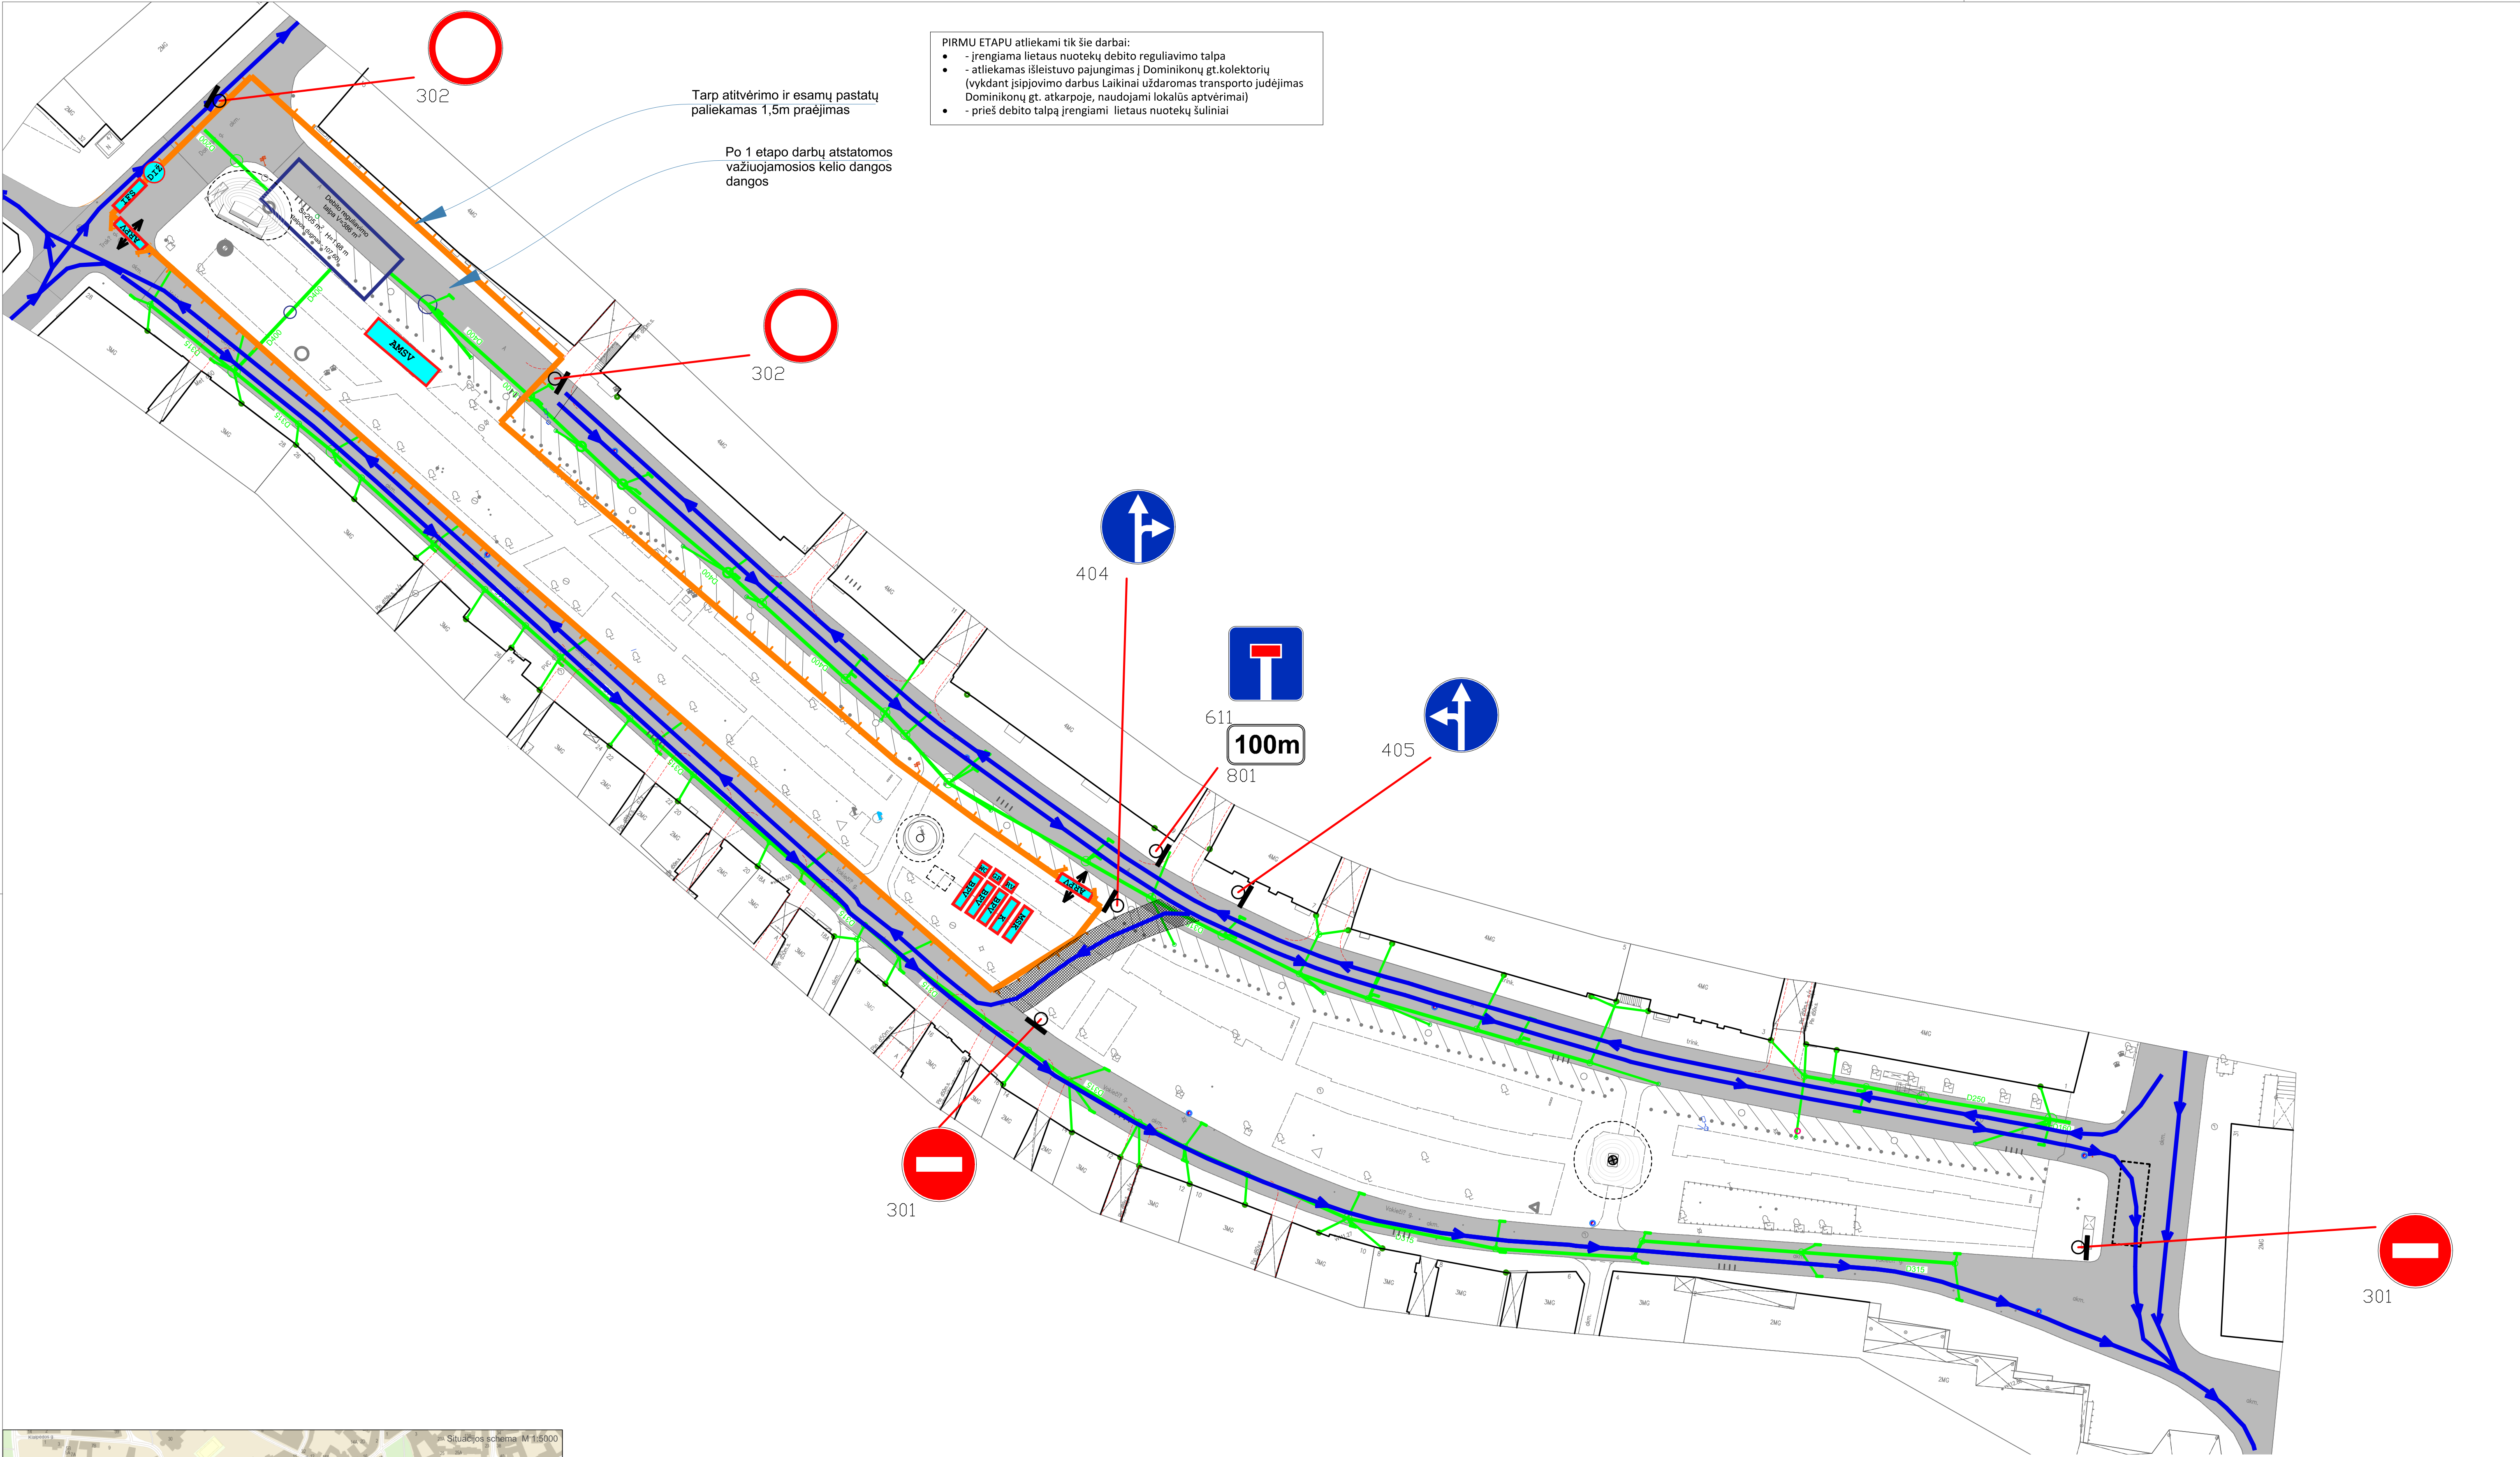

- PASTABOS:
1. INŽ. TINKLAI UŽ STATYBIETIES RIBOS MOKSLINIAI KLOJAMI PRASTŲIMO BŪDU, IŠKASOS BEI TRANŠĖJOS APATVERIAMOS APSAUGINE TVORA, KAD NEPATERTU PAŠALINIAI ASMENYS.
 2. VISI ASMENS STATYBIETIJE PRIVALO DĖSITI ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES.
 3. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS STATYBOS TECHINIAIS REGLAMENTAIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYKSAUSIOS 2004-02-11 ĮSTATYMO NR. 155 PATVIRTINTU KELIŲ PRIEŽIŲS TVARKOS APRAŠU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU, VILNIAUS MIESTO TARYBOS 2004-06-23 SPRENDIMU NR. 1-425, AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIŲ PROJEKTAŽIMO TAIKYKLĖS RPT SRK 07 IR KITAI SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS, IŠARUOTOS GATVĖS DANGOS IR JU PAKEITIMŲ TIRTI BŪTI ĮRENGIAMŲ PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ.
 4. ELEKTRA BEI VANDUO STATYBOS LAIKOTARPIU PASIJUNGSIAMA NUO ESAMŲ TINKLŲ PRIEŠ TAI SUSIDIRINUS IR GAVUS TINKLŲ SAVININKŲ SUTIKIMUS IR ĮRENGIANT LAIKINUS APSAUGOS NAUGUS.
 5. PRIE DUBIŲ, PAVOJINGŲ IGLINIMŲ, ĮVARIŲ PERAUKŠTĖJIMŲ (PERDANGOS, LAIPTAI) IR PAN. PRIVALOMA ĮRENGTI LAIKINUS IR SAUGIUS ATITVĖRIMUS SU IŠVEŽAMA ŽODŽIA "DUBA".
 6. STATYBOS OBJEKTE DĖSANT DANGIAU NEI VIENAI ĮMONEI STATYBOS DARBUS PRIVALO PRIŽIURĖTI STATYBOS DARBU KOORDINATORIUS.
 7. PO STATYBOS DARBU VISOS STATYBOS LAIKOTARPIU SUGADINTOS DANGOS ATSTATOMOS, TAME TARPE IR DANGOS NE TIK SKLYPO RIBOSE, TAČIAU IR UŽ SKLYPO RIBOS.
 8. ATSIŖADUS PAVOJINGAI ZONAI UŽ STATYBIETIES APATVĖRIMO, PRIVALO DALYVAUTI REGULIUOTOJAS IR PAŠALINIUS ASMENS NUKREIPTI SAUGIU PAKU.
 9. STATYBIETIES PLANA ŽIDURTI SYKIU SU SUVESTINIU INŽINERINIŲ TINKLŲ IR SKLYPO DANGŲ PLANAIS.

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- BUITINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMO VIETA
 - LAIKINAS APATVĖRIMAS
 - STATYBOS TRANSPORTO JUDĖJIMO KRYPTIS
 - GAIŠRINIS POSTAS
 - INFORMACINIS SKYDAS
 - SKYDAS SU DRAUDŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS
 - RŪKYMO VIETA
 - KILNOJAMAS WC
 - ĮRANKINĖS IR SANDELIUKAI
 - AUTOMOBILIŲ RATŲ PLOVIMO VIETA
 - STATYBINIŲ ATLIKŲ KONTEINERIS
 - EISMAS STATYBOS DARBŲ METU
 - ATVIROS MEDŽIAGŲ SANDELIJAVIMO VIETOS
 - Projektuojami paviršinių nuotekų šalinimo tinklai

UAB "ATODANGOS" A1014, 0817 Pareigos V. Pavardė 2023 aimm MB "IMM architektai" 305596023 Varnės g. 49 LT-01124 Vilnius info@aimm.lt				Projekto pavadinimas	
				VOKIEČIŲ GATVĖS, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS	
STATYBOS INŽINERINIS KONKULTANTŲ BIURAS UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONKULTANTŲ BIURAS" 302593207 Varnės g. 49 LT-01124 Vilnius info@konkultantai.lt				Dokumento pavadinimas	
				STATYBIETIES EISMO PLANAS (I Etapas) M 1:500	
27535				Laida	
				0	
ROKMAS LT Inž. R. Masevičius 2023 Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė				Dokumento žymos	
				AIMM22_01-1-TDP-SO-B.01	
				Lapas	Lapų
				1	1

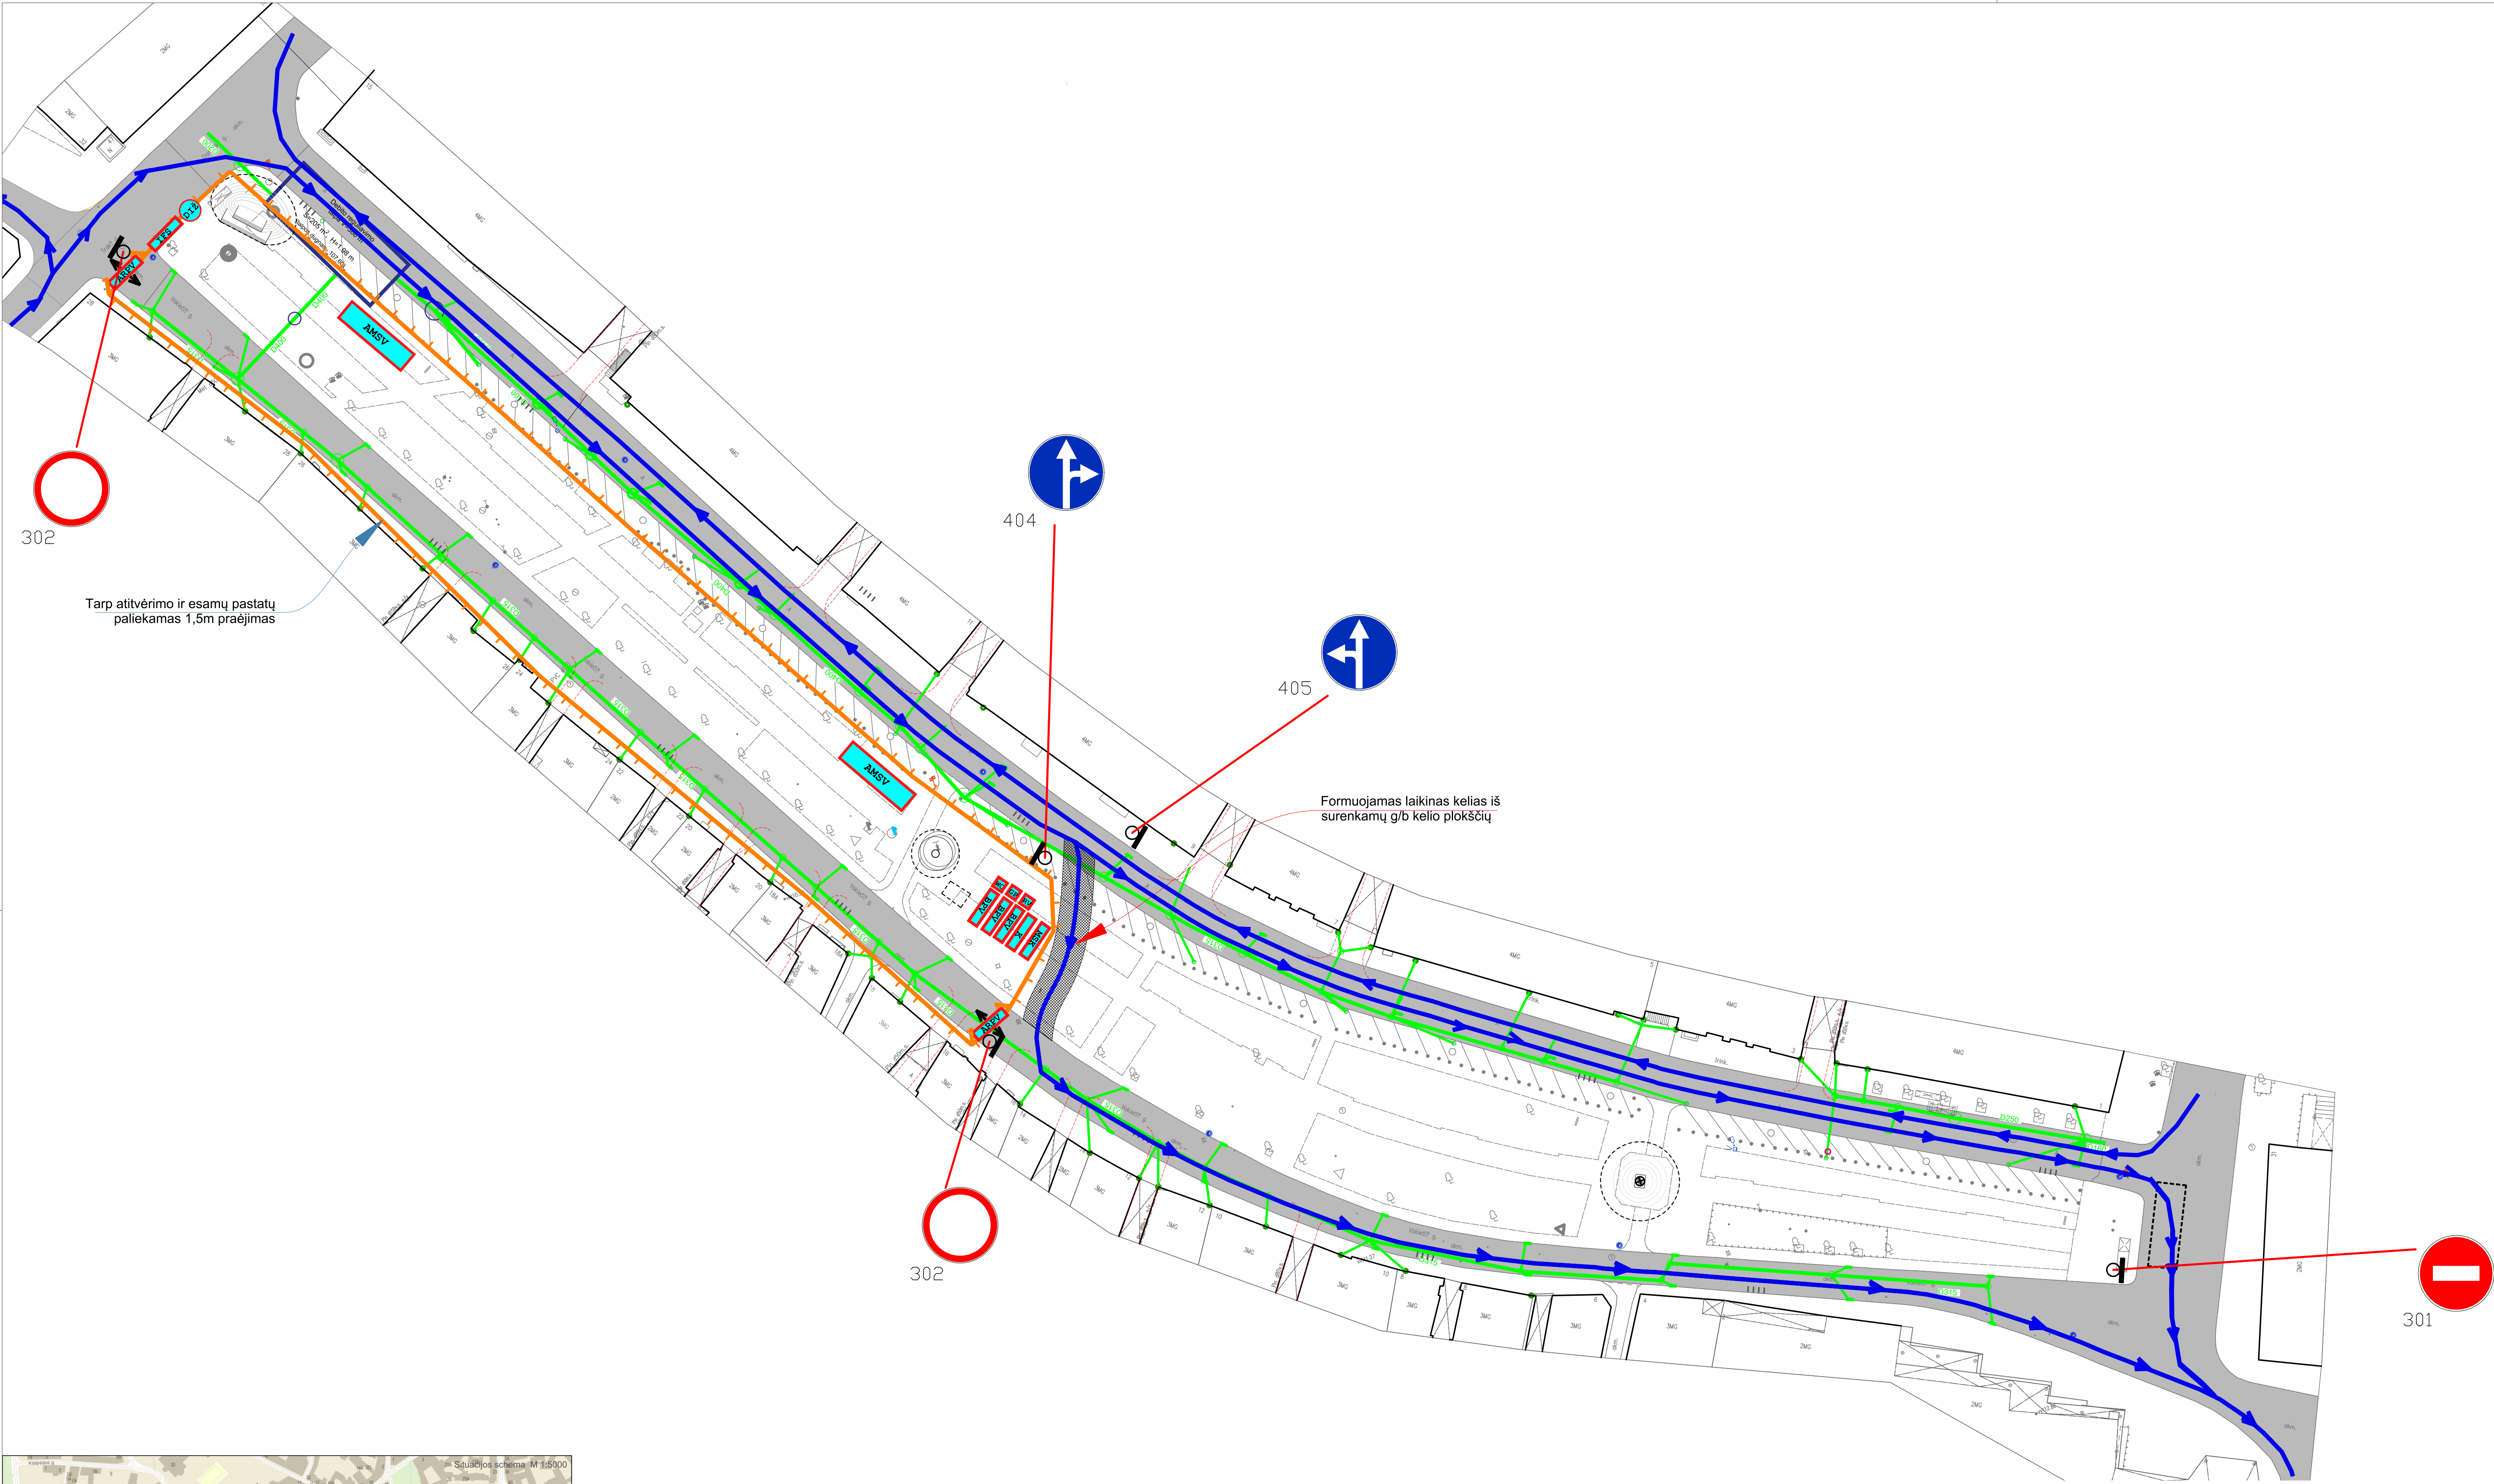

Tarp atitvėrimo ir esamų pastatų
paliekamas 1,5m praėjimas

Formuojamas laikinas kelias iš
surenkamų g/b kelių plokščių




PASTABOS:

1. INE. TINKLAI UŽ STATYBVIETĖS RIBOS MAKSIMALIAI KLOJAMI PRASTŲIMO BŪDU, IŠKASOS BEI TRANŠĖJOS APTVĖRIAMOS APSAUGINE TVORA, KAD NEPAVEIKTŲ PAŠALINIAI ASMENYS.
2. VISI ASMENYS STATYBVIETĖJE PRIVALO DĖVėti ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES.
3. STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVIAUJAMIS STATYBOS TECHINIAIS REGLAMENTAIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠASIS 2004-02-11 ĮPATAVIMU NR. 155 PATVIRTINTU KELIŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGIAUS RĖSMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU, VILNIAUS MIESTO TARYBOS 2004-06-23 SPRENDIMU NR. 1-425, AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKAVIMO TAIKYKLĖMS EPT 506.07 IR KITAIŠ SUGIULIAIS KELIŲS APRAŠ. ĮSADINTOS GATVIŲ DANGOS IR JU PAGRINDAI TURI BŪTI ĮRENGIAMIS PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ.
4. ELEKTRA BEI VANDUO STATYBOS LAIKOTARPIU PASIJUNGIAMA NUO ESAMŲ TINKLŲ PRIEŠ TAI SUSIDERINUS IR GAVUS TINKLŲ SAVINININKŲ SUTIKIMUS IR ĮRENGIANT LAIKINUS APSKAITOS MAŽGUS.
5. PRIE DUBOTŲ, PAVOJINGŲ ĮGILINIMŲ, ĮVARIŲ PERAUKŠTĖJIMŲ (PERDANGOS, LAIPTAI) IR PAN. PRIVALOMA ĮRENGTI LAIKINUS IR SAUGIUS ATITVĖRIMUS SU ĮSĖJAMAJA JUOSTA "STOP".
6. STATYBOS OBJEKTE DIRBANT DAUGIAU NEI VIENAI IMONEI STATYBOS DARBUS PRIVALO PRIEŽIŪRėti STATYBOS DARBU KOORDINATORIUS.
7. PO STATYBOS DARBU VISOS STATYBOS LAIKOTARPIU SUGADINTOS DANGOS ATSTATOMOS, TAMB TARPE IR DANGOS NE TIK SKLYPO RIBOSE, TACIAU IR UŽ SKLYPO RIBOS.
8. ATSIŖADOS PAVOJINGAI ZONAI UŽ STATYBVIETĖS APTVĖRIMO, PRIVALO DALYVAUTI REGULIUOTOJAS IR PAŠALINIUS ASMENIS NUKREIPTI SAUGIU TACU.
9. STATYBVIETĖS PLANĄ ŽIŪRėti SYKIU SU SUVESTINIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ IR SFLYPO DANGŲ PLANAIS.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- BUITINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMO VIETA
- LAIKINAS APTVĖRIMAS
- STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS
- GAISRINIS POSTAS
- INFORMACINIS SKYDAS
- SKYDAS SU DRAUDŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS
- RŪKYMO VIETA
- KILNOJAMAS WC
- ĮRANKINĖS IR SANDELIUKAI
- AUTOMOBILIŲ RATŲ PLOVIMO VIETA
- STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIS
- EISMAS STATYBOS DARBŲ METU
- ATVIROS MEDŽIAGŲ SANDELIAVIMO VIETOS
- Projektuojami paviršinių nuotekų šalinimo tinklai

UAB "ATODANGOS" Alies. Nr. A1014.0817 Pareigos PV V. Pavardė R. Žilinskis 2023 aimm MB "IMM architektai" Arch. A2086 Arch. I. Račkauskas Arch. M. Glodenis Arch. M. Kauzonas 2023 2023 2023 STATYBOS INŽINERIJOS KONSULTANTŲ BIURAS UAB "STATYBOS INŽINERIJOS KONSULTANTŲ BIURAS" J. 302593207 Šv. Stepono g. 49, LT-01124 Vilnius info@aimm.lt 27535 A. Bikulčius 2023				Projekto pavadinimas VOKIEČIŲ GATVĖS, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS Dokumento pavadinimas STATYBVIETĖS EISMO PLANAS (II Etapas) M 1:500 Laida 0 Dokumento žymuo AIMM22_01-1-TDP-SO-B.02 Lapų 1 Lapų 1
---	--	--	--	--

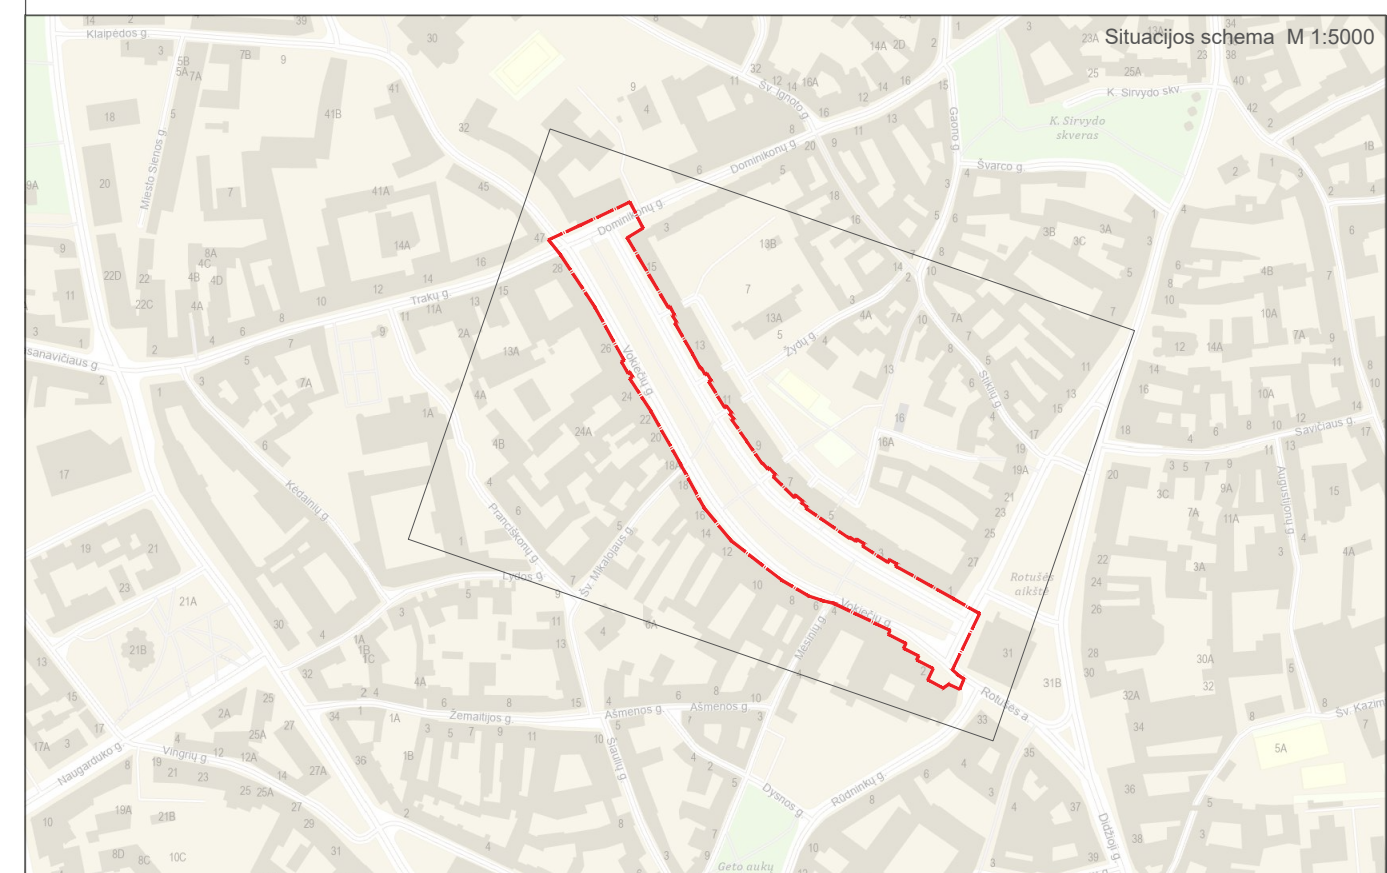

- [illegible]


- 
PAŠVARYS
 BUKTINŲ PATALPŲ ĮRENGIMO VIETA
- 
 LAIKINAS APŲTĖRIMAS
 STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS
- 
 LAIKINAS
 GAISRINIS POSTAS
- 
 LAIKINAS
 INFORMACINIS SKYDAS
- 
 LAIKINAS
 SKYDAS SU DRAUDŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS
- 
 LAIKINAS
 RŪKYMO VIETA
- 
 LAIKINAS
 KILNOJAMAS WC
- 
 LAIKINAS
 ĮRANKNĖS IR SANDĖLIUKAI
- 
 LAIKINAS
 AUTOMOBILIŲ RATŲ PLOVIMO VIETA
- 
 LAIKINAS
 STATYBINIŲ ATLIKŲ KONTEINERIS
- 
 LAIKINAS
 EISMAS STATYBOS DARBU METU
- 
 LAIKINAS
 ATVIROSI MEDIJŲ SANDĖLIAVIMO VIETOS

Projektoje paviršinių nuotekų šalimo tinklai

		J.k. 215901590 Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius www.aidotargas.lt		Projekto pavadinimas	
UAB "ATODARGOS"				VOKIŲKŲ GATVĖS, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS	
Atest. Nr.	Pareigos	V. Pavardė			
A1014_0817	PV	R. Žilinskas			
 MB "IMM architektai"		J.k. 305596023 Šv. Stepono g. 32-13 LT-01312 Vilnius info@aimm.lt		Dokumento pavadinimas	
A2086	Arch.	I. Račkauskas		STATYBVIETĖS EISMO PLANAS (III Etapas) M 1:500	
	Arch.	M. Glodenis			
	Arch.	M. Kauzonas			
 STATYBOS INŽINERŲ KONSULTANTŲ BIURAS		J.k. 302593207 Varnės g. 49, LT-05248 Vilnius info@cnb.lt		Laida	
27535		A. Bikušius			
 ROKMAS PROJEKTAI		MB "Rokmas" Tel.: 8- (662)-833321 El. paštas: info@rokmas.lt		0	
	Inž.	R. Masevičius		Dokumento žymuo	
LT	Statybos			A1MM22_01-1-TDP-SO-B.03	
Vilniaus miesto savivaldybė				Lapas	Lapy
				1	1



Eismas link Domininkonų g.
kryptimi tik viešajam transportui
(siaurose gatvės vietose
reikalingas laikinas eismo
reguliavimas šviesoforu)

- ## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- 
- The legend consists of colored rectangles and circles next to their corresponding descriptions:
- RAŠYMAS** (orange rectangle): BUTINIŲ PATALPŲ ĮRANGIMO VIETA
 - RAŠYMAS** (orange rectangle): LAIKINAS APŲVERTIMAS
 - RAŠYMAS** (black double-headed arrow): STATYBOS TRANSPORTO JUDEJIMO KRYPTIS
 - RAŠYMAS** (red square): GAISRINIS POSTAS
 - RAŠYMAS** (red rectangle): INFORMACINIS SKYDAS
 - RAŠYMAS** (blue circle): SKYDAS SU DRAUDŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS
 - RAŠYMAS** (red square): RŪKIMO VIETA
 - RAŠYMAS** (red square): KILNOJAMAS WC
 - RAŠYMAS** (red rectangle): ĮRANKINĖS IR SANDELIUKAI
 - RAŠYMAS** (red rectangle): AUTOMOBILIŲ RATŲ PLOVIMO VIETA
 - RAŠYMAS** (red rectangle): STATYBINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIS
 - RAŠYMAS** (red rectangle): EISMAS STATYBOS DARBU METU
 - RAŠYMAS** (red rectangle): ATVIROS MEDŽIAUGU SUOPTYTI VIENTOS
- Projektojuojami paviršinių nuotekų šalintojai tinkami

		J.k. 22159/190 Maronio g. 11 LT-01124 Vilnius www.atodangos.lt		Projekto pavadinimas	
		UAB "ATODANGOS"		VOKIETIŲ GATVĖS, VILNIOJE. REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINIERINIŲ STATINIŲ PROJEKTAS	
Alseja Nr. A1014, 0817		Pareigos PV	V. Pavardė R. Zilinskas	J.k. 305596023 Šv. Stepono g. 32-13 LT-01312 Vilnius info@aimm.lt	2023 2023
		MB "IMM architektai"		J.k. 305596023 Šv. Stepono g. 32-13 LT-01312 Vilnius info@aimm.lt	
A2086	Arch	I. Račkauskas		2023	Dokumento pavadinimas
	Arch	M. Glodenis		2023	
	Arch	M. Kauzonas		2023	
		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS"		J.k. 302593207 Varnės g. 49 LT-06240 Vilnius info@statybainz.lt	2023
27535	A. Bikičius		2023	STATYBVIETĖS EISMO PLANAS (IV Etapas) M 1:500	Laida
		MB "Rokmas" Tel.: 8 (862) 833321. El. paštas: info@rokmas.lt		0	
LT	Įst.	R_Masevičius		2023	Dokumento žymuo
	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė			
AIMM2022_01-1-TDP-SO-B.04					Lapas Lapų 1 1



30

30

Trumpalaikiai atitvėrimai
koreguojami pagal statybos
darbu vykdymo zoną

301

Eismas link Dominikonų g.
kryptimi tik viešajam transportui
(siaurose gatvės vietose
reikalingas laikinas eismo
reguliavimas šviesoforu)

- [illegible]

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

[illegible]

		J.k. 221591590 Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius www.atodangos.lt		Projekto pavadinimas	
UAB "ATODANGOS"				VOKIŲKIEJŲ GATVĖS, VILNIUJE. REKONSTRAVIMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINIERIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS	
Asat. Nr. A1014, 0817	Pareigos PV	V. Pavardė R. Zilinskas	2023 2023		
		MB "IMM architektai"			
		J.k. 305590023 Šv. Stepono g. 32-13 LT-01312 Vilnius info@aimm.lt			
A2086	Arch. Arch. Arch.	I. Račkauskas M. Glodenis M. Kauzonas	2023 2023 2023	Dokumento pavadinimas	
				Laida	
		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS"		STATYBVIETĖS EISMO PLANAS (V Etapas) M 1:500	
27535	A. Bikušius		2023		
		MB "Rokmas"		0	
		Tel.: 8- (662)-853321; El. paštas: info@rokmass.lt			
LT	Inž. Statybos	R. Masevičius	2023	Dokumento žymos	
		Vilniaus miesto savivaldybė		AIMM22_01-1-TDP-SO-B.05	
				Lapas	Lapų
				1	1



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.29978

Gintautas Barysas



Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje ir apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietoje.

Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

NAUDOTI VOKIEČIŲ GATVĖS, VILNIUJE,
REKONSTRAVIMO IR KTOS PASKIRTIES
INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

20261

Išduotas 2018 m. balandžio 16 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. rugsėjo 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt
