

	Name	Duration
0	**1. Pastato- ligoninės (unikalus Nr. 1098-8007-5014, žyma plane 1D5/p) Santariškių g. 4, Vilniuje rekonstravimo projektas 2. Pastato- akušerijos ir chirurgijos korpuso (unikalus Nr. 4400-1809-1235, žyma plane 18D5/b) Santariškių g. 2, Vilniuje rekonstravimo projektas. 3. Esamų lauko inžinerinių tinklų (susikertančių su naujai projektuojamais statiniais) Santariškių g. 2 ir Santariškių g. 4, Vilniuje rekonstravimo projektai. 4. Inžinerinio statinio- automobilių saugyklos (aikštelės), uniklus Nr. 4400-5052-7761, adresas Santariškių g. 4, Vilniuje rekonstravimo projektas. 5. Kiti, esant poreikiui ...**	**718 d**
1		
2		
3	▶ [redacted]	[redacted]
17	▶ [redacted]	[redacted]
21	[redacted]	66 d
22	**PROJEKTAVIMAS:**	**222 d**
23	**Pasirengimas projektavimui; tyrinėjimai; sąlygos;**	**45 d**
24	pradžia, sutartis	0 d
25	techninė užduotis (projektavimo užduotis) + priršprojektiniai pasiūlymai (PPP)	0 d
26	tyrinėjimai- toponuotrauka (patikslinta + papildomi matavimai; šuliniai; altitudės)	1 d
27	sąlygų skaičiavimai, poreikiai; užduotis geologiniams tyrinėjimams;	5 d
28	tyrinėjimai- geologiniai tyrinėjimai (projektiniai; papildomi; kontroliniai)	40 d
29	sąlygos inžineriniams tinklams iškelti/ projektuoti;	20 d
30	bendraturčių sutikimai	20 d
31	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
32	**Projektiniai pasiūlymai:**	**121 d**
33	tarpdisciplininė užduotis_PP.SA; PP.SP (architektūrinės ir sklypo plano dalių)	5 d
34	brėžiniai (PP.SP; PP.SA dalys)	40 d
35	brėžiniai (PP.T dalis)	20 d
36	brėžiniai, skaičiavimai (PP.SK dalys, papildomos)	40 d
37	brėžiniai, skaičiavimai (PP.SP (lauko inžinerinių tinklų dalys, schema;))	40 d
38	brėžiniai, skaičiavimai (PP.INŽ (vidaus inžinerinių tinklų dalys, schemos))	40 d
39	tarpdisciplininės užduotus_ PP.GS (gaisrosaugois dalis)	20 d
40	tarpdisciplininės užduotys_ PP.ENE (energetinis modelis)	20 d
41	kiti brėžiniai..	1 d
42	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
43	techninės specifikacijos;	5 d
44	medžiagų žinairaščiai;	5 d
45	aiškinamsis raštas;	5 d
46	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
47	viešinimas;	20 d
48	IS Infostatyba; statybą leidžiantis dokumentas (SLD)	20 d
49	.. rezervas (pakartotinas teikimas)	20 d
50	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
51	**Techninis darbo projektas (iškeliami, prijungiami lauko inžineriniai tinklai)) :**	**100 d**
52	techninės užduoties patiklsinimas techninio darbo projekto rangai;	5 d
53	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
54	brėžiniai (visos dalys);	40 d
55	apsaugos zonų, servitutų derinimas ir įregistravimas;	20 d
56	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
57	techninės specifikacijos (visos dalys);	5 d
58	medžiagų žinairaščiai (visos dalys);	5 d
59	aiškinamsis raštas (visos dalys);	5 d
60	pritarimai projekto sprendiniams sąlygas išdavusiose institucijose; Infostatyba, statybai leidžiantis dokumntai;	20 d
61	.. rezervas	20 d
62	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
63	**Techninis darbo projektas (pastatas, patalpos) :**	**131 d**
64	techninės užduoties patiklsinimas techninio darbo projekto rangai;	5 d
65	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
66	brėžiniai (visos dalys);	85 d
67	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
68	techninės specifikacijos (visos dalys);	5 d
69	medžiagų žinairaščiai (visos dalys);	5 d

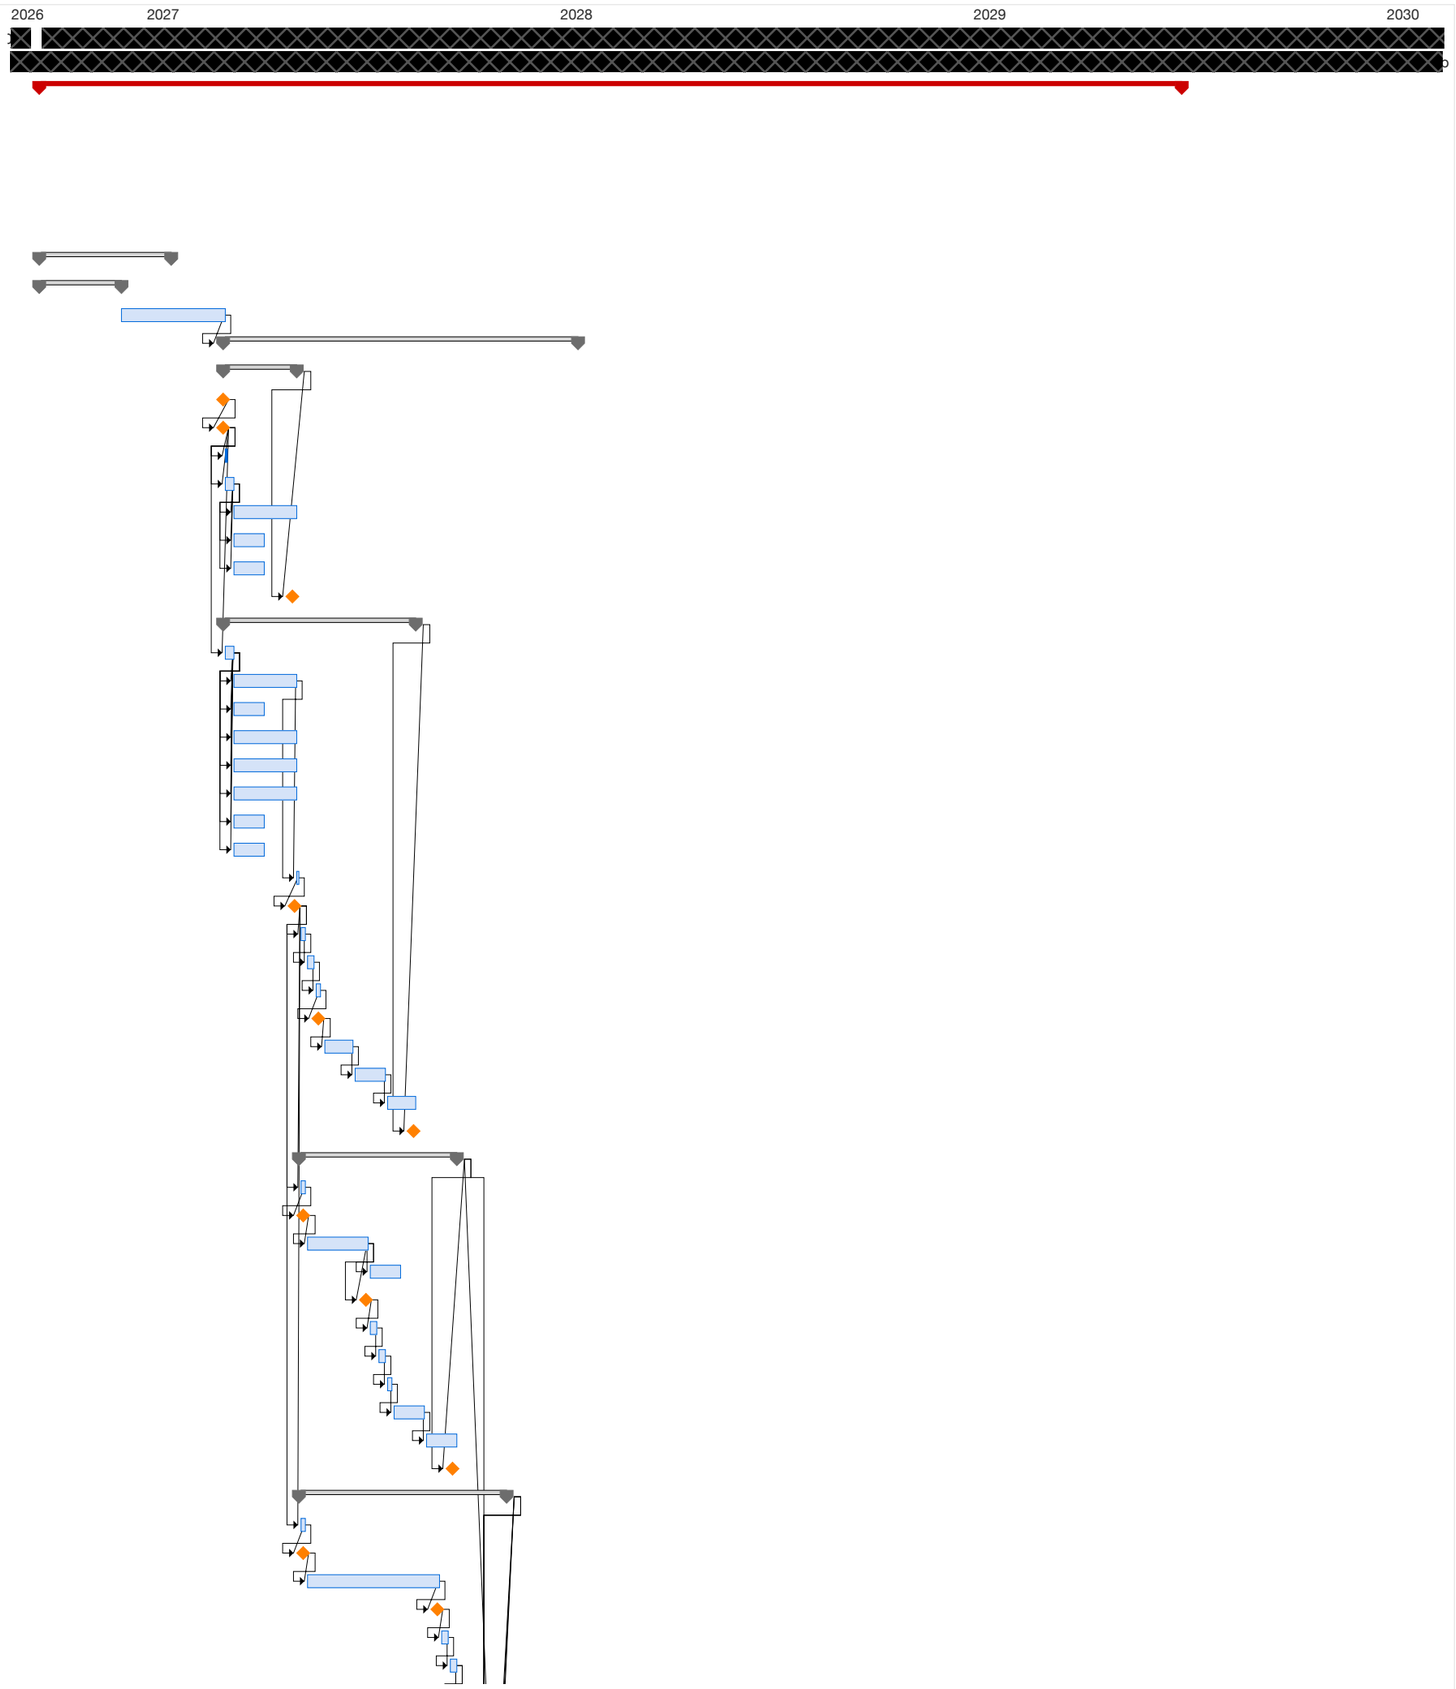

	Name	Duration
70	aiškinamsis raštas (visos dalys);	5 d
71	sąmata (visos dalys)	31 d
72	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
73	BIM modelis (visos dalys);	0 d
74	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
75	techninio darbo projekto ekspertizė	40 d
76	pranešimas apie statybų pradžią	5 d
77	**▼ STATYBOS**	**380 d**
78	**▼ Statybos:**	**380 d**
79	statybos aikštelė ;	5 d
80	esamų lauko inžinerinių tinklų iškėlimas;	40 d
81	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
82	kasimas ir greta esančių statinių tvirtinimas (pagal poreikį);	50 d
83	esamų pastatų rekonstravimo darbai;	50 d
84	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
85	požeminės konstrukcijos; gelžbetoninės konstrukcijos; sienos;	55 d
86	laiptinės; antžeminės statinių dalys;	40 d
87	stogas (-ai);	50 d
88	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
89	hidroizoliacija; šiltinimas;	40 d
90	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
91	vidaus inžineriniai tinklai- techninės patalpos, horizontalios ir vertikalios magistralės (kartu arba atskirai pagal visas projekto dalis)	40 d
92	vidaus inžineriniai tinklai- galutiniai prijungimai, inžineriniai taškai (kartu arba atskirai pagal visas projekto dalis)	30 d
93	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
94	durys;	20 d
95	apdaila (grindys, sienos, lubos)	40 d
96	baldai, žymėjimai;	20 d
97	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
98	nauji lauko inžineriniai tinklai;	80 d
99	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
100	gerbūvis; kietos ir minkštos dangos. želdynai; mažoli architektūra;	40 d
101	bandymai; pridavimas eksploatacijai	40 d
102	kita	10 d
103	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d
104		
105	pabaiga	0 d

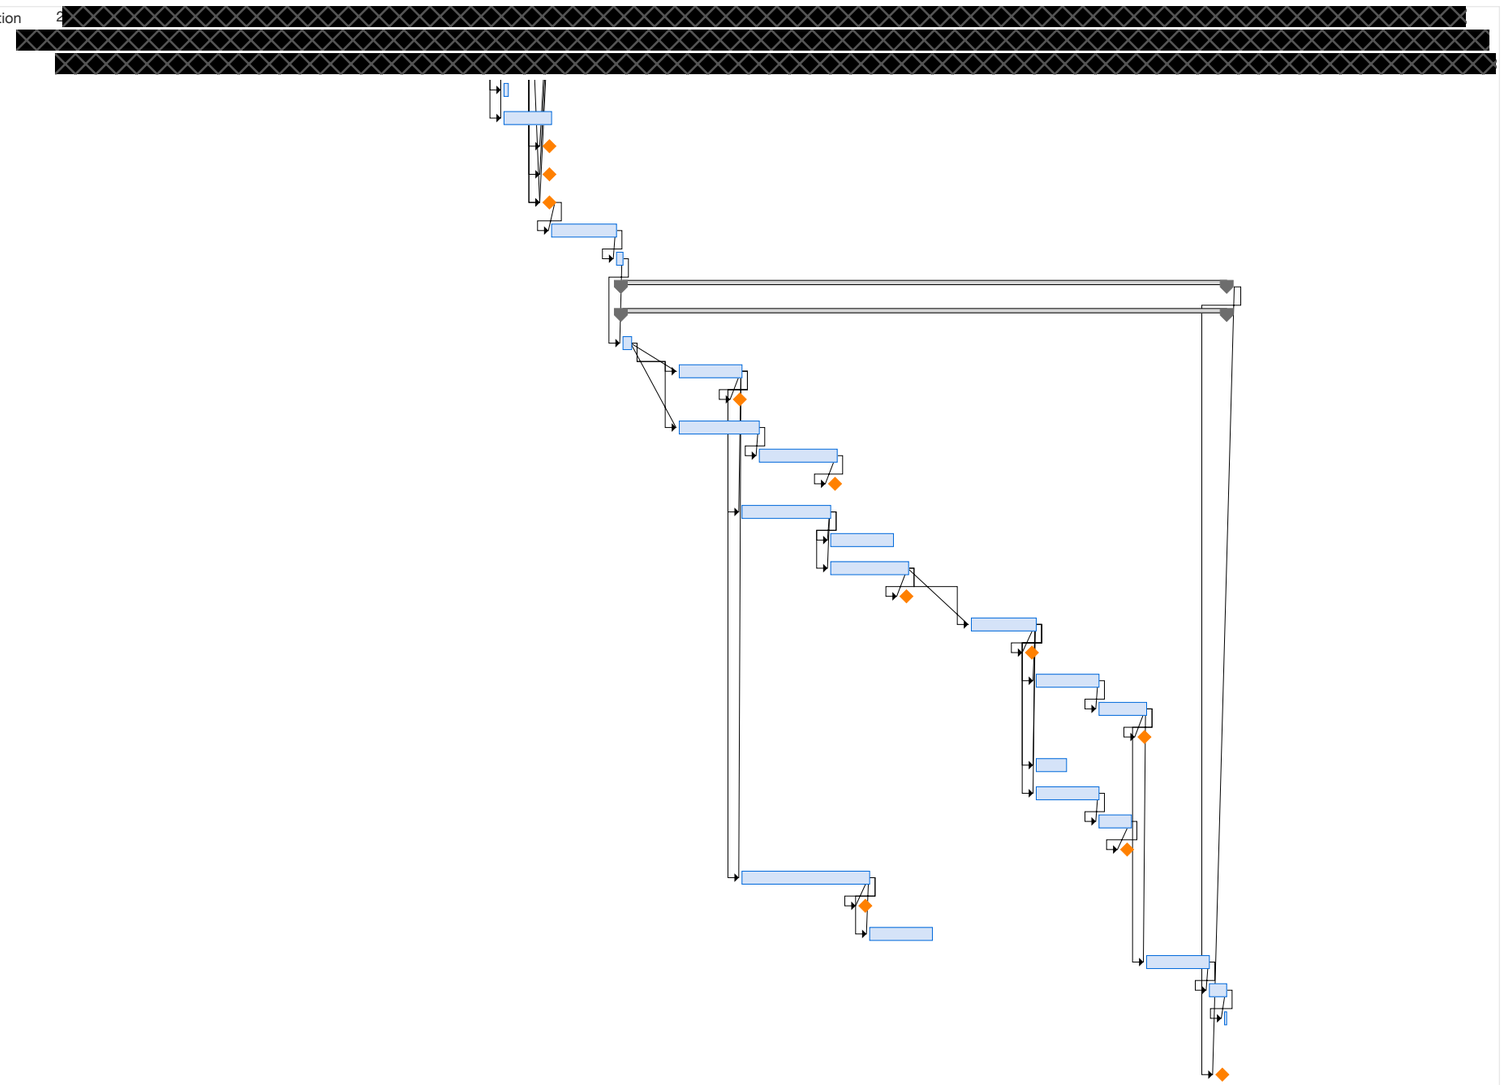

	1. Pastato- ligoninės (unikalus Nr. 1098-8007-5014, žyma plane 1D5/p) Santariškių g. 4, Vilniuje rekonstravimo projektas 2. Pastato- akušerijos ir chirurgijos korpuso (unikalus Nr. 4400-1809-1235, žyma plane 18D5/b) Santariškių g. 2, Vilniuje rekonstravimo projektas. 3. Esamų lauko inžinerinių tinklų (susikertančių su naujai projektuojamais statiniais) Santariškių g. 2 ir Santariškių g. 4, Vilniuje rekonstravimo projektai. 4. Inžinerinio statinio- automobilių saugyklos (aikštelės), unikalus Nr. 4400-5052-7761, adresas Santariškių g. 4, Vilniuje rekonstravimo projektas.				
	PRELIMINARUS GRAFIKO RUOŠINYS				
	pavadinimas, etapas:	**trukmė, d.dienomis**	**trukmė nuo:**	**trukmė iki:**	**įvykdymas, proc. :**
0	**PROJEKTAVIMAS:**	**222 d**			
1	Pasirengimas projektavimui; tyrinėjimai; sąlygos;	45 d			0%
2	Projektiniai pasiūlymai:	121 d			0%
2_01	tarpdisciplininė užduotis_PP.SA; PP.SP (architektūrinės ir sklypo plano dalių)	5 d			0%
2_02	brėžiniai (PP.SP; PP.SA dalys)	40 d			0%
2_03	brėžiniai, skaičiavimai (PP.SK dalys, papildomos)	40 d			0%
2_04	brėžiniai, skaičiavimai (PP.SP (lauko inžinerinių tinklų dalys, schema;))	40 d			0%
2_05	brėžiniai, skaičiavimai (PP.INŽ (vidaus inžinerinių tinklų dalys, schemos))	40 d			0%
2_06	tarpdisciplininės užduotus_ PP.GS (gaisrosaugos dalis)	20 d			0%
2_07	tarpdisciplininės užduotys_ PP.ENE (energetinis modelis)	20 d			0%
2_08	kiti brėžiniai..	1 d			0%
2_10	techninės specifikacijos;	5 d			0%
2_11	medžiagų žiniaraščiai;	5 d			0%
2_12	aiškinamasis raštas;	5 d			0%
3	viešinimas;	20 d			0%
4	IS Infostatyba; statybą leidžiantis dokumentas (SLD)	20 d			0%
4_01	.. rezervas (pakartotinas teikimas)	20 d			0%
5	Techninis darbo projektas (iškeliami, prijungiami lauko inžineriniai tinklai)) :	100 d			0%
5_01	brėžiniai (visos dalys);	40 d			0%
5_04	techninės specifikacijos (visos dalys);	5 d			0%
5_05	medžiagų žinairaščiai (visos dalys);	5 d			0%
5_06	aiškinamsis raštas (visos dalys);	5 d			0%
5_07	pritarimai projekto sprendiniams sąlygas išdavusiose institucijose; Infostatyba, statybą leidžiantis dokumentas	20 d			0%
5_08	.. rezervas	20 d			0%
6	Techninis darbo projektas (pastatas, patalpos) :	131 d			0%
6_01	brėžiniai (visos dalys);	85 d			0%
6_03	techninės specifikacijos (visos dalys);	5 d			0%
6_04	medžiagų žiniaraščiai (visos dalys);	5 d			0%
6_05	aiškinamasis raštas (visos dalys);	5 d			0%
6_06	sąmata (visos dalys)	31 d			0%
6_08	BIM modelis (visos dalys);	0 d			0%
6_10	techninio darbo projekto ekspertizė	40 d			0%
7	**STATYBOS**	**380 d**			
7_01	statybos aikštelė ;	5 d			0%
7_02	esamų lauko inžinerinių tinklų iškėlimas;	40 d			0%
7_03	kasimas ir greta esančių statinių tvirtinimas (pagal poreikį);	50 d			0%
7_04	esamų pastatų rekonstravimo darbai;	50 d			0%
7_05	požeminės konstrukcijos; gelžbetoninės konstrukcijos; sienos;	55 d			0%
7_06	laiptinės; antžeminės statinių dalys;	40 d			0%
7_07	stogas (-ai);	50 d			0%
7_08	hidroizoliacija; šiltinimas;	40 d			0%
7_09	vidaus inžineriniai tinklai- techninės patalpos, horizontalios ir vertikalios magistralės	40 d			0%
7_10	vidaus inžineriniai tinklai- galutiniai prijungimai, inžineriniai taškai (kartu arba atskirai pagal visas projekto dalis)	30 d			0%
7_11	durys;	20 d			0%
7_12	apdaila (grindys, sienos, lubos)	40 d			0%
7_13	baldai, žymėjimai;	20 d			0%
7_14	nauji lauko inžineriniai tinklai;	80 d			0%
7_15	gerbūvis; kietos ir minkštos dangos. želdynai; mažoli architektūra;	40 d			0%
8	bandymai; pridavimas eksploatacijai	40 d			0%
9	perdavimas statytojui (užsakovui);	0 d		**2 Jul 2029**	0%
