2015-11-30
(Data)

Protokolo Nr. M15-323-Y tesinys

ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO PASLĖPTŲ DARBŲ APŽIŪROS

AKTAS Nr. 1

Objektas: TR-105 10 kV elektros įrengimų remontas Būtingės g.40, Palanga

Įžemintuvo schema (eskizas)

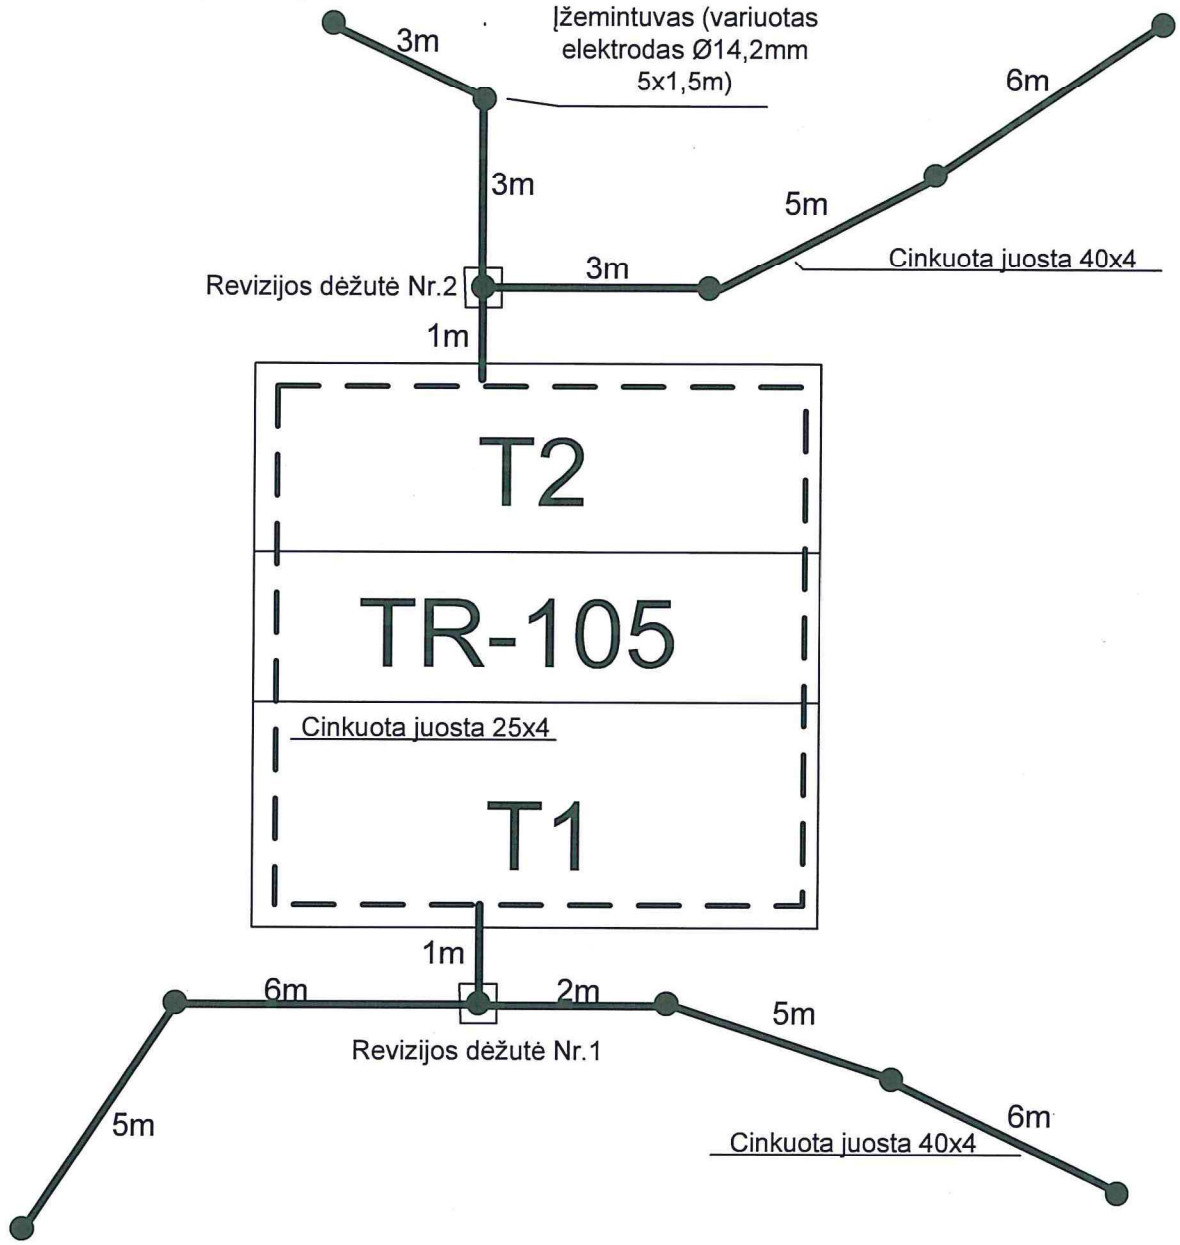

Komisija, susidedanti iš _____

_____

apžiūrėjo šiuos įžeminimo įrenginius:

Eil. Nr.	Įžeminimo vieta	Įžemintuvai				Įžeminantieji laidininkai			Elektrodų sujungimo būdas
		Kiekis	Medžiaga	Ilgis ir kiti matmenys	Žemutinio taško užkasimo gylis	Ilgis ir kiti matmenys	Medžiaga	Laidininko žemutinio taško užkasimo gylis	
1	TR-105 įžeminimas (revizijos dėžutė Nr.1)	6	Metalinis variuotas strypas	L=5x1,5= 7,5m Ø14,2	0,5m	40x4 mm Viso-24m	Metalinė cinkuota juosta	0,5m	Elektrodai sujungti jungčių pagalba. Prie cinkuotos juostos elektrodai prijungti suvirinant.
